

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

SMSUB / FUNDURB



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SUBPREFEITURAS

ATOS

RESUMO GERAL

ATIVIDADE	VALOR APROVADO PELO FUNDURB 2024	VALOR RESERVADO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	VALOR PAGO
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos [MOB]	R\$ 80.000.000,00	R\$ 73.313.457,62	R\$ 71.987.042,71	R\$ 29.451.622,37	R\$ 28.952.590,50
Pavimentação e Recapeamento de Vias	R\$ 359.317.164,78	R\$ 347.653.739,25	R\$ 340.666.556,57	R\$ 284.930.843,02	R\$ 263.067.664,46
Melhorias de Bairro	R\$ 15.328.675,22	R\$ 5.230.379,69	R\$ 5.230.379,69	R\$ 452.973,22	R\$ 452.973,22
Execução de obras de drenagem - Preventiva	R\$ 15.000.000,00	R\$ 8.741.870,81	R\$ 8.741.870,81	R\$ 5.632.875,41	R\$ 2.616.642,87
Execução de obras de drenagem - Emergencial	R\$ 10.000.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL	R\$ 479.645.840,00	R\$ 434.939.447,37	R\$ 426.625.849,78	R\$ 320.468.314,02	R\$ 295.089.871,05

VALORES RELATIVOS AO SISTEMA SOF EM 24/06/2024

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:
META 40 DO PDM 2021/2024

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	M'Boi Mirim - Contrato 1
Endereço	Estrada M'Boi Mirim/ Rua Amilcar Ponchielli
Nº do Termo de Contrato	238/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0008647-5
Data da OIS	23/05/2023
Data de Término	17/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 3.327.322,07
Valor Aprovado	R\$ 2.966.030,29
Valor Empenhado	R\$ 2.965.331,68
Valor Liquidado	R\$ 1.117.581,00

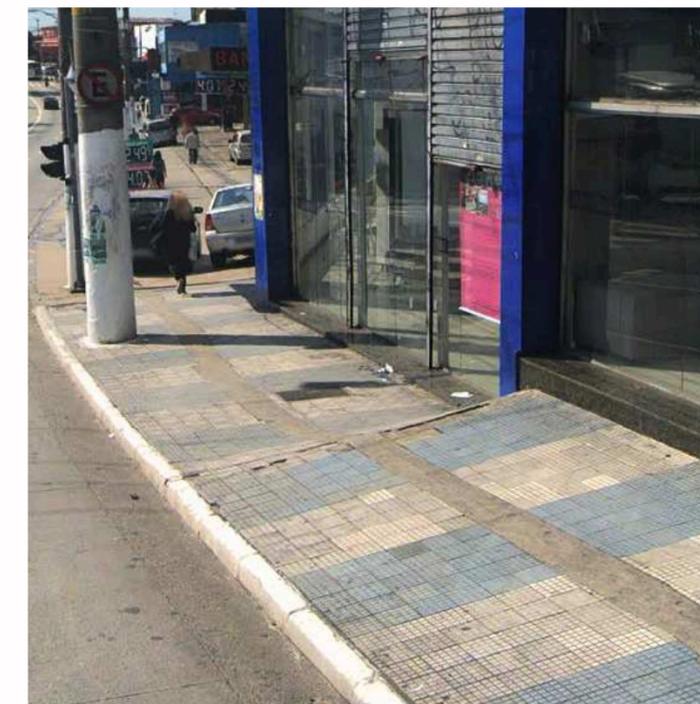


Foto antes

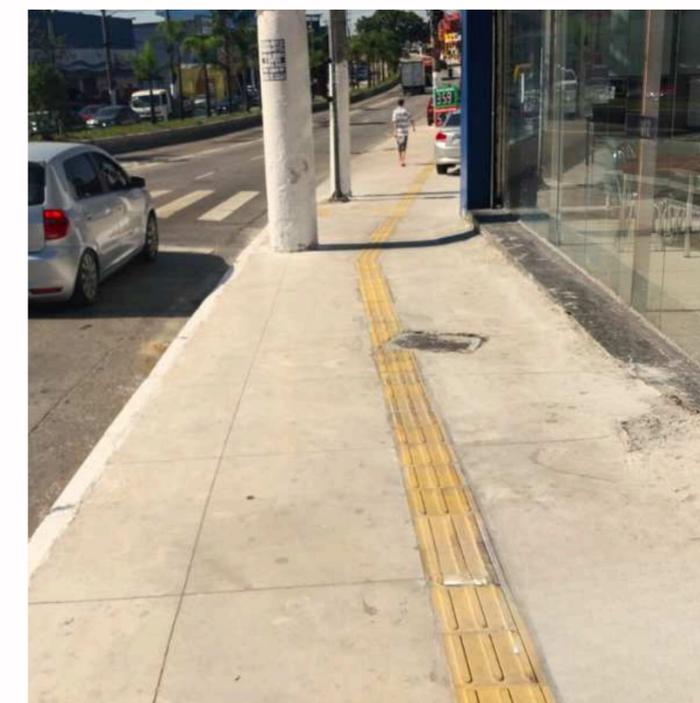


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	São Mateus - Contrato 1
Endereço	Avenida Rio das Pedras/ Avenida Luis Pires de Minas/ Praça Caraguarino
Nº do Termo de Contrato	426/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0008913-0
Data da OIS	21/08/2023
Data de Término	13/10/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 3.084.130,90
Valor Aprovado	R\$ 1.934.150,46
Valor Empenhado	R\$ 2.550.975,75
Valor Liquidado	R\$ 491.968,81



Foto antes

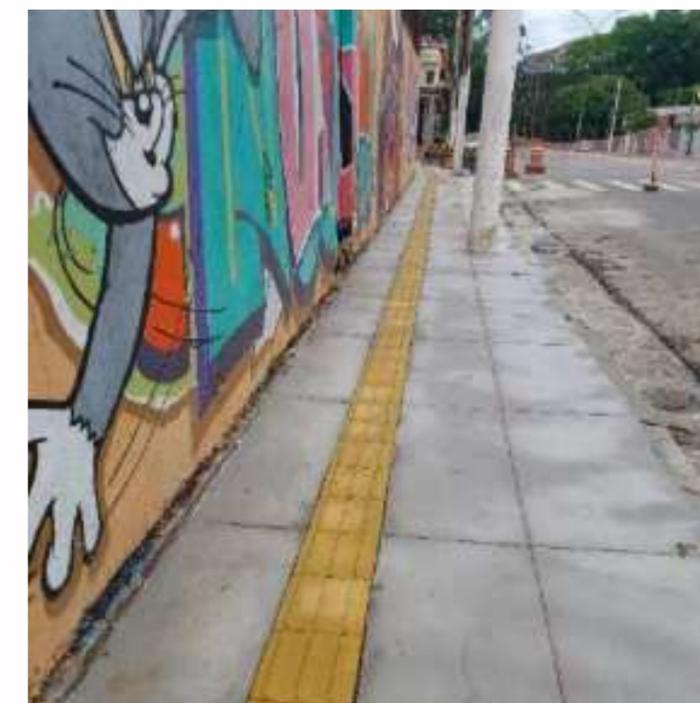


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Jabaquara - Contrato 1
Endereço	Rua Marapes / Avenida José Estevão de Magalhães/ Avenida Santa Catarina/ Rua Cidade de Bagdá/ Av. do Café
Nº do Termo de Contrato	248/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0009410-9
Data da OIS	05/06/2023
Data de Término	29/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 3.456.052,99
Valor Aprovado	R\$ 3.038.014,92
Valor Empenhado	R\$ 3.038.014,92
Valor Liquidado	R\$ 778.594,55

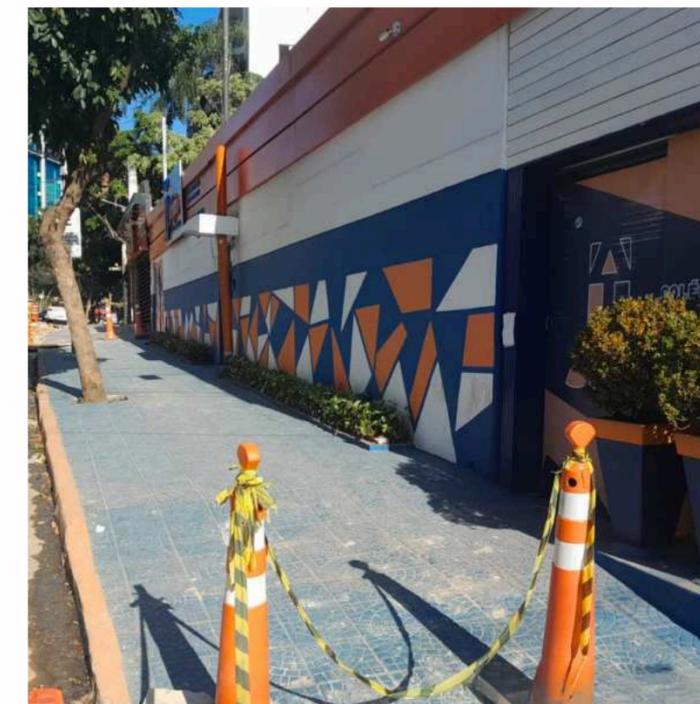


Foto antes

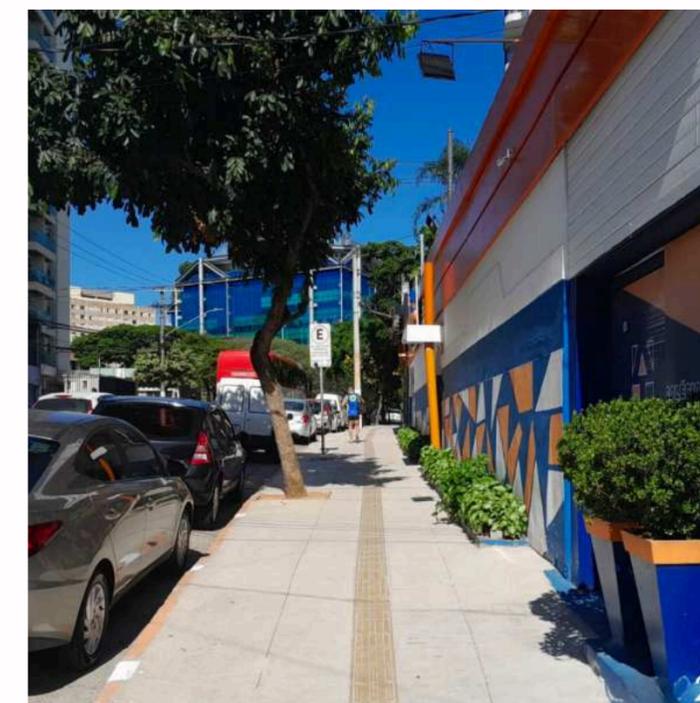


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Campo Limpo - Contrato 1
Endereço	Rua Paulino Vital de Moraes / Estrada de Itapecerica
Nº do Termo de Contrato	374/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0010568-2
Data da OIS	26/07/2023
Data de Término	20/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 1.720.483,41
Valor Aprovado	R\$ 890.055,19
Valor Empenhado	R\$ 660.674,81
Valor Liquidado	R\$ 660.674,81

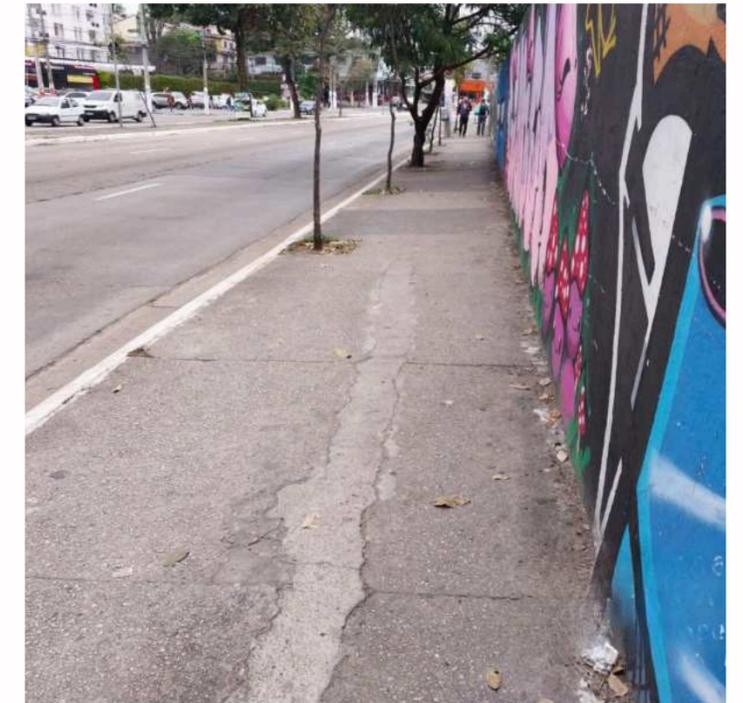


Foto antes

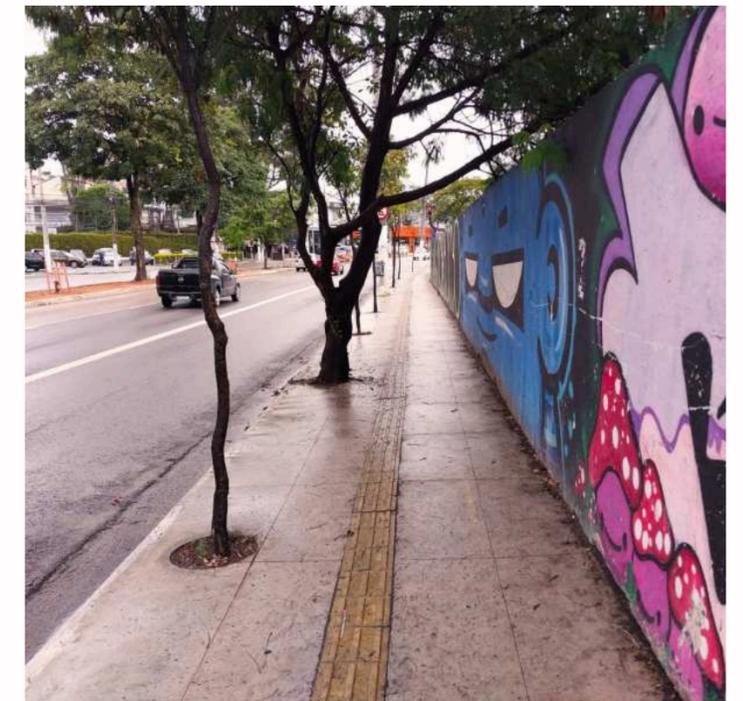


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Santana Tucuruvi - Contrato 2
Endereço	Avenida Parada Pinto
Nº do Termo de Contrato	355/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0013019-9
Data da OIS	19/07/2023
Data de Término	13/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 301.946,29
Valor Aprovado	R\$ 239.982,85
Valor Empenhado	R\$ 239.982,85
Valor Liquidado	R\$ 148.674,52



Foto antes



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Ermelino Matarazzo - CONTRATO 3
Endereço	Avenida Paranaguá/ Avenida José Muniz Ribeiro/ Rua Felipe José de Figueiredo / Rua Antônio Carlos Lamengo
Nº do Termo de Contrato	622/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0013643-0
Data da OIS	09/10/2023
Data de Término	04/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 3.875.418,55
Valor Aprovado	R\$ 2.896.087,69
Valor Empenhado	R\$ 2.896.087,69
Valor Liquidado	R\$ 1.352.203,51



Foto antes

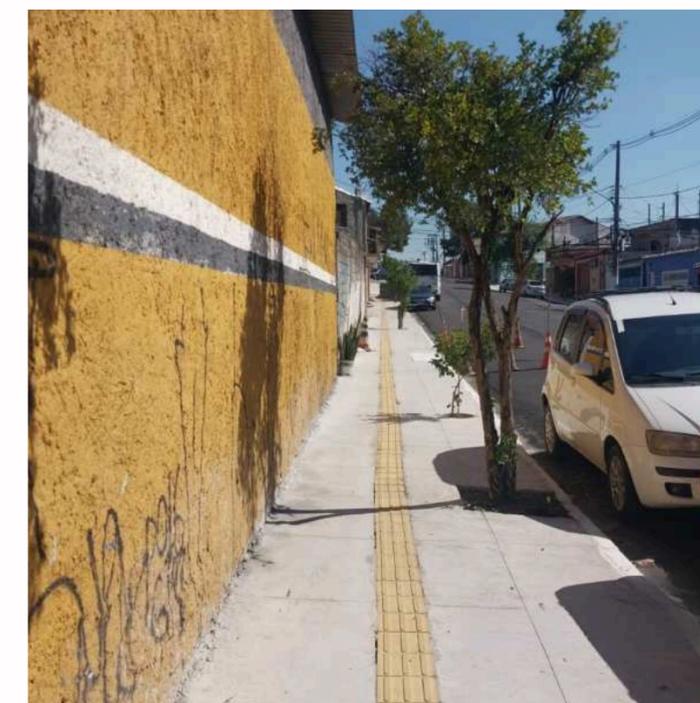


Foto depois:

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Pinheiros - Contrato 1
Endereço	Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini
Nº do Termo de Contrato	389/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0014506-4
Data da OIS	01/11/2023
Data de Término	29/02/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 134.691,26
Valor Aprovado	R\$ 5.692,50
Valor Empenhado	R\$ 5.721,53
Valor Liquidado	R\$ 5.692,50



Foto durante

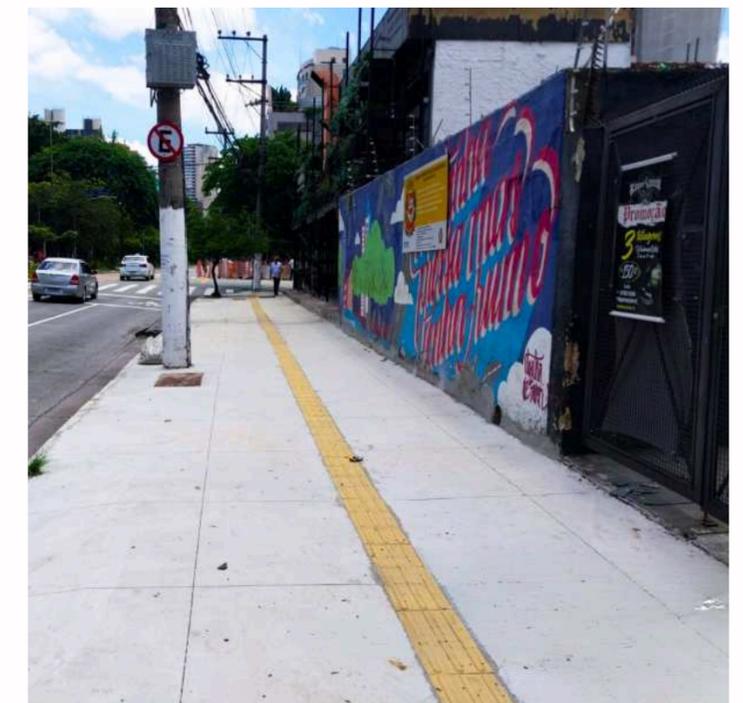


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Penha - Contrato 1
Endereço	Rua Itinguçu
Nº do Termo de Contrato	378/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0011118-6
Data da OIS	20/07/2023
Data de Término	17/11/2023
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 263.590,04
Valor Aprovado	R\$ 289.049,77
Valor Empenhado	R\$ 239.636,64
Valor Liquidado	R\$ 239.636,64



Foto antes



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Jaçanã /Tremembé - Contrato 2
Endereço	Avenida Guapira
Nº do Termo de Contrato	470/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0015854-9
Data da OIS	04/09/2023
Data de Término	25/02/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 2.092.684,57
Valor Aprovado	R\$ 676.153,21
Valor Empenhado	R\$ 505.896,19
Valor Liquidado	R\$ 505.896,19

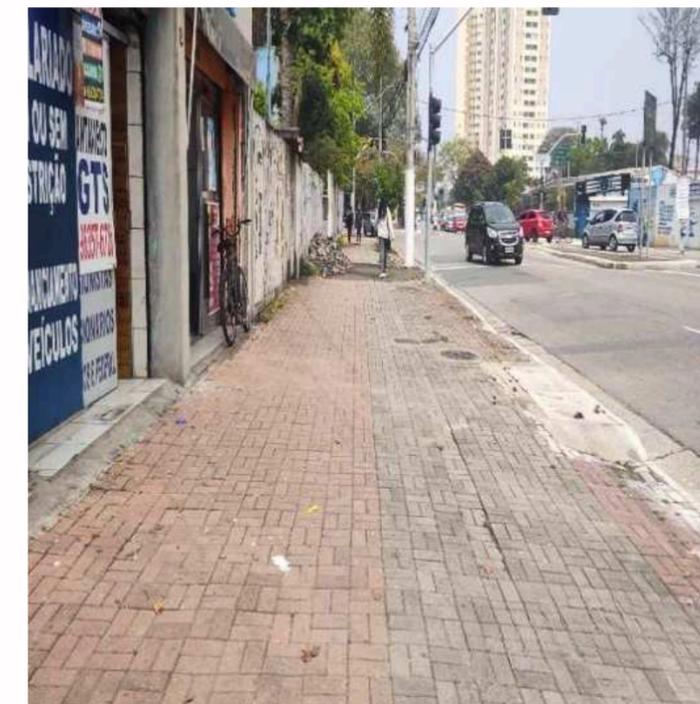


Foto antes



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Jabaquara - Contrato 2
Endereço	Avenida George Corbisier/ Avenida General Daltro Filho/ Rua Guassatungas/ Rua Cruz das Almas/ Parque Lina e Paulo Raia
Nº do Termo de Contrato	476/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0016892-7
Data da OIS	28/08/2023
Data de Término	24/02/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 2.145.135,37
Valor Aprovado	R\$1.181.253,29
Valor Empenhado	R\$ 1.181.253,29
Valor Liquidado	R\$ 22.224,26



Foto antes

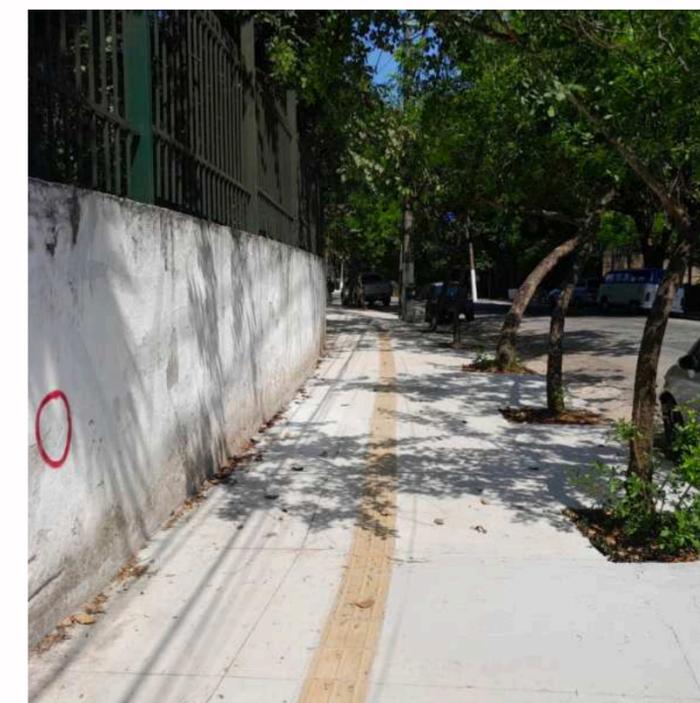


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Santo Amaro - Contrato 2
Endereço	Avenida Santa Catarina/ Rua Helade/ Rua Itagyba Santiago
Nº do Termo de Contrato	478/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0016997-4
Data da OIS	11/09/2023
Data de Término	27/02/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 658.060,50
Valor Aprovado	R\$ 538.060,50
Valor Empenhado	R\$ 538.060,50
Valor Liquidado	R\$ 340.365,81

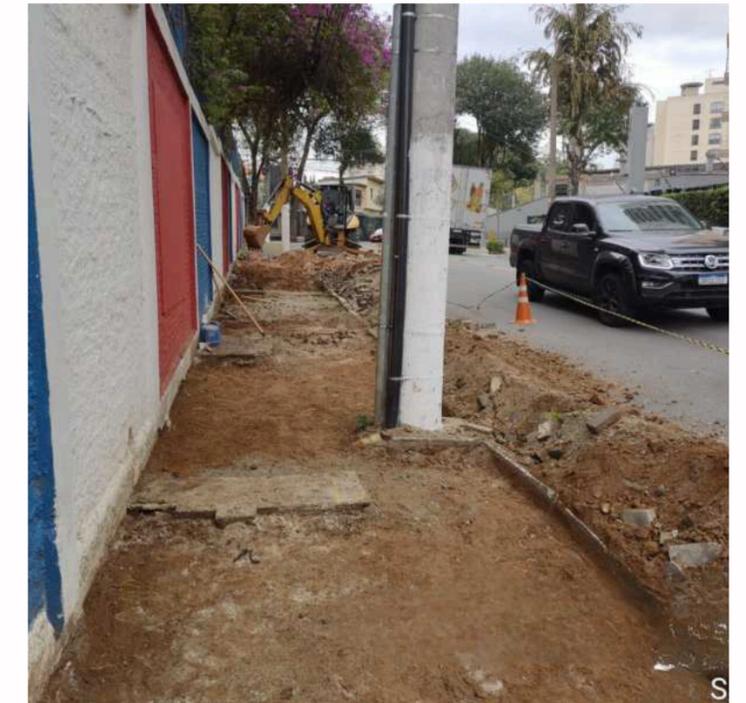


Foto durante



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Casa Verde - Contrato 1
Endereço	Avenida Baruel
Nº do Termo de Contrato	477/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0017043-3
Data da OIS	29/08/2023
Data de Término	25/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 1.677.749,33
Valor Aprovado	R\$ 1.000.000,00
Valor Empenhado	R\$ 1.000.000,00
Valor Liquidado	R\$ 948.075,21

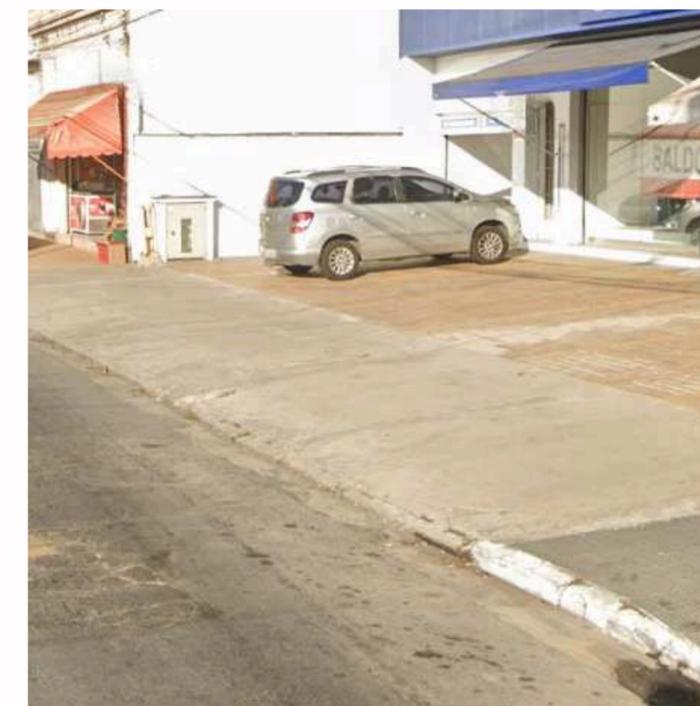


Foto antes

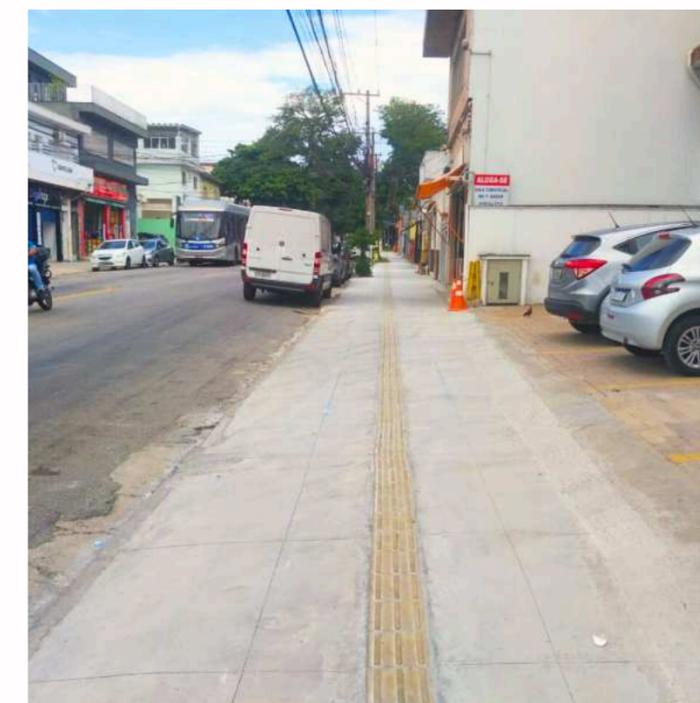


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Butantã - Contrato 3
Endereço	Av. Vital Brasil/ Rua Catequese/ Rua Camargo/ Praça Vicente Rodrigues/ Praça Monte Castelo/ Rua Romão Gomes
Nº do Termo de Contrato	474/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0017097-2
Data da OIS	04/09/2023
Data de Término	04/06/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 3.019.572,14
Valor Aprovado	R\$ 2.557.398,80
Valor Empenhado	R\$ 2.557.398,80
Valor Liquidado	R\$ 1.925.700,01

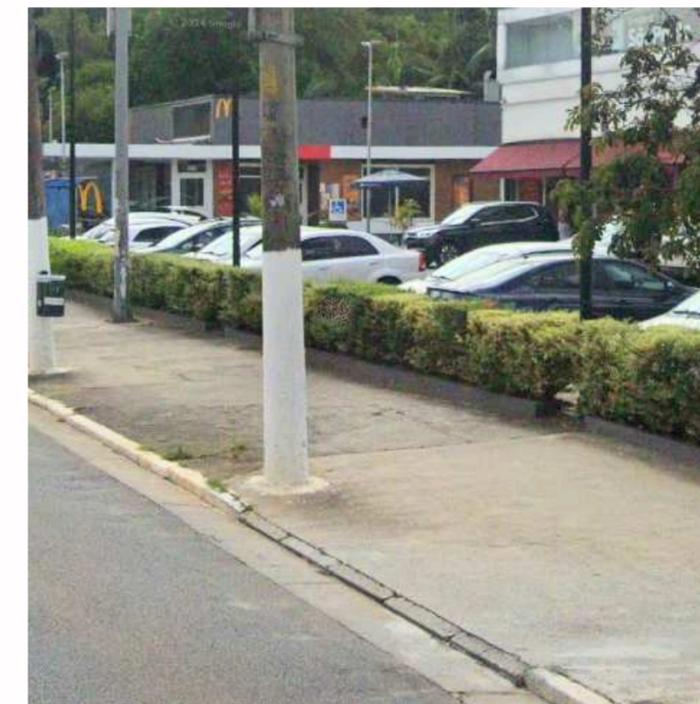


Foto antes

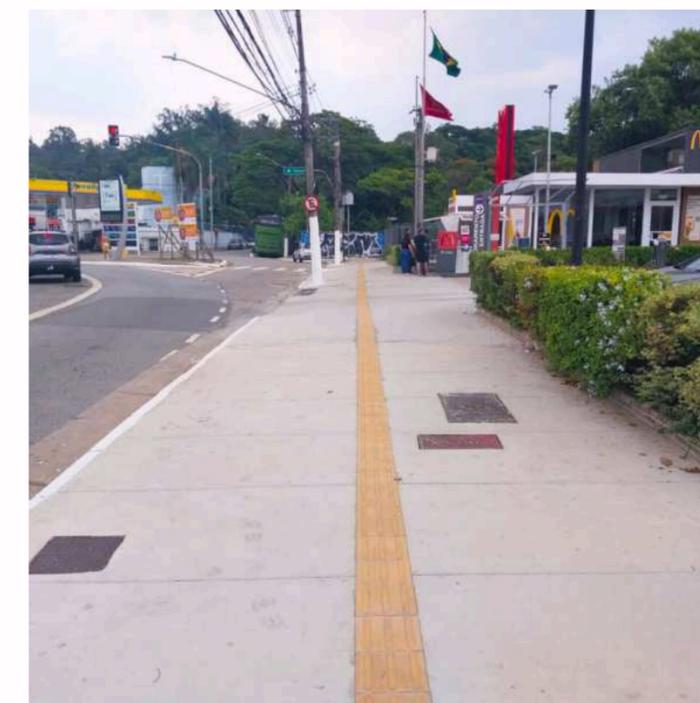


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Pirituba/Jaraguá - Contrato 2
Endereço	Avenida do Anastacio/ Avenida Mutinga
Nº do Termo de Contrato	574/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0019031-0
Data da OIS	09/10/2023
Data de Término	03/06/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 874.449,24
Valor Aprovado	R\$ 849.333,15
Valor Empenhado	R\$ 849.333,15
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto antes

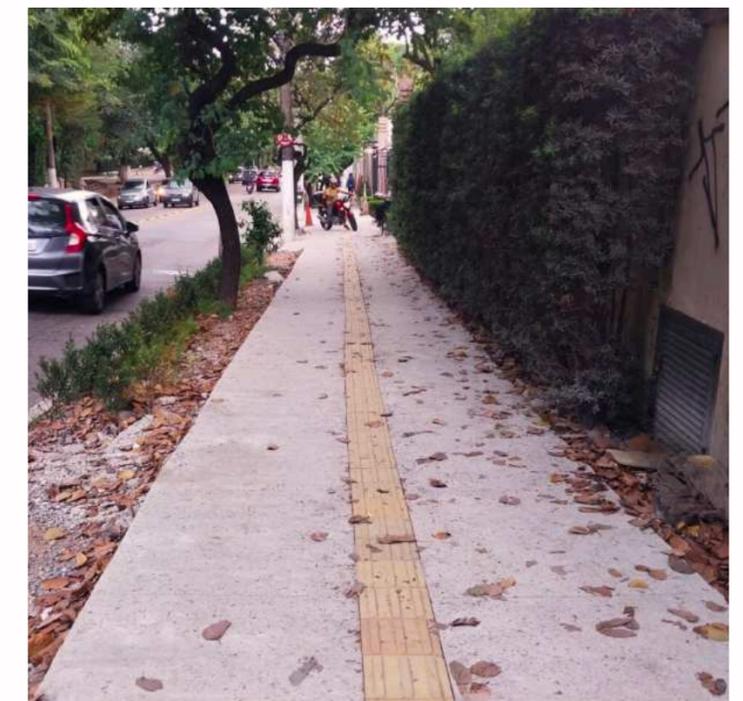


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Vila Maria / Vila Guilherme - Contrato 2
Endereço	Avenida Guilherme Cotching
Nº do Termo de Contrato	614/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0019039-6
Data da OIS	09/10/2023
Data de término	06/02/2024
% de Execução	Suspensa

Valor do Contrato	R\$ 371.263,78
Valor Aprovado	R\$ 378.048,49
Valor Empenhado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00

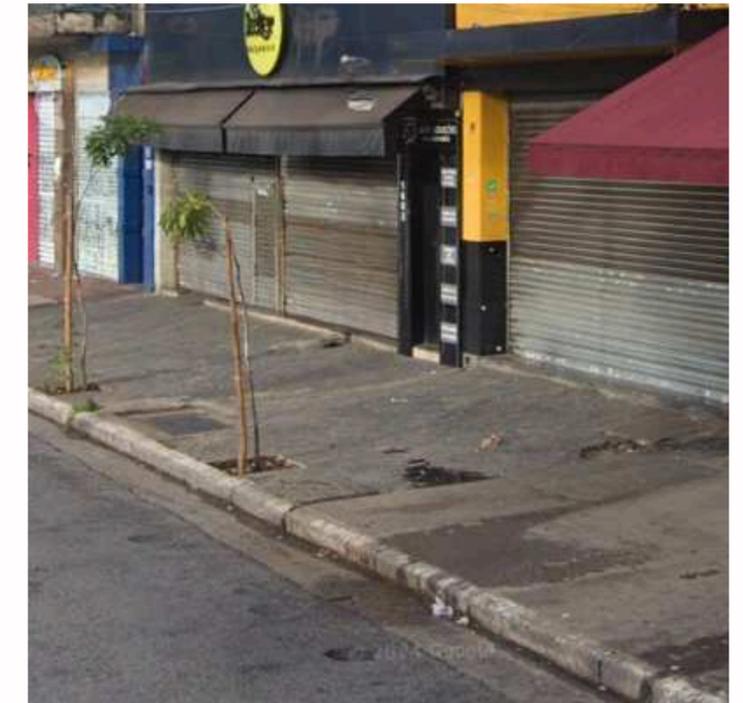


Foto Local



Foto Local

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Freguesia do Ó - Contrato 2
Endereço	Rua Euridice Bueno/ Rua Parapuã
Nº do Termo de Contrato	572/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0019057-4
Data da OIS	17/10/2023
Data de término	12/06/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 1.691.301,86
Valor Aprovado	R\$ 1.376.700,00
Valor Empenhado	R\$ 1.376.700,00
Valor Liquidado	R\$ 374.147,15



Foto durante

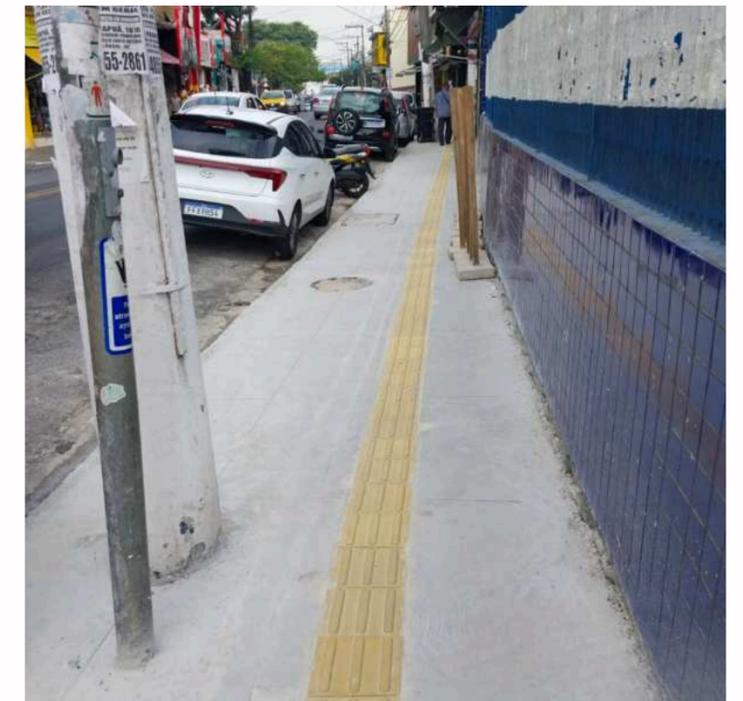


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	São Miguel Paulista - Contrato 2
Endereço	Avenida Nordestina/ Avenida Pires do Rio
Nº do Termo de Contrato	700/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0020563-6
Data da OIS	17/10/2023
Data de término	14/02/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 3.643.856,10
Valor Aprovado	R\$ 536.089,56
Valor Empenhado	R\$ 253.866,53
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto antes

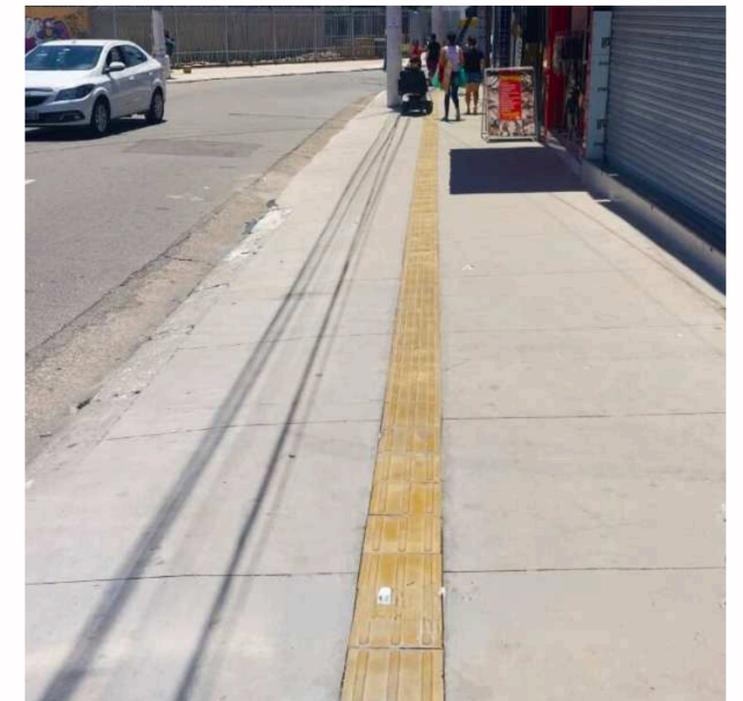


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Ipiranga - Contrato 4
Endereço	Praça do Monumento / Rua Tabor/ Rua Bom Pastor/ Rua Xavier de Almeida/ Rua Brigadeiro Jordão/ Rua Xavier de Almeida
Nº do Termo de Contrato	830/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0023062-2
Data da OIS	04/12/2023
Data de término	02/04/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 1.151.139,98
Valor Aprovado	R\$ 859.321,37
Valor Empenhado	R\$ 859.321,37
Valor Liquidado	R\$ 841.760,32



Foto antes

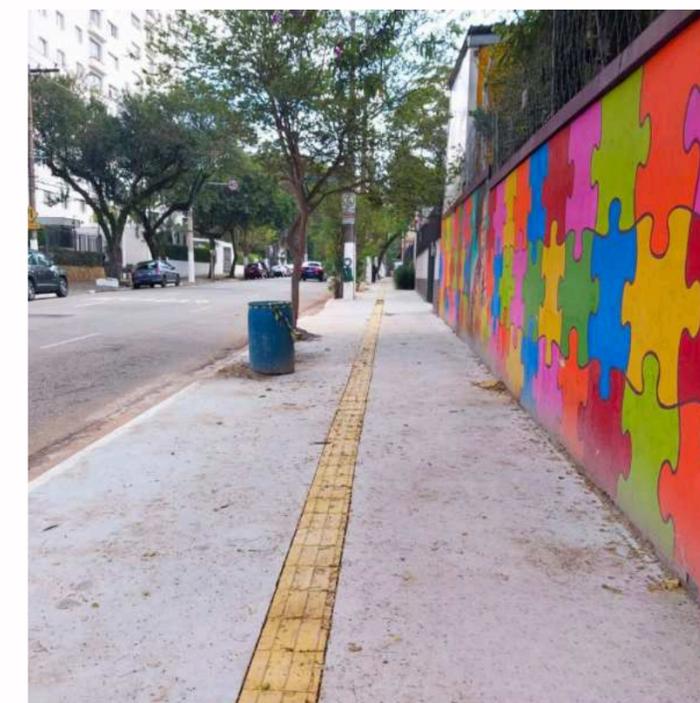


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Santana/Tucuruvi - Contrato 4
Endereço	Avenida General Ataliba Leonel/ Avenida Guapira/ Rua Major Dantas Cortez/ Avenida Gustavo Adolfo
Nº do Termo de Contrato	831/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0023077-0
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	13/04/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 1.342.488,20
Valor Aprovado	R\$ 1.342.488,20
Valor Empenhado	R\$ 1.342.488,20
Valor Liquidado	R\$ 289.016,80

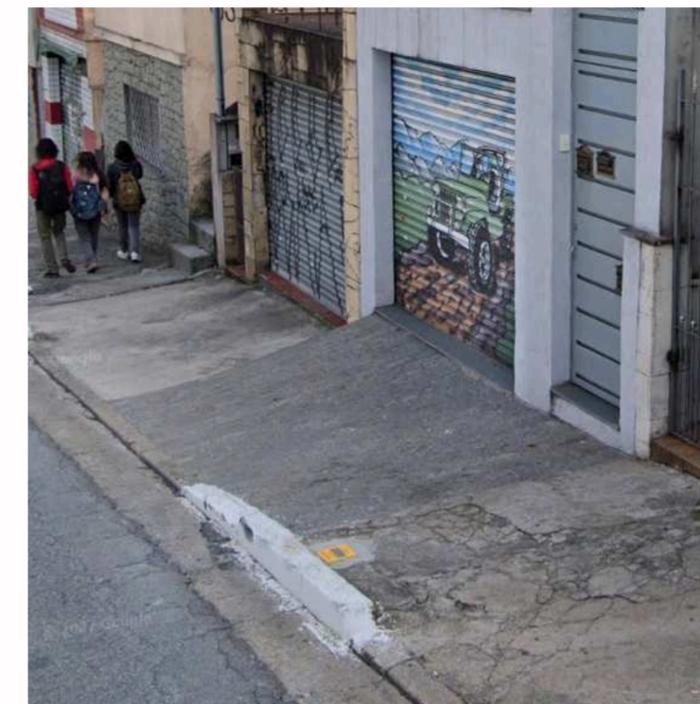


Foto antes



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Vila Prudente - Contrato 2
Endereço	Rua Santa Beatriz / Avenida Dr. Francisco Mesquita
Nº do Termo de Contrato	834/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0023108-4
Data da OIS	04/12/2023
Data de término	20/06/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 411.757,57
Valor Aprovado	R\$ 327.619,60
Valor Empenhado	R\$ 409.631,49
Valor Liquidado	R\$ 328.777,18

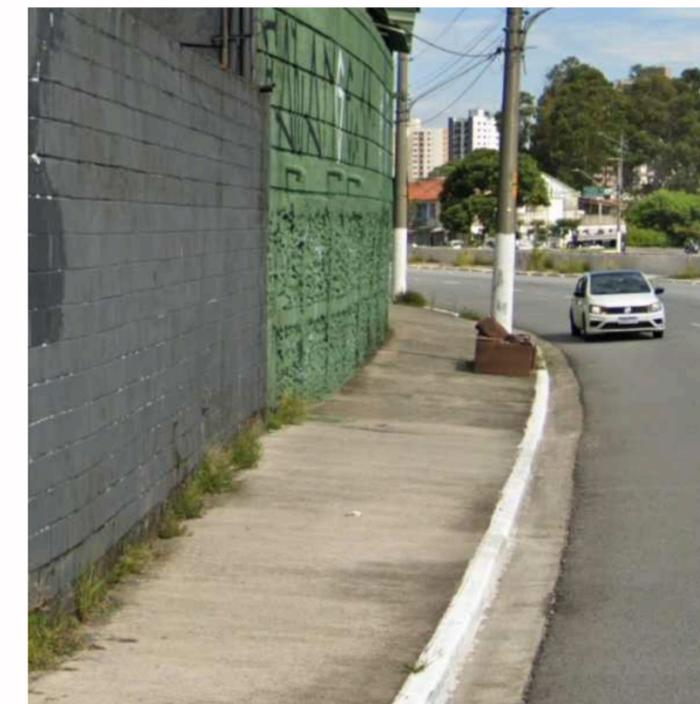


Foto antes

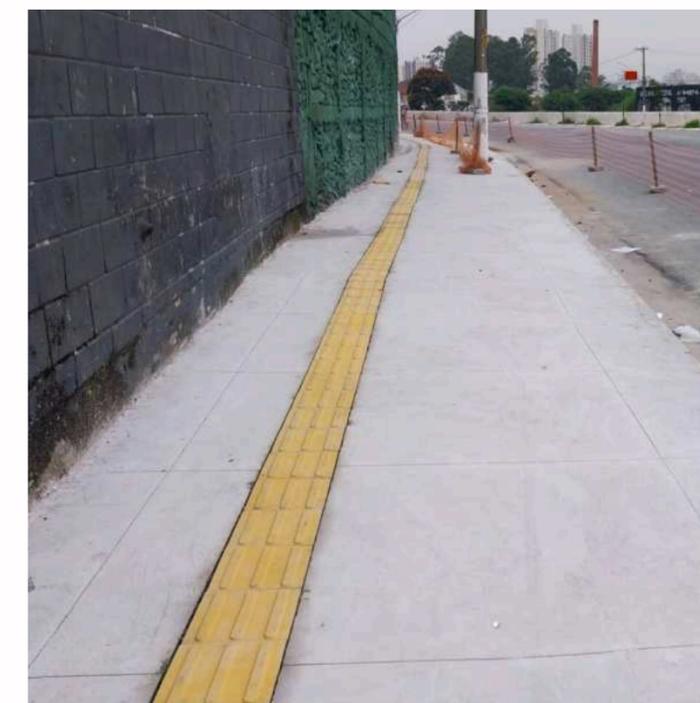


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Vila Prudente - Contrato 3
Endereço	Rua Murta do Campo
Nº do Termo de Contrato	833/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0023129-7
Data da OIS	12/12/2023
Data de término	24/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 983.023,77
Valor Aprovado	R\$ 978.802,50
Valor Empenhado	R\$ 978.802,50
Valor Liquidado	R\$ 635.962,53



Foto antes



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Vila Prudente - Contrato 4
Endereço	Rua do Orfanato/ Rua Carlos Muller/ Rua Dona Genoveva D' Ascoli/ Rua Itamambuca/ Praça Padre Damião/ Praça do Centenário Vila Prudente
Nº do Termo de Contrato	832/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0023688-4
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	11/06/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 1.368.856,06
Valor Aprovado	R\$ 1.118.091,52
Valor Empenhado	R\$ 1.118.091,52
Valor Liquidado	R\$ 454.920,50

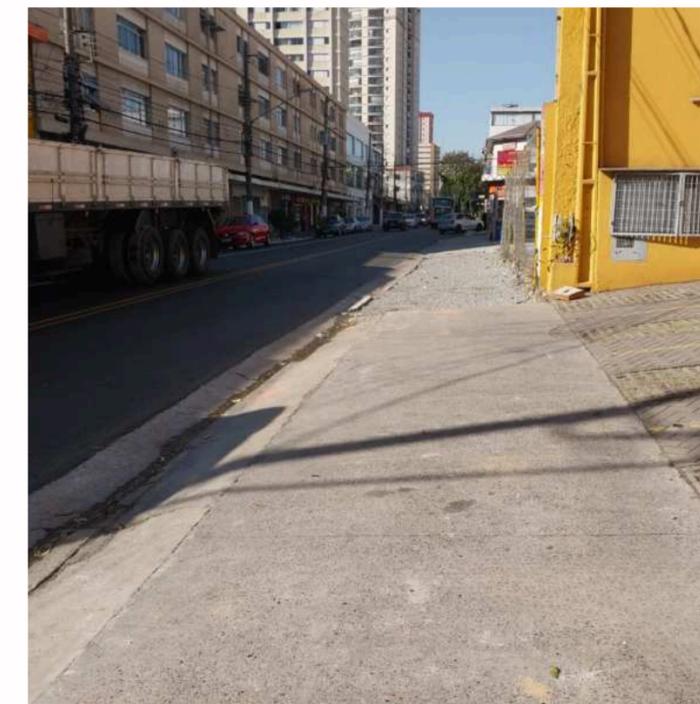


Foto antes

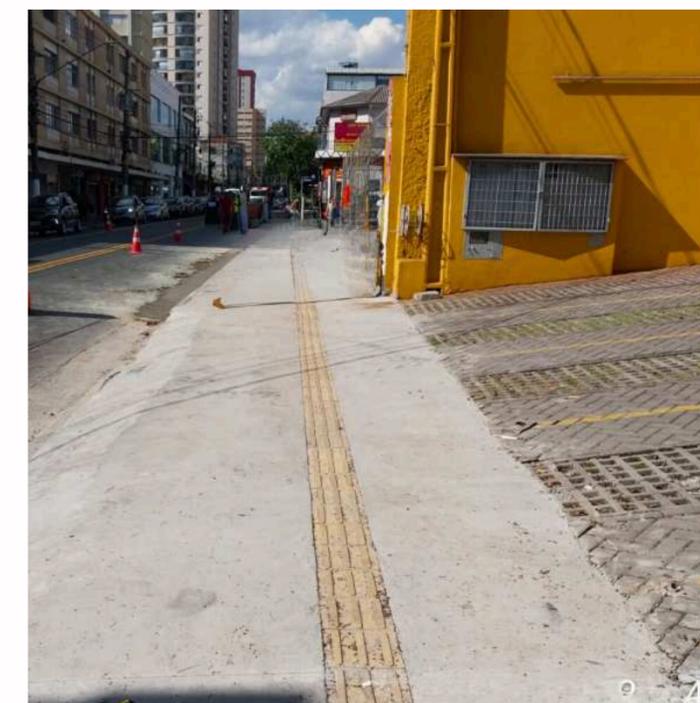


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Vila Maria/ Vila Guilherme - Contrato 3
Endereço	Avenida Alberto Byington/ Praça Joaquim José da Nova
Nº do Termo de Contrato	835/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0024566-2
Data da OIS	04/12/2023
Data de término	01/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 450.193,42
Valor Aprovado	R\$ 454.920,50
Valor Empenhado	R\$ 447.907,73
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto antes

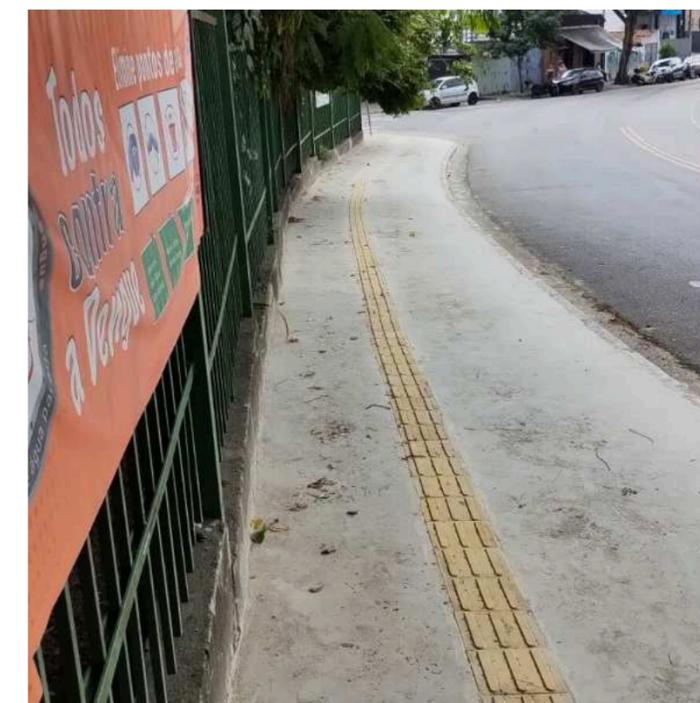


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Cidade Tiradentes - Contrato 4
Endereço	Avenida dos Metalúrgicos
Nº do Termo de Contrato	829/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0024612-0
Data da OIS	12/12/2023
Data de término	10/04/2023
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 333.360,28
Valor Aprovado	R\$ 230.220,72
Valor Empenhado	R\$ 230.220,72
Valor Liquidado	R\$ 195.734,31



Foto antes



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Cidade Ademar - Contrato 3
Endereço	Avenida Cupecê
Nº do Termo de Contrato	965/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0027534-0
Data da OIS	08/12/2023
Data de término	04/06/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 2.800.696,53
Valor Aprovado	R\$ 2.372.191,50
Valor Empenhado	R\$ 2.792.750,71
Valor Liquidado	R\$ 2.475.162,06

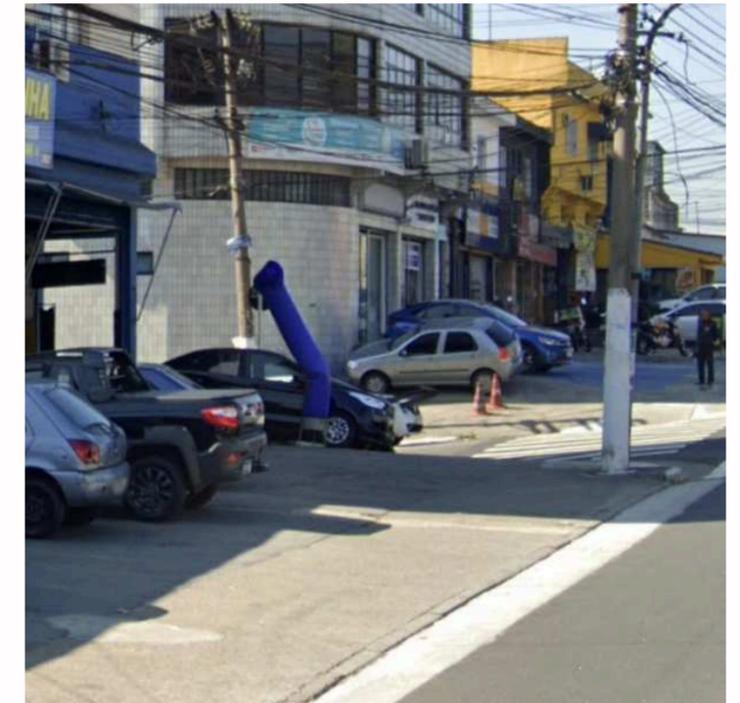


Foto antes

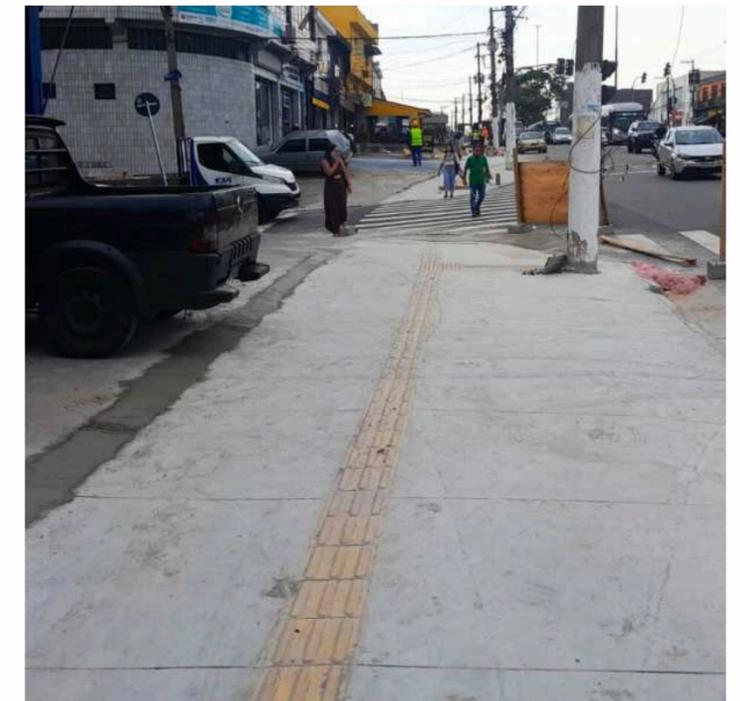


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Parelheiros - Contrato 4
Endereço	Rua José Nicolau/ Estrada Ecoturística de Parelheiros/ Avenida Senador Teotônio Vilela
Nº do Termo de Contrato	1068/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0027958-3
Data da OIS	28/12/2023
Data de término	26/04/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 969.088,78
Valor Aprovado	R\$ 894.119,67
Valor Empenhado	R\$ 891.638,19
Valor Liquidado	R\$ 839.496,60

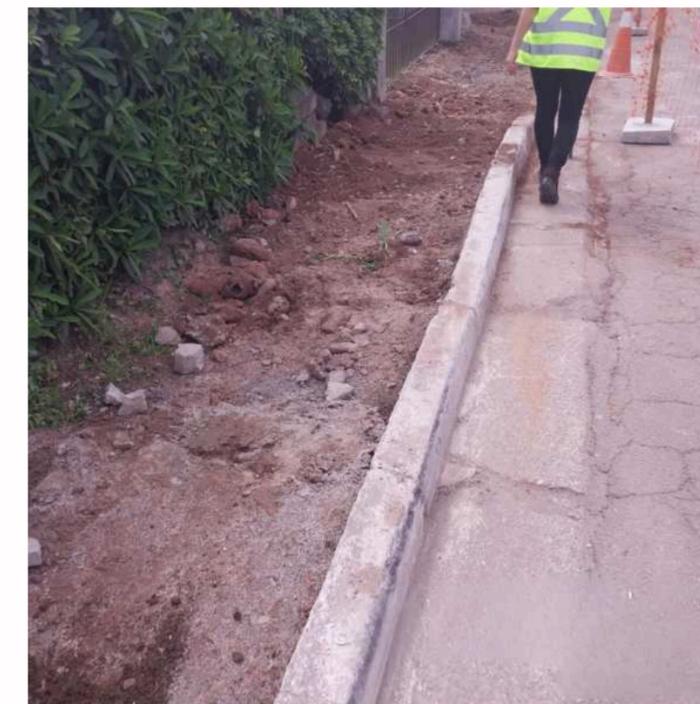


Foto durante

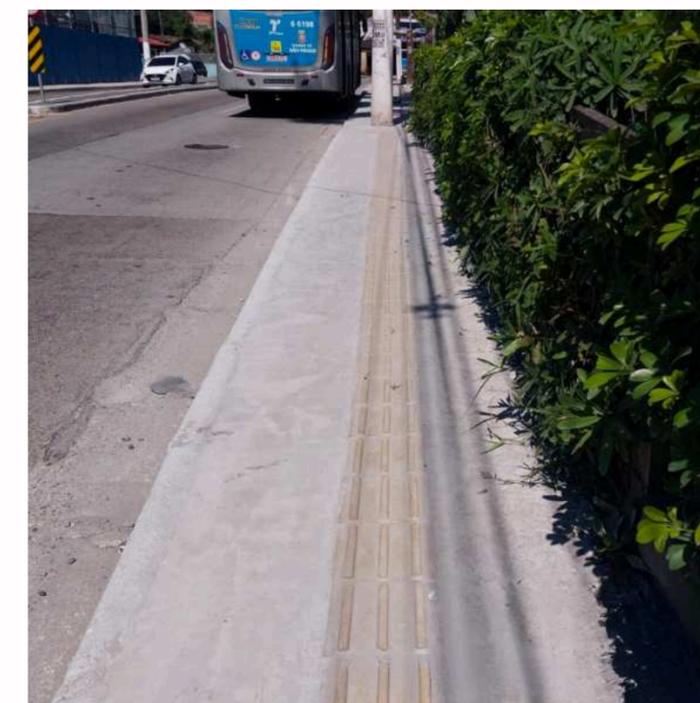


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Ipiranga - Contrato 5
Endereço	Rua dos Sorocabanos/ Rua Bom Pastor/ Rua Moreira Costa/ Rua Dom Luis Lasanha/ Rua Alm. Lobo/ Rua Moreira Godoi/ Avenida Padre Arlindo Vieira/ Rua São Magno/ Rua Julio Felipe Guedes
Nº do Termo de Contrato	1100/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0028029-8
Data da OIS	28/12/2023
Data de término	24/06/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 4.798.862,52
Valor Aprovado	R\$ 4.783.655,15
Valor Empenhado	R\$ 4.783.655,15
Valor Liquidado	R\$ 3.391.944,23



Foto durante

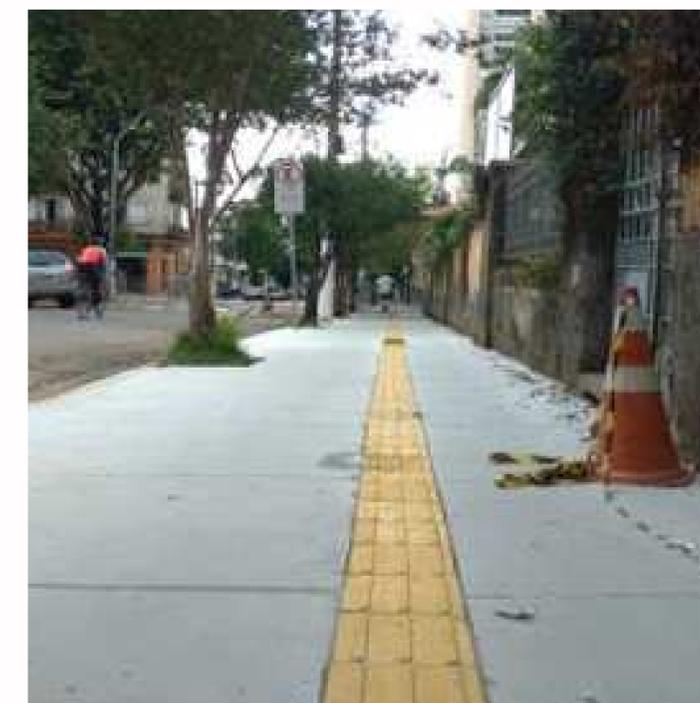


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Cidade Tiradentes - Contrato 5
Endereço	Avenida dos Metalúrgicos
Nº do Termo de Contrato	1062/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0028073-5
Data da OIS	28/12/2023
Data de término	26/04/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 717.040,61
Valor Aprovado	R\$ 717.040,61
Valor Empenhado	R\$ 714.509,12
Valor Liquidado	R\$ 589.473,99



Foto antes

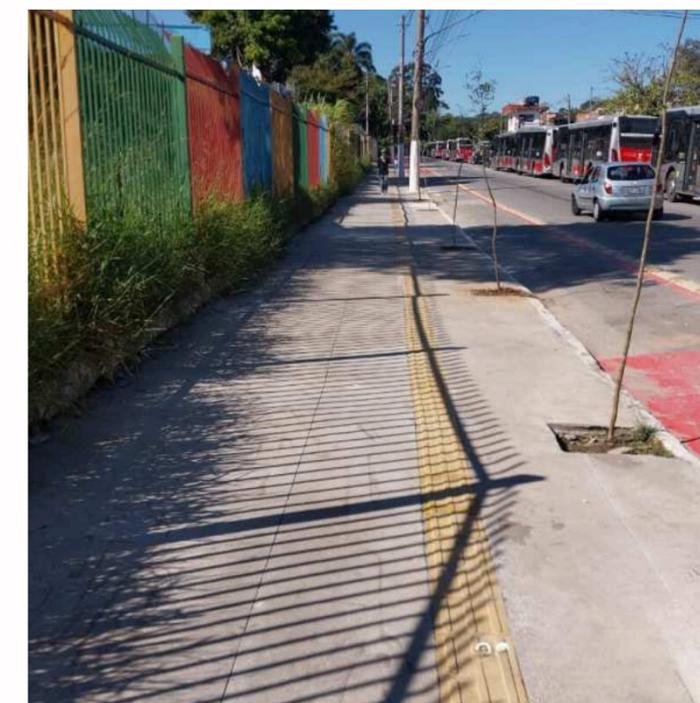


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Mooca - Contrato 1
Endereço	Rua Bresser/ Praça Maria Candida F. de Oliveira/ Rua dos Trilhos/ Praça Giro Pontes/ Rua Taquari
Nº do Termo de Contrato	26/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0028487-0
Data da OIS	07/02/2024
Data de término	06/06/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 3.754.139,92
Valor Aprovado	R\$ 3.754.139,92
Valor Empenhado	R\$ 3.754.139,92
Valor Liquidado	R\$ 3.595.042,35



Foto antes

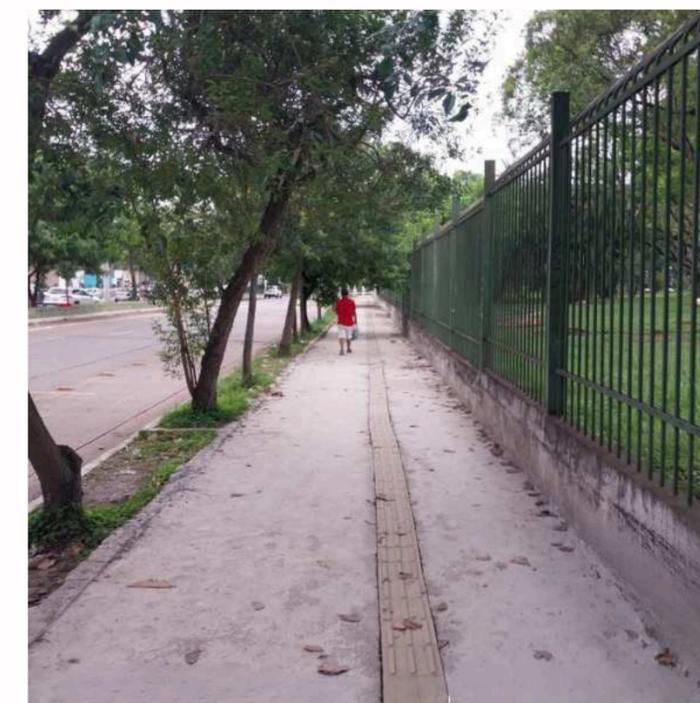


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Capela do Socorro - Contrato 2
Endereço	Avenida Atlântica/ Rua Amaro Luz/ Rua Nossa Senhora do Socorro
Nº do Termo de Contrato	31/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2023/0029182-6
Data da OIS	04/03/2024
Data de término	02/07/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 7.567.518,61
Valor Aprovado	R\$ 7.567.518,61
Valor Empenhado	R\$ 7.567.518,61
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto durante

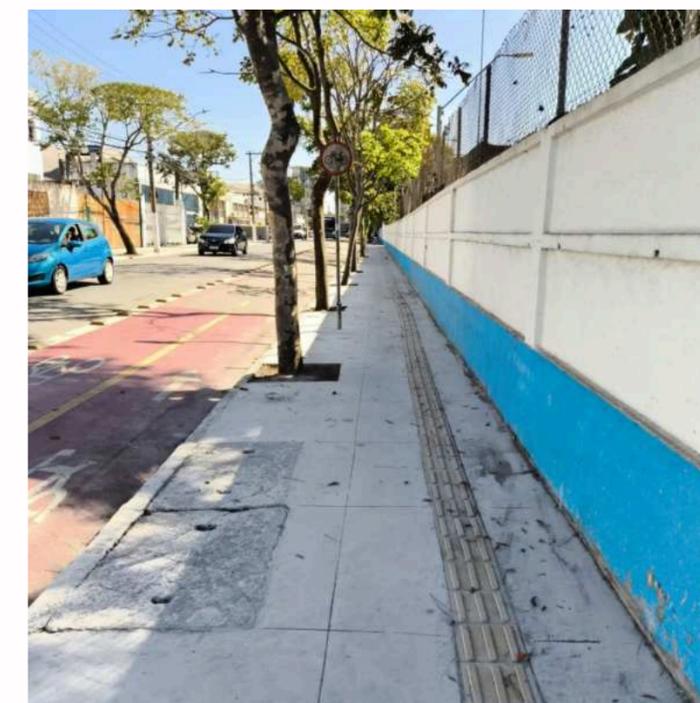


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Itaim Paulista - Contrato 3
Endereço	Avenida Marechal Tito
Nº do Termo de Contrato	19/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2023/0029306-3
Data da OIS	26/02/2024
Data de término	25/06/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 764.180,71
Valor Aprovado	R\$ 764.180,71
Valor Empenhado	R\$ 764.180,71
Valor Liquidado	R\$ 0,00

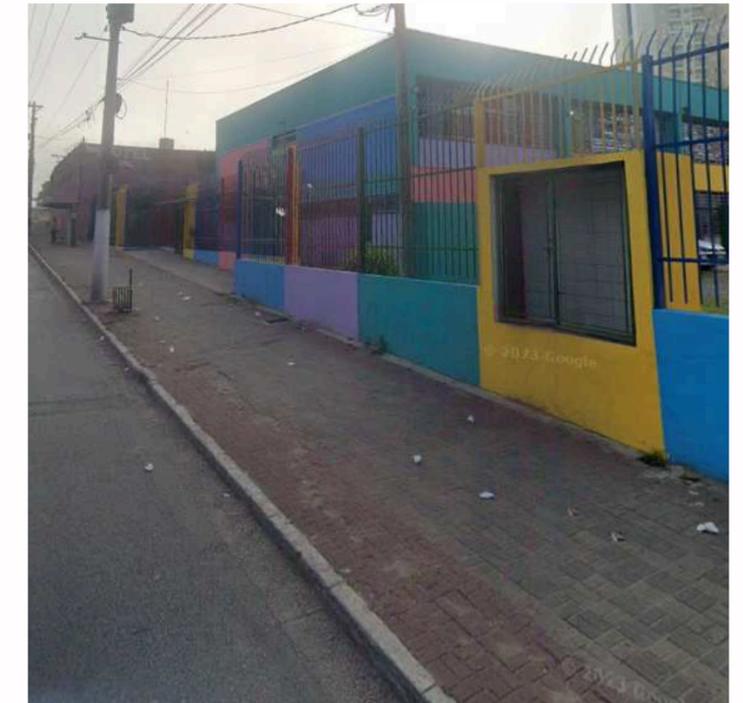


Foto antes

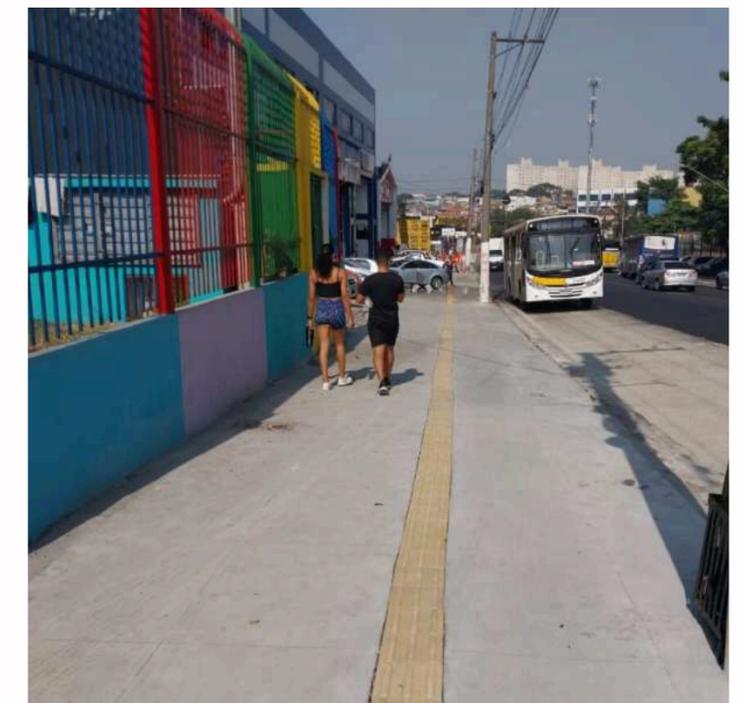


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Penha - Contrato 3
Endereço	Avenida Cangaíba
Nº do Termo de Contrato	30/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2023/0029311-0
Data da OIS	26/02/2024
Data de término	25/06/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 1.934.309,75
Valor Aprovado	R\$ 2.128.253,27
Valor Empenhado	R\$ 2.128.253,27
Valor Liquidado	R\$ 0,00

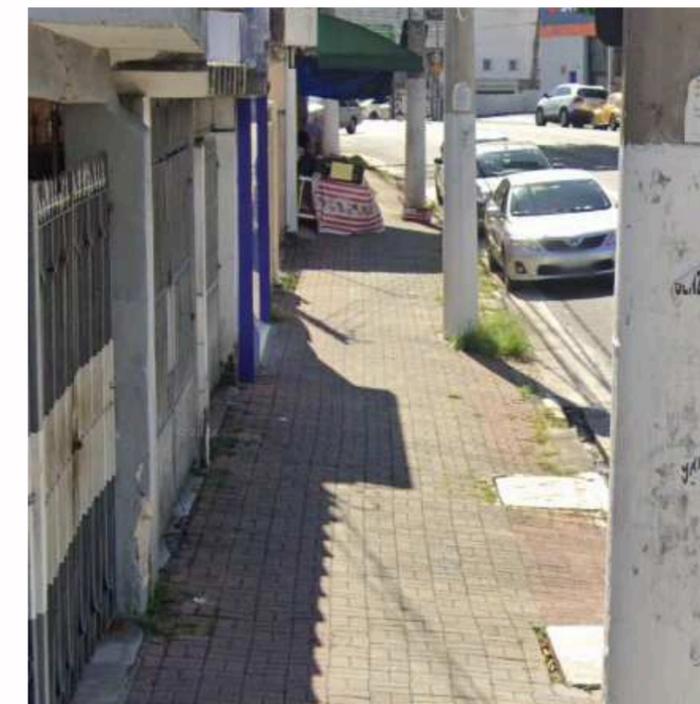


Foto antes

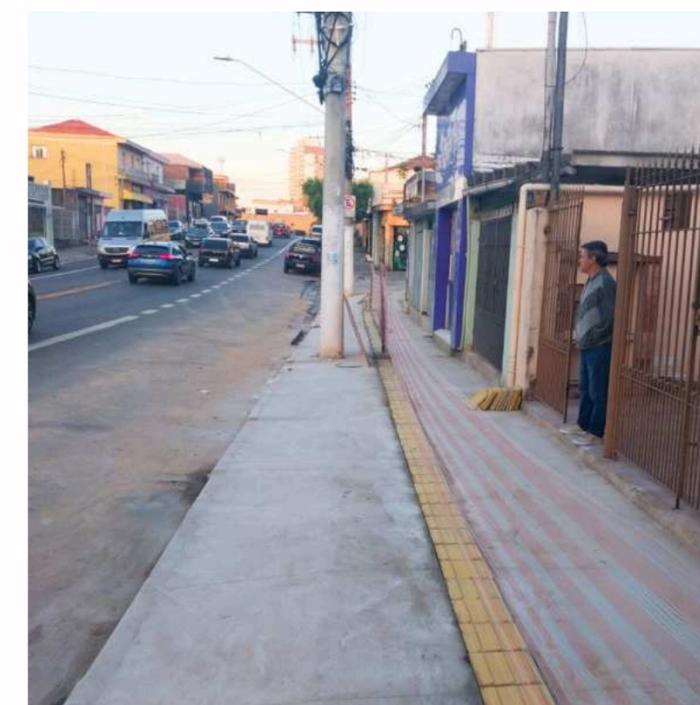


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Penha - Contrato 2
Endereço	Rua Itigunçu/ Rua São Serapião/ Rua Pangaua/ Rua Maria Carlota
Nº do Termo de Contrato	399/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0014794-6
Data da OIS	07/08/2023
Data de término	29/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 620.292,74
Valor Aprovado	R\$ 1.934.309,75
Valor Empenhado	R\$ 1.934.309,75
Valor Liquidado	R\$ 0,00

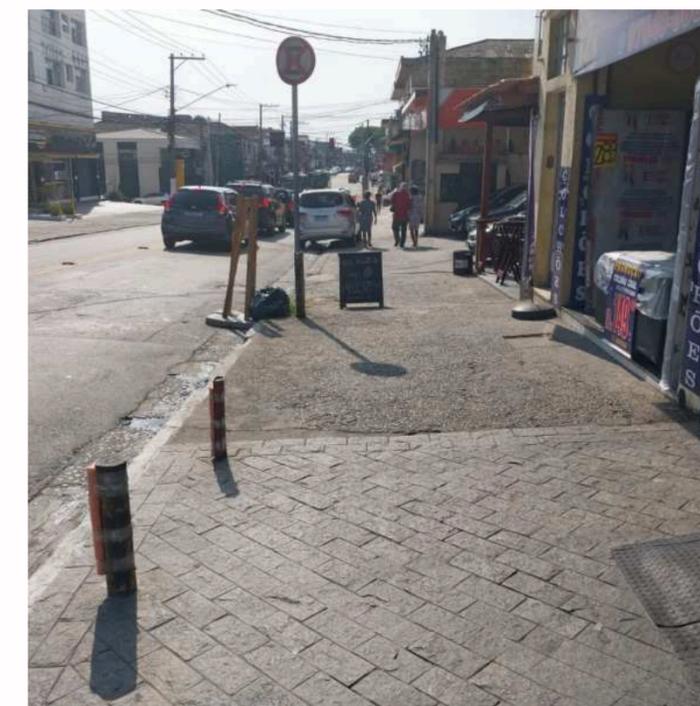


Foto antes

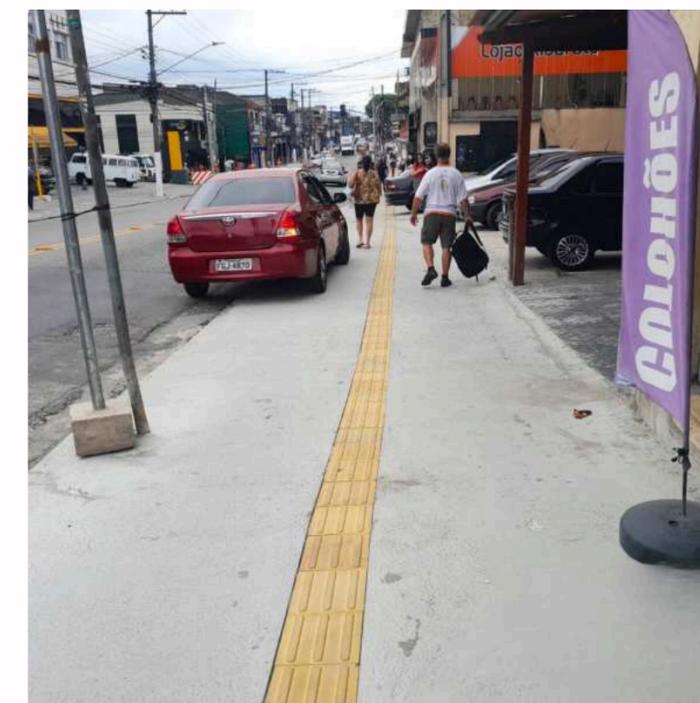


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Jaçanã/Tremembé - Contrato 3
Endereço	Avenida Paulo Lincoln do Vale Pontin/ Rua Emilia Machado de Figueiredo/Avenida Antônio Cesar Neto
Nº do Termo de Contrato	32/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2023/0029324-1
Data da OIS	26/04/2024
Data de término	25/06/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 1.213.814,29
Valor Aprovado	R\$ 1.213.814,29
Valor Empenhado	R\$ 1.213.814,29
Valor Liquidado	R\$ 878.051,25



Foto antes



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Perus - Contrato 4
Endereço	Rua Mogeiro
Nº do Termo de Contrato	007/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2023/0029326-8
Data da OIS	26/02/2024
Data de término	25/06/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 920.057,14
Valor Aprovado	R\$ 920.057,14
Valor Empenhado	R\$ 920.057,14
Valor Liquidado	R\$ 0,00

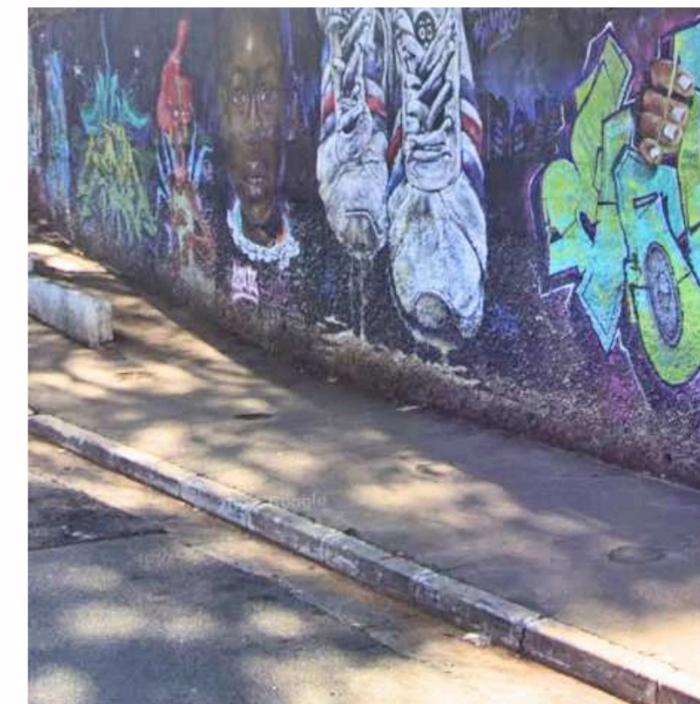


Foto antes



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Casa Verde - Contrato 2
Endereço	Avenida Casa Verde
Nº do Termo de Contrato	025/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2024/0000224-9
Data da OIS	15/02/2024
Data de término	14/06/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 2.615.955,34
Valor Aprovado	R\$ 2.615.955,34
Valor Empenhado	R\$ 2.615.955,34
Valor Liquidado	R\$ 8.911,69

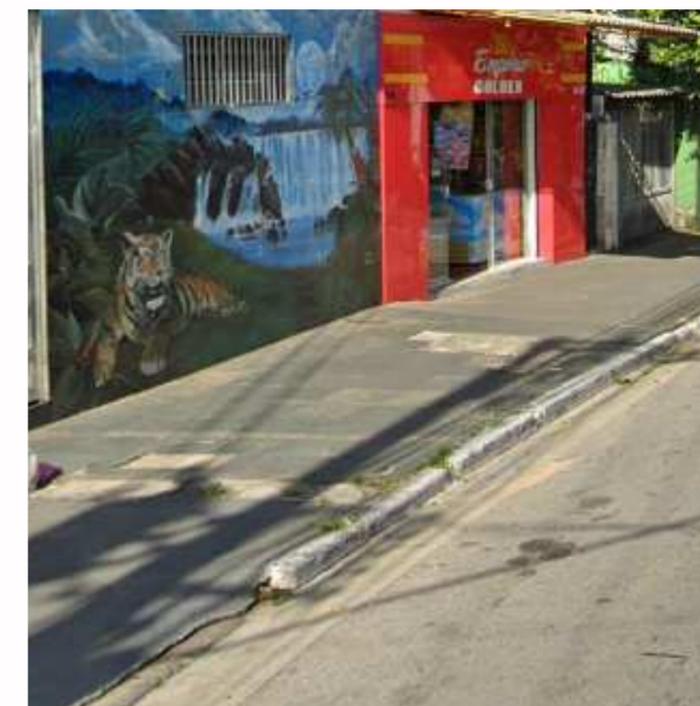


Foto antes

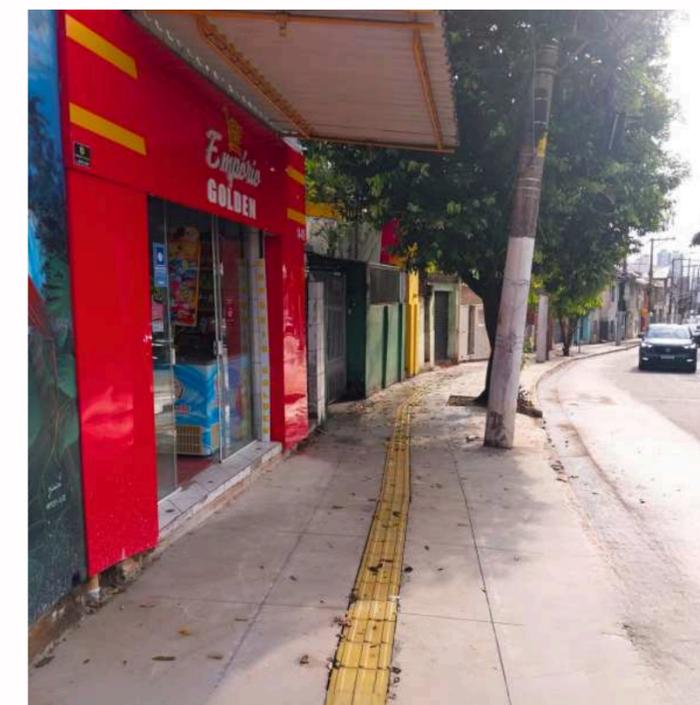


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Santo Amaro - Contrato 3
Endereço	Avenida Interlagos/ Avenida Yervant Kissajikian
Nº do Termo de Contrato	40/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2024/0000228-1
Data da OIS	19/03/2024
Data de término	17/07/2024
% de Execução	Suspenso

Valor do Contrato	R\$ 2.038.475,68
Valor Aprovado	R\$ 2.038.475,68
Valor Empenhado	R\$ 2.038.475,68
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto antes



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Lapa - Contrato 2
Endereço	Rua Nossa Senhora da Lapa/ Rua Barão de Jundiaí/ Rua Doze de Outubro/ Rua Clelia/ Rua Faustolo/ Rua Jeroaquara
Nº do Termo de Contrato	024/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2024/0000753-4
Data da OIS	26/02/2024
Data de término	25/06/2024
% de Execução	Suspensa

Valor do Contrato	R\$ 1.878.106,70
Valor Aprovado	R\$ 1.878.106,70
Valor Empenhado	R\$ 1.878.106,70
Valor Liquidado	R\$ 0,00

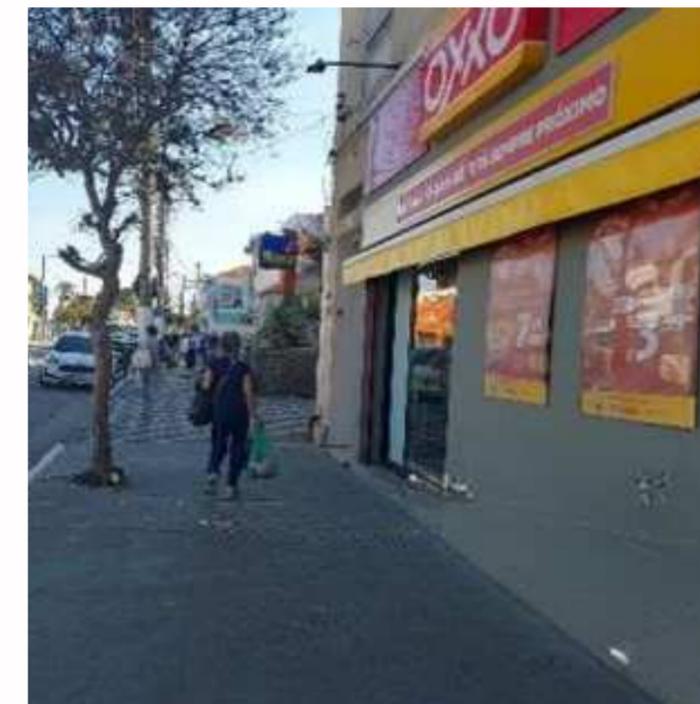


Foto local



Foto local

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Lapa - Contrato 3
Endereço	Rua Coriolano/ Rua Monteiro de Melo/ Rua Catão/ Rua Faustolo
Nº do Termo de Contrato	023/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2024/0000766-6
Data da OIS	26/02/2024
Data de término	25/06/2024
% de Execução	Suspensa

Valor do Contrato	R\$ 1.988.645,57
Valor Aprovado	R\$ 1.988.645,57
Valor Empenhado	R\$ 1.988.645,57
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto local

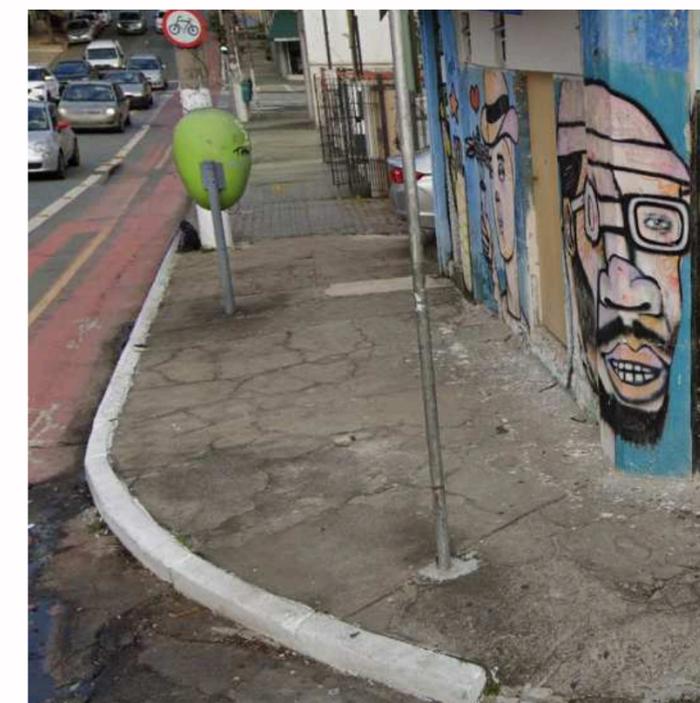


Foto local

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Pinheiros - Contrato 2
Endereço	Avenida Padre Antônio José dos Santos
Nº do Termo de Contrato	21/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2024/0000846-8
Data da OIS	26/02/2024
Data de término	25/06/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 642.733,76
Valor Aprovado	R\$ 642.733,76
Valor Empenhado	R\$ 642.733,76
Valor Liquidado	R\$ 0,00

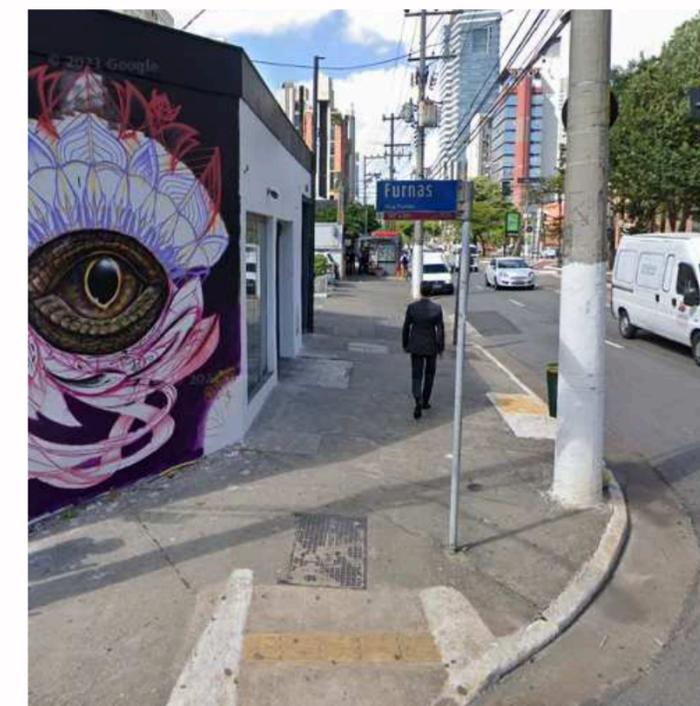


Foto antes

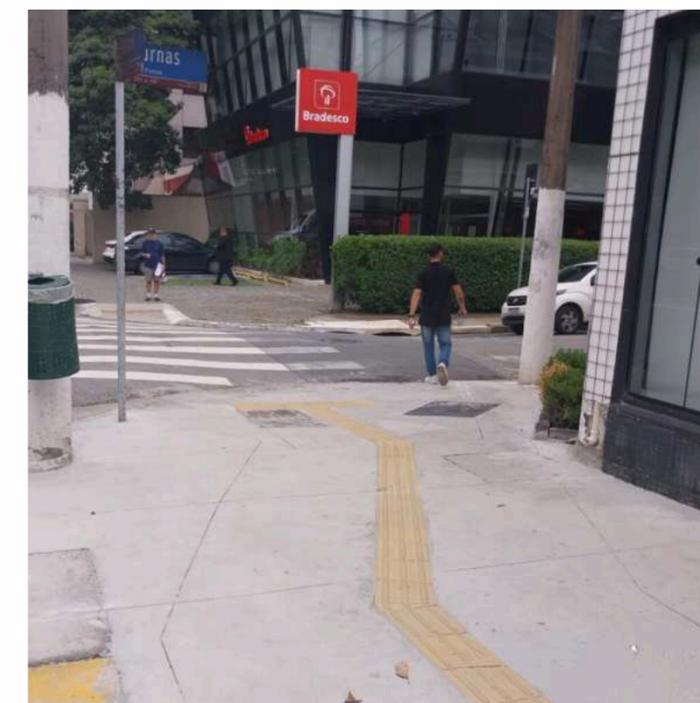


Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Lapa - Contrato 4
Endereço	Avenida Prof. Alfonso Bovero
Nº do Termo de Contrato	41/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2024/0001010-1
Data da OIS	25/04/2024
Data de término	23/08/2024
% de Execução	Suspenso

Valor do Contrato	R\$ 1.287.134,44
Valor Aprovado	R\$ 1.287.134,44
Valor Empenhado	R\$ 1.287.134,44
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto local

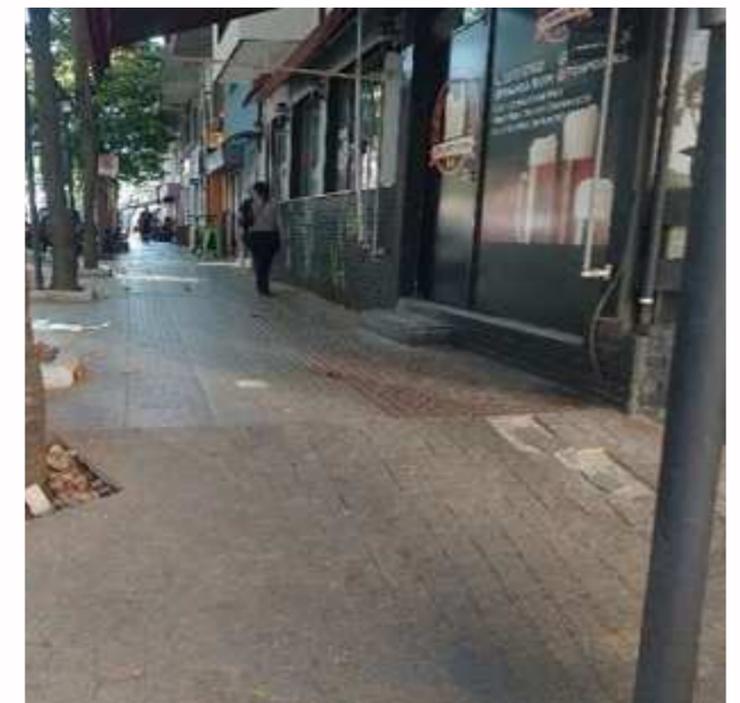


Foto local

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Cidade Tiradentes - Contrato 6
Endereço	Avenida dos Metalúrgicos
Nº do Termo de Contrato	043/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2024/0003827-8
Data da OIS	22/03/2024
Data de término	20/07/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 365.690,70
Valor Aprovado	R\$ 365.690,70
Valor Empenhado	R\$ 365.690,70
Valor Liquidado	R\$ 0,00

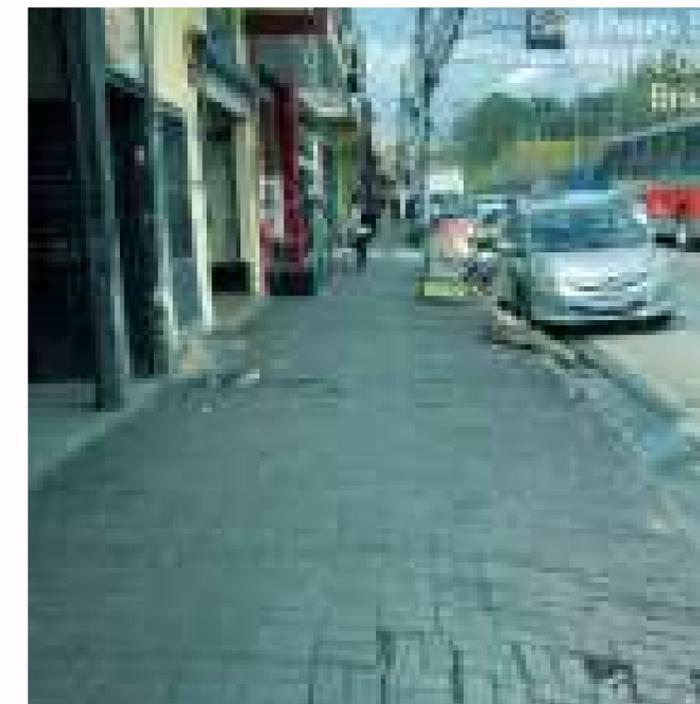


Foto antes



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	São Miguel Paulista - Contrato 3
Endereço	Avenida Marechal Tito/ Av. Nordeste/ Av. Pires do Rio/ Avenida Antônio Bernardo Silvestre/ Rua Henrique de Paula França
Nº do Termo de Contrato	042/SMSUB/COGEL/2024
Nº do SEI	6012.2024/0004875-3
Data da OIS	13/03/2024
Data de término	11/07/2024
% de Execução	Concluído

Valor do Contrato	R\$ 7.196.536,28
Valor Aprovado	R\$ 7.196.536,28
Valor Empenhado	R\$ 7.196.536,28
Valor Liquidado	R\$ 5.625.591,90



Foto antes



Foto depois

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Objeto	Calçadas contempladas no Plano Emergência de Calçadas [MOB]
Subprefeitura	Santana Tucuçuvi - Contrato 3 / Butantã - Contrato 2
Endereço	Avenida Conselheiro Moreira de Barros / Avenida Vital Brasil/ Rua André Furtado
Nº do SEI	6012.2023/0016484-0 / 6012.2023/0016929-0
% de Execução	Concluída

Valor Aprovado	Genérico
Valor Empenhado	R\$ 263.539,52
Valor Liquidado	R\$ 65.699,46

REFORMA E ACESSIBILIDADE EM PASSEIOS PÚBLICOS [MOB]:

Santana Tucuruvi - Contrato 3 - Avenida Conselheiro Moreira de Barros	
Valor do Contrato	R\$ 271.984,82
Valor Liquidado	R\$ 36.028,84
Situação	Concluída

Butantã - Contrato 2 - Avenida Vital Brasil/ Rua André Furtado	
Valor do Contrato	R\$ 903.117,69
Valor Liquidado	R\$ 29.670,62
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois



Foto antes



Foto depois

**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE)[MOB]:
META 34 DO PDM 2021/2024**

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	Aricanduva Formosa
Endereço	Rua Rego Barros - Tr. II (Entre Av. Vereador Emilio Meneghini até o final da via)
Nº do Termo de Contrato	1111/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0027061-6
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	29/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MQU

Valor do Contrato	R\$ 5.406.505,55
Valor Aprovado	R\$ 5.343.914,09
Valor Empenhado	R\$ 5.057.252,01
Valor Liquidado	R\$ 5.057.252,01

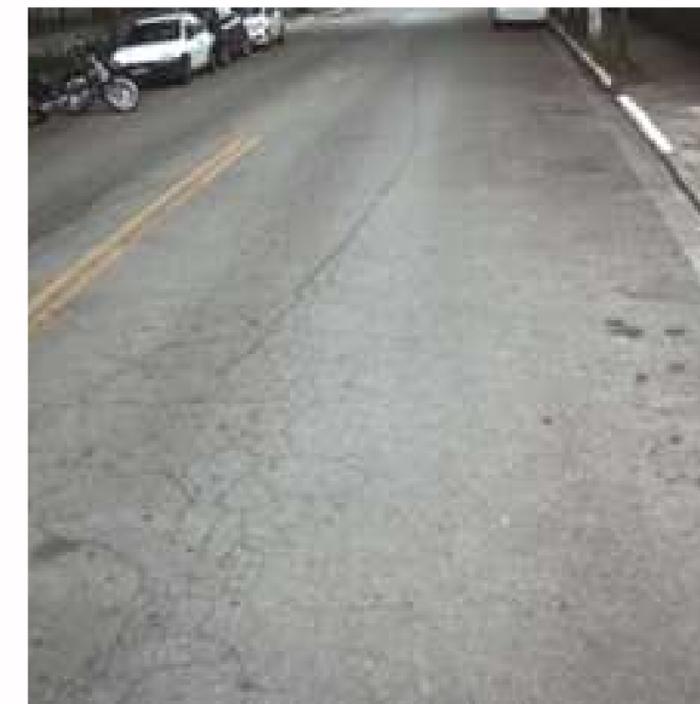


Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	Lapa
Endereço	Avenida Ricardo Medina Filho (Entre Rua Tonelero e Rua Tito)
Nº do Termo de Contrato	908/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026095-5
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	17/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUC

Valor do Contrato	R\$ 7.819.408,98
Valor Aprovado	R\$ 7.754.284,55
Valor Empenhado	R\$ 7.085.620,31
Valor Liquidado	R\$ 7.085.620,31

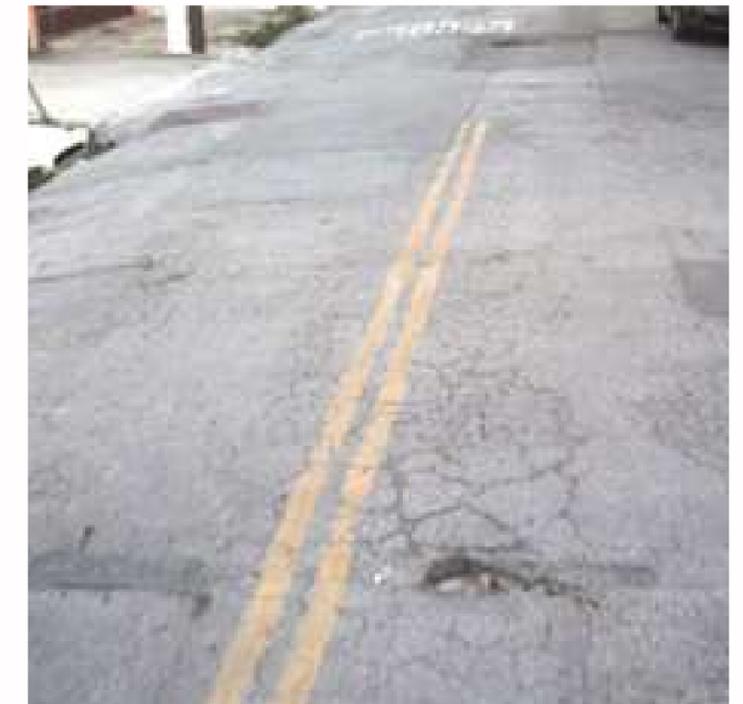


Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	LAPA
Endereço	Rua Marselha (Entre Avenida Pres. Altino e Rua Catalunha)
Nº do Termo de Contrato	909/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026096-3
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	11/07/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MQU

Valor do Contrato	R\$ 6.757.912,63
Valor Aprovado	R\$ 6.683.806,71
Valor Empenhado	R\$ 5.448.192,88
Valor Liquidado	R\$ 5.448.192,88



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	LAPA
Endereço	Rua Gustav Willi Borghoff (Entre a AVenida Nicolas Boer e Rua Jorn. Aloysio Biondi)
Nº do Termo de Contrato	1038/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026203-6
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	14/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MEM
Valor do Contrato	R\$ 6.603.959,35
Valor Aprovado	R\$ 6.555.747,39
Valor Empenhado	R\$ 5.316.744,61
Valor Liquidado	R\$ 5.316.744,61



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	Lapa
Endereço	Rua Dr. Miranda de Azevedo (Entre R. Coriolano e Rua João Jabotam)
Nº do Termo de Contrato	1040/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026122-6
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	14/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUC

Valor do Contrato	R\$ 6.434.497,02
Valor Aprovado	R\$ 6.359.485,75
Valor Empenhado	R\$ 5.832.041,13
Valor Liquidado	R\$ 5.832.041,13

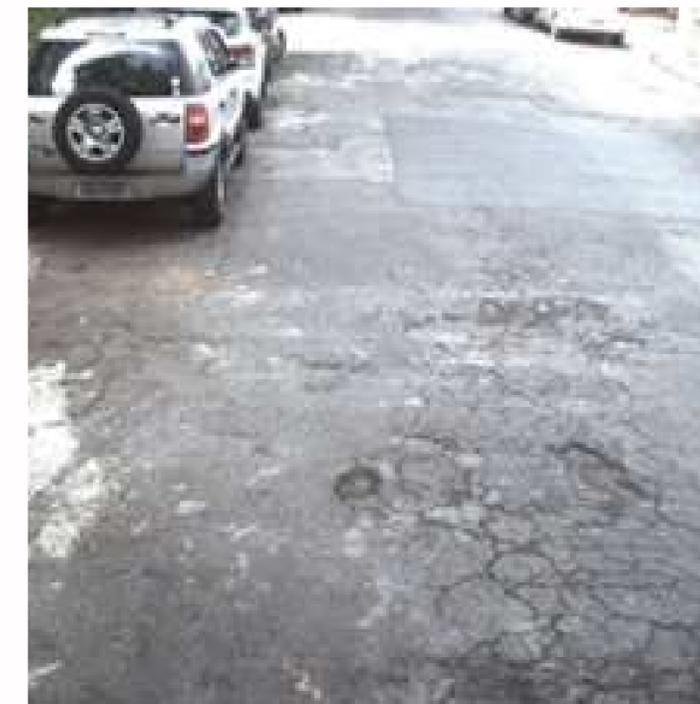


Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	Lapa
Endereço	Rua Bartolomeu Paes (Entre a Rua Conselheiro Ribas e Avenida Raimundo Pereira de Magalhães)
Nº do Termo de Contrato	963/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026201-0
Data da OIS	13/12/2023
Data de término	12/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MEM
Valor do Contrato	R\$ 4.798.757,18
Valor Aprovado	R\$ 4.749.089,59
Valor Empenhado	R\$ 4.310.104,29
Valor Liquidado	R\$ 4.310.104,29



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	Lapa
Endereço	Rua Paúa (Entre Rua Custódio Serrão e Avenida Cândido Portinari)
Nº do Termo de Contrato	1037/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026204-4
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	13/04/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MQU

Valor do Contrato	R\$ 4.424.526,83
Valor Aprovado	R\$ 4.376.227,59
Valor Empenhado	R\$ 3.829.219,70
Valor Liquidado	R\$ 3.829.219,70



Foto antes:

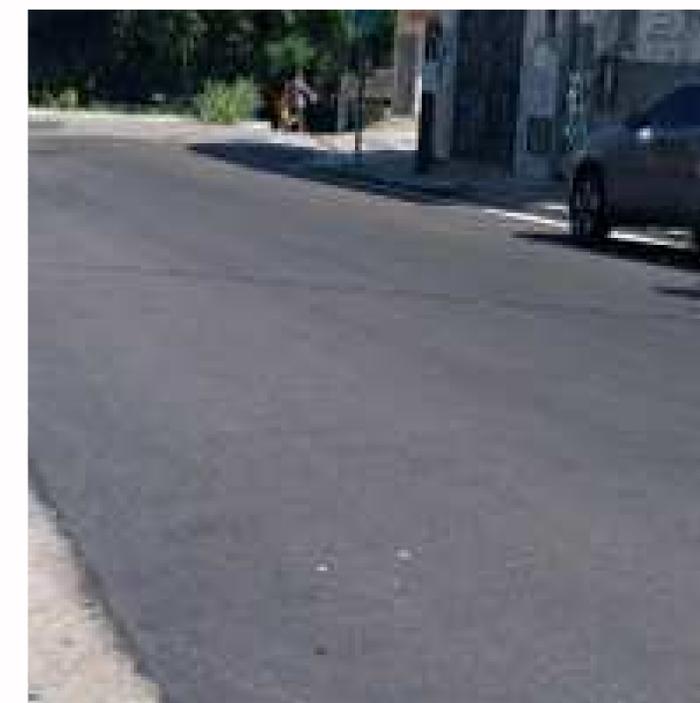


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	Pinheiros
Endereço	Rua João Moura (Entre Rua Marinho Falcão/ Rua Heitor Penteado e Rua Atlântica)
Nº do Termo de Contrato	980/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026837-9
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	01/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUC
Valor do Contrato	R\$ 8.382.910,07
Valor Aprovado	R\$ 8.252.415,26
Valor Empenhado	R\$ 6.598.719,05
Valor Liquidado	R\$ 6.598.719,05



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	Pinheiros
Endereço	R. Guaraiúva(entre Av. Jorn. Roberto Marinho e Av. dos Bandeirantes)
Nº do Termo de Contrato	893/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026101-3
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	10/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUC/MEM

Valor do Contrato	R\$ 6.600.123,14
Valor Aprovado	R\$ 6.544.373,24
Valor Empenhado	R\$ 5.195.315,46
Valor Liquidado	R\$ 5.195.315,46

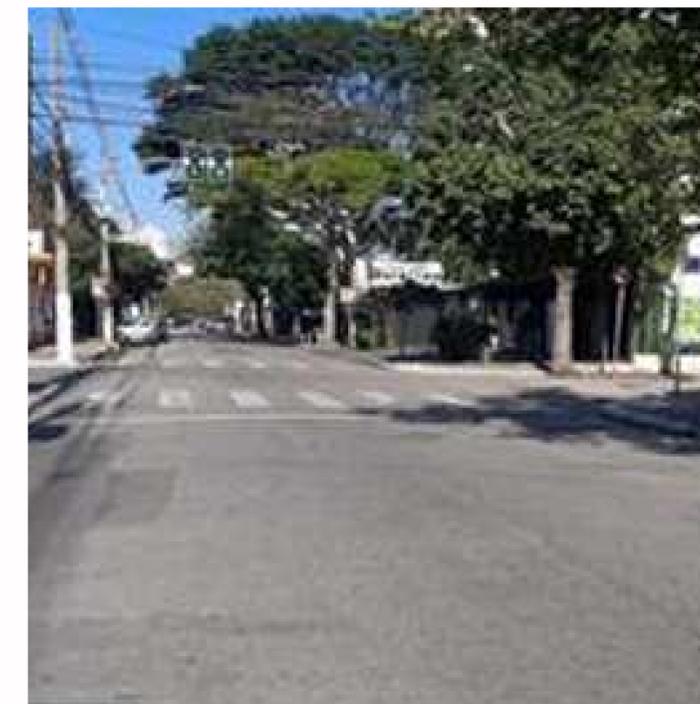


Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	Pinheiros
Endereço	Rua Professora Vahia de Abreu (Entre Avenida Santo Amaro e Rua Nova Cidade)
Nº do Termo de Contrato	978/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026841-7
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	13/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MEM
Valor do Contrato	R\$ 3.254.129,41
Valor Aprovado	R\$ 3.224.946,58
Valor Empenhado	R\$ 1.068.721,95
Valor Liquidado	R\$ 1.068.721,95

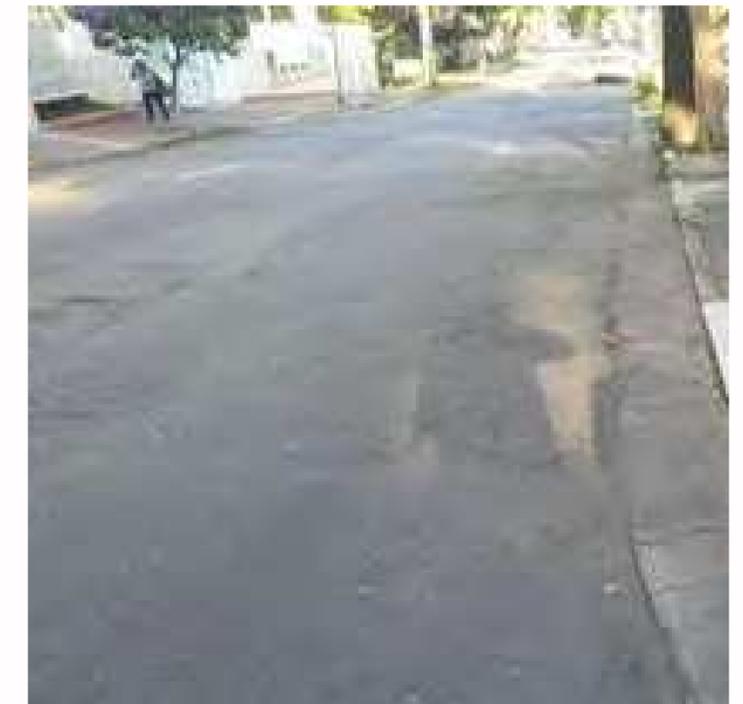


Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	Pirituba/ Jaraguá
Endereço	Rua Ademar Martins de Freitas (Entre Rua pe. Aibal Difrância e Avenida Elisio Cordeiro de Siqueira)
Nº do Termo de Contrato	918/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0019362-0
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	09/03/2024 (Com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MQU
Valor do Contrato	R\$ 1.022.243,62
Valor Aprovado	R\$ 309.987,00
Valor Empenhado	R\$ 234.985,60
Valor Liquidado	R\$ 234.985,60

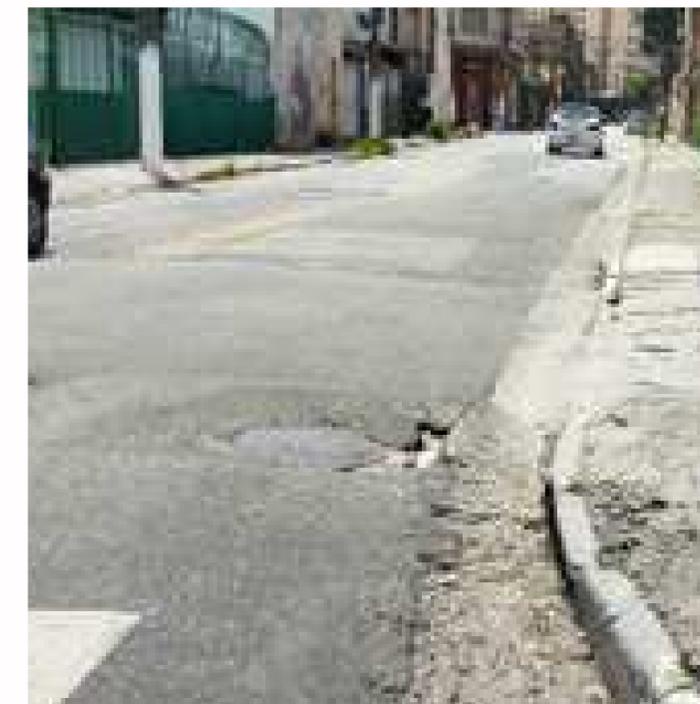


Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[MOB]
Subprefeitura	Pirituba - Jaraguá/ Pinheiros/ Capela do Socorro/ Penha/ Aricanduva - Formosa/ Mooca
Endereço	Rua Maria José Vasconcellos Mankel/ Rua das Margaridas/ Praça Lisboa Praça Lisboa/ Avenida Ipanema/ Rua Jaime Schunk Branco/ Rua Nossa Senhora do Socorro/ Rua Dr. Mauro Paes de Almeida/ Rua Nunes de Siqueira/ Rua Souza Melo/ Rua Cirino de Abreu/ Rua Guaraciaba/ Rua Caa-Açu/ Rua Dias Leme/ Rua João Antonio de Oliveira
Nº do SEI	6012.2024/0005613-6; 6012.2024/0005629-2; 6012.2024/0005634-9; 6012.2024/0005663-2; 6012.2024/0012827-7
Classificação viária	Coletora

Valor Aprovado	Genérico
Valor Empenhado	R\$ 10.178.360,76
Valor Liquidado	R\$ 8.612.106,88

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Rua Maria José Vasconcellos Mankel	
Valor Liquidado	R\$ 573.899,30
Situação	Concluída

Rua das Margaridas (SUB-PI)	
Valor Liquidado	R\$ 372.177,20
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois



Foto antes



Foto durante

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Praça Lisboa	
Valor Liquidado	R\$258.614,64
Situação	Concluída

Avenida Ipanema	
Valor Liquidado	R\$132.848,50
Situação	Concluída

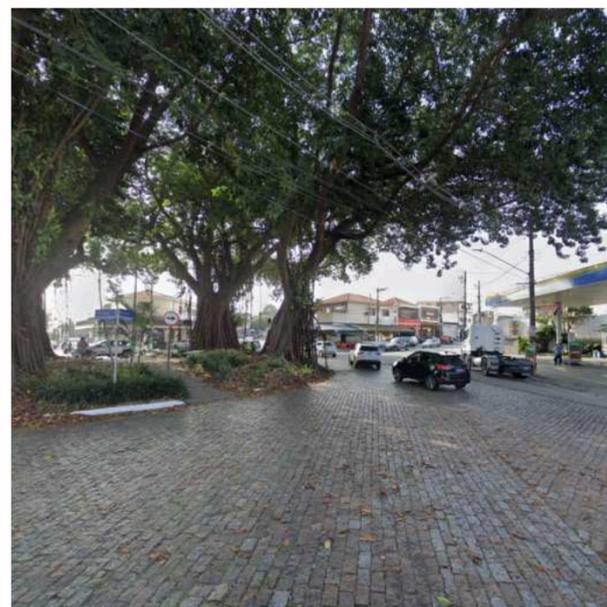


Foto antes

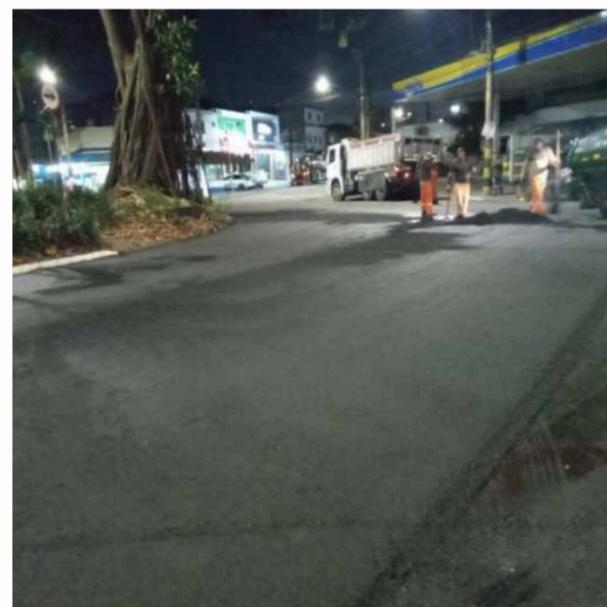


Foto depois



Foto antes

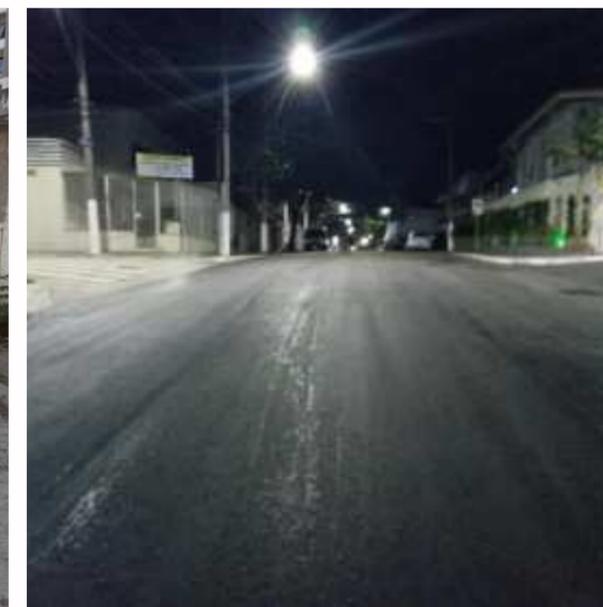


Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Rua Jaime Schunk Branco	
Valor Liquidado	R\$64.592,78
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois

Rua Nossa Senhora do Socorro	
Valor Liquidado	R\$154.398,85
Situação	Concluída

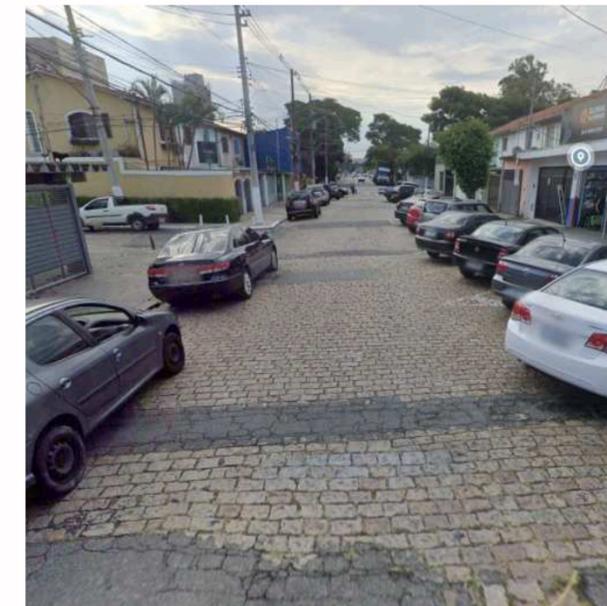


Foto antes

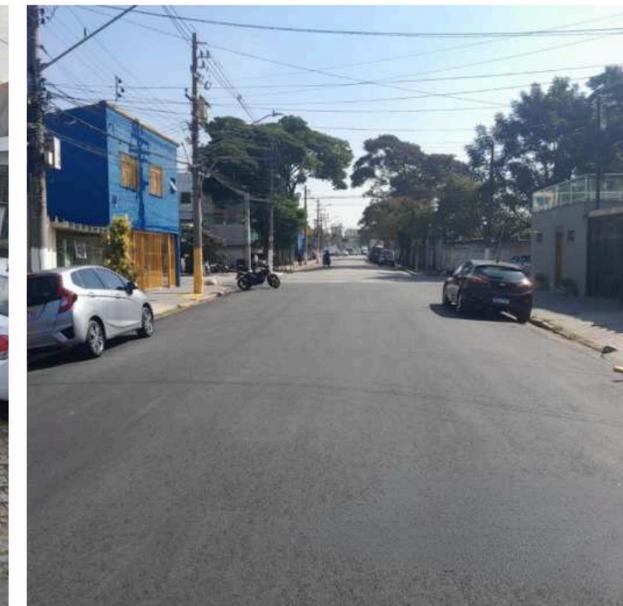


Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Rua Dr. Mauro Paes de Almeida	
Valor Liquidado	R\$507.350,41
Situação	Concluída

Rua Nunes de Siqueira	
Valor Liquidado	R\$286.662,64
Situação	Concluída

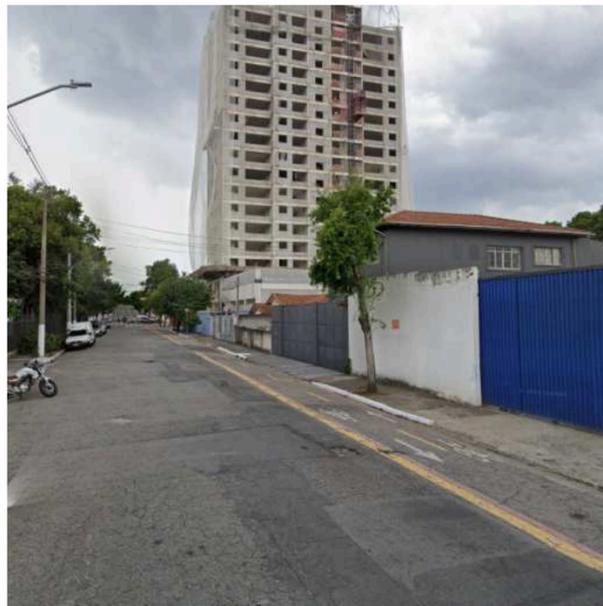


Foto antes

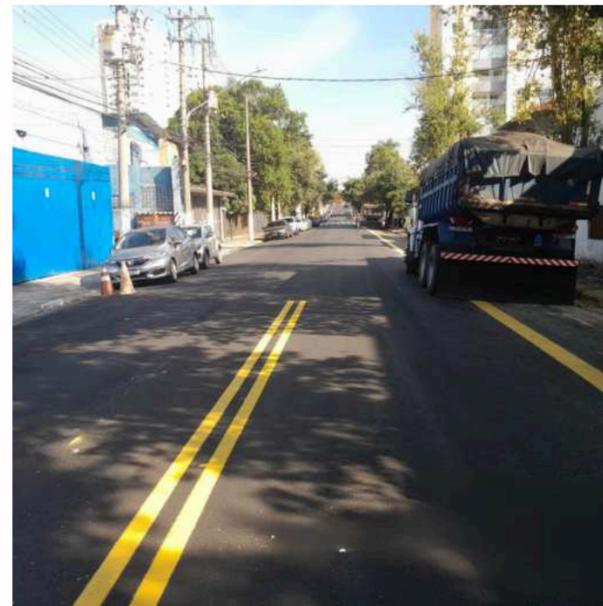


Foto depois



Foto antes



Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Rua Souza Melo	
Valor Liquidado	R\$256.226,90
Situação	Concluída

Rua Cirino de Abreu	
Valor Liquidado	R\$473.438,40
Situação	Concluída

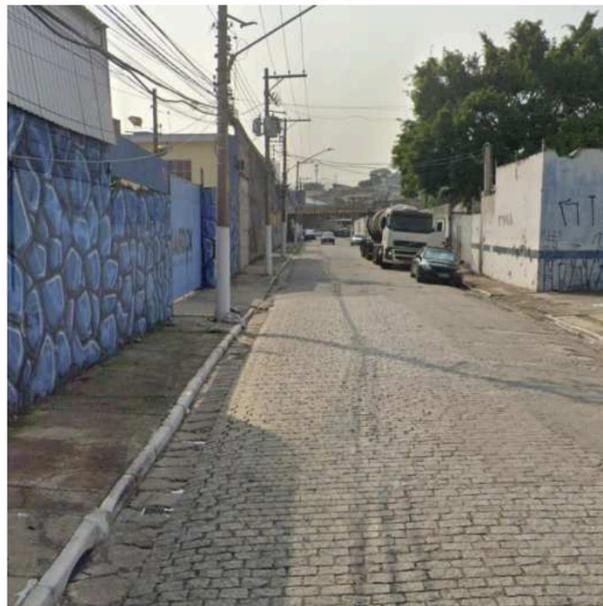


Foto antes



Foto depois



Foto antes



Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Rua Guaraciaba	
Valor Liquidado	R\$1.101.021,50
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois

Rua Caa-Açu	
Valor Liquidado	R\$456.078,12
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [MOB]

Rua Dias Leme	
Valor Liquidado	R\$1.098.386,84
Situação	Concluída



Foto antes

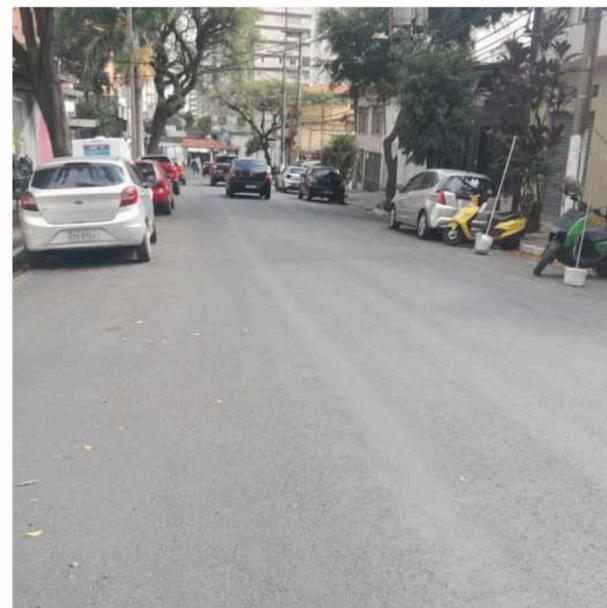


Foto depois

Rua João Antonio de Oliveira	
Valor Liquidado	R\$2.876.410,80
Situação	Concluída

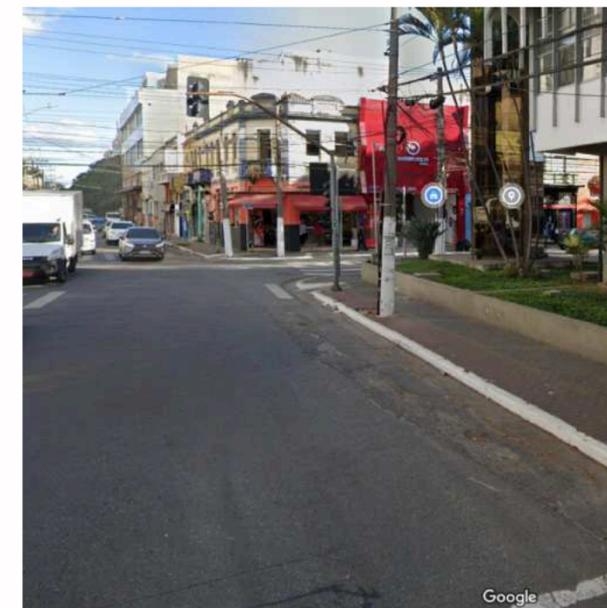


Foto antes



Foto depois

**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE)[LIVRE]:
META 34 DO PDM 2021/2024**

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Butantã
Endereço	Av. Prof. Francisco Morato - Tr. I (Ambos os Sentidos) (entre R. Joaquim Galvão e Av. Lineu de Paula Machado)
Nº do Termo de Contrato	959/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0027496-4
Data da OIS	13/12/2023
Data de término	10/06/2024 (Com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUC/MQU
Valor do Contrato	R\$ 18.018.527,83
Valor Aprovado	R\$ 17.858.624,85
Valor Empenhado	R\$ 14.246.794,18
Valor Liquidado	R\$ 14.246.794,18



Foto antes:

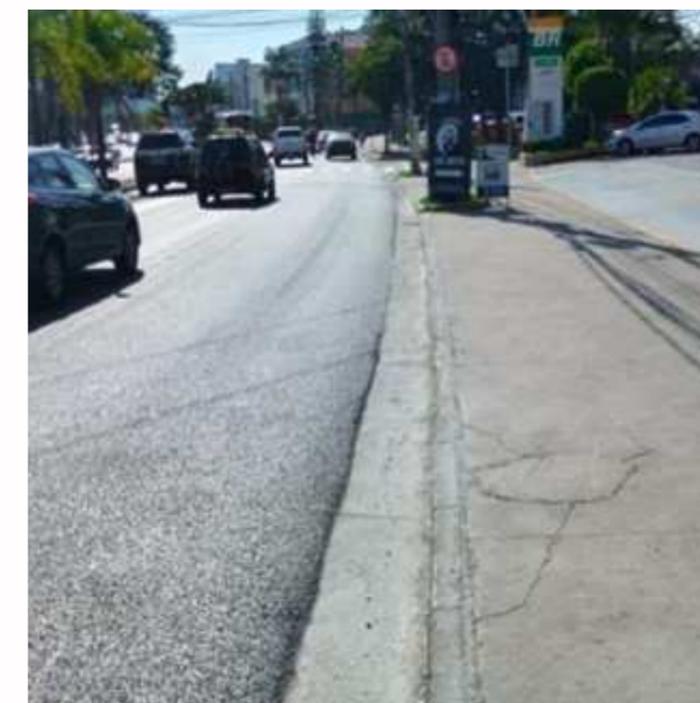


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Butantã
Endereço	Av. Prof. Francisco Morato (Ambos os Sentidos) – Tr. II (entre R. Eng. José Valter Seng e R. José Félix)
Nº do Termo de Contrato	852/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026088-2
Data da OIS	12/12/2023
Data de término	29/04/2024 (Com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUC/MQU
Valor do Contrato	R\$ 12.019.990,65
Valor Aprovado	R\$ 11.852.423,68
Valor Empenhado	R\$ 11.260.246,12
Valor Liquidado	R\$ 11.260.246,12

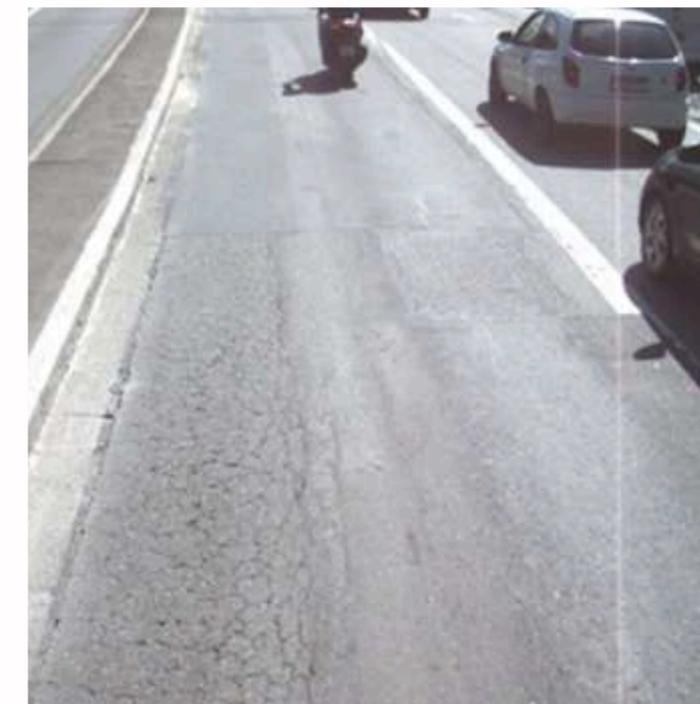


Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Butantã
Endereço	Av. dos Tajurás (entre R. Eng. Oscar Americano e Pte. Cidade Jardim)
Nº do Termo de Contrato	1044/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026112-9
Data da OIS	15/12/2024
Data de término	14/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUC

Valor do Contrato	R\$ 4.487.584,18
Valor Aprovado	R\$ 4.449.915,45
Valor Empenhado	R\$ 4.014.754,07
Valor Liquidado	R\$ 4.014.754,07



Foto antes:

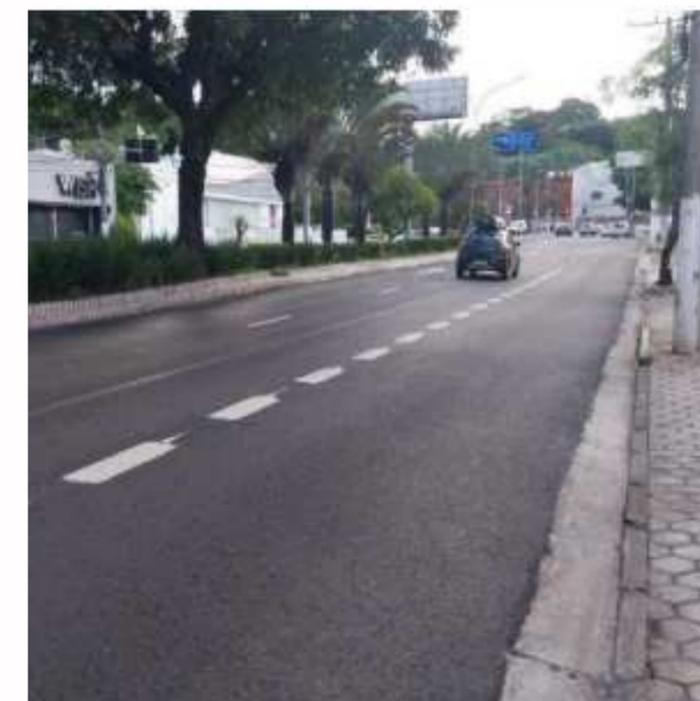


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Capela do Socorro
Endereço	Av. Manuel Alves Soares (entre Av. Pres. João Goulart e Av. Irmã Dulce)
Nº do Termo de Contrato	1107/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026333-4
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	14/05/2024 (Com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUQUA

Valor do Contrato	R\$ 8.541.309,29
Valor Aprovado	R\$ 7.970.529,92
Valor Empenhado	R\$ 5.445.704,25
Valor Liquidado	R\$ 5.445.704,25



Foto antes:



Foto durante:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	MOOCA
Endereço	R. Paraíba (entre R. Maria Marcolina e R. Mendes Júnior)
Nº do Termo de Contrato	997/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026258-3
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	24/03/2024 (Com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MEM

Valor do Contrato	R\$ 1.636.151,98
Valor Aprovado	R\$ 1.377.701,14
Valor Empenhado	R\$ 613.187,87
Valor Liquidado	R\$ 613.187,87



Foto antes:

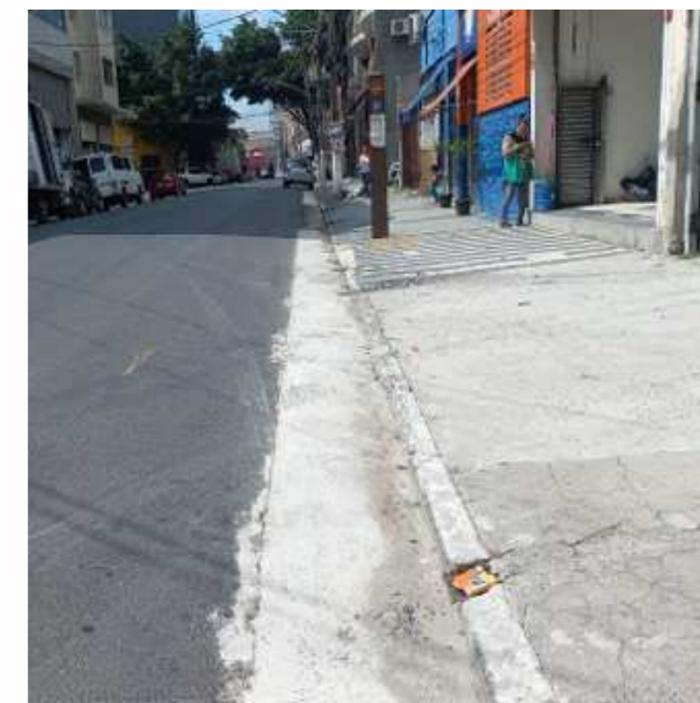


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	MOOCA
Endereço	R. Jaboticabal (entre R. Teresina e R. Corumbaíba)
Nº do Termo de Contrato	845/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0018160-5
Data da OIS	08/12/2023
Data de término	06/04/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MQU

Valor do Contrato	R\$ 8.013.005,27
Valor Aprovado	R\$ 2.685.434,7
Valor Empenhado	R\$ 1.809.580,91
Valor Liquidado	R\$ 1.809.580,91

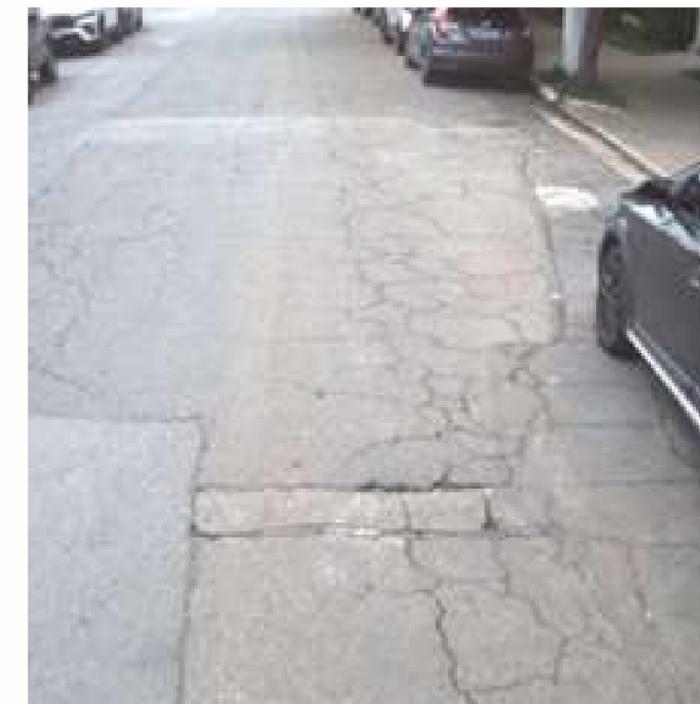


Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Endereço	Av. Mal. Tito – Tr. I (entre Pça. Pe. Aleixo Monteiro Mafra e Passagem sobre Rio Itaquera)
Nº do Termo de Contrato	916/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0018203-2
Data da OIS	13/12/2023
Data de término	12/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MEM
Valor do Contrato	R\$ 9.431.203,36
Valor Aprovado	R\$ 8.779.412,49
Valor Empenhado	R\$ 5.472.411,23
Valor Liquidado	R\$ 5.472.411,23



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Penha
Endereço	R. Pastoril de Itapetinga (R. Camalaú e R. Uniflor)
Nº do Termo de Contrato	1109/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0027018-7
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	15/04/2024 (Com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MEM

Valor do Contrato	R\$ 3.033.832,89
Valor Aprovado	R\$ 2.700.637,07
Valor Empenhado	R\$ 2.090.055,78
Valor Liquidado	R\$ 2.090.055,78



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Pinheiros
Endereço	R. Guararapes (entre Av. Santo Amaro e Av. das Nações Unidas)
Nº do Termo de Contrato	981/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026834-4
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	12/04/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MEM/ MUC

Valor do Contrato	R\$ 9.367.906,18
Valor Aprovado	R\$ 9.294.132,73
Valor Empenhado	R\$ 7.686.148,85
Valor Liquidado	R\$ 7.686.148,85



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Pinheiros
Endereço	R. Alves Guimarães (entre R. Heitor Penteado / Av. Paulo VI e Av. Paulo VI / Av. Rebouças)
Nº do Termo de Contrato	983/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026832-8
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	01/05/2024 (Com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUC

Valor do Contrato	R\$ 6.748.556,16
Valor Aprovado	R\$ 6.666.453,83
Valor Empenhado	R\$ 4.432.935,14
Valor Liquidado	R\$ 4.432.935,14



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Pinheiros
Endereço	R. Madalena (entre R. João Moura e R. Harmonia)
Nº do Termo de Contrato	972/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026844-1
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	13/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUC

Valor do Contrato	R\$ 3.380.848,05
Valor Aprovado	R\$ 3.329.189,37
Valor Empenhado	R\$ 2.157.939,01
Valor Liquidado	R\$ 2.157.939,01

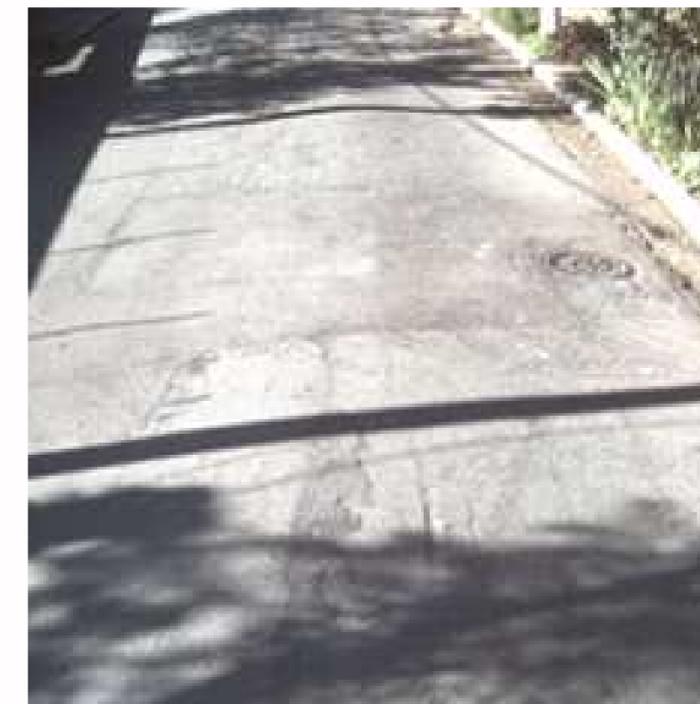


Foto antes:

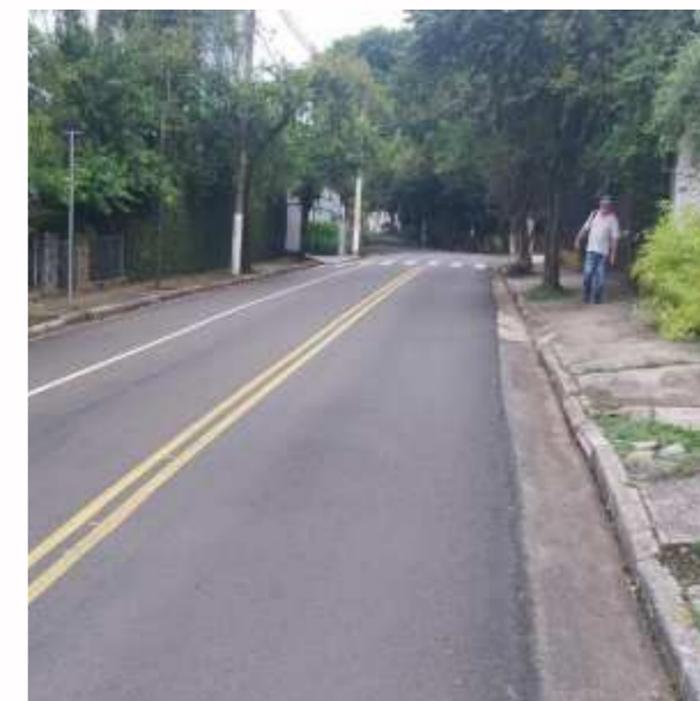


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Pinheiros
Endereço	R. Pereira Leite (entre R. Heitor Penteado e R. Nazaré Paulista)
Nº do Termo de Contrato	969/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026857-3
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	07/03/2024 (Com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUC

Valor do Contrato	R\$ 3.053.815,32
Valor Aprovado	R\$ 3.005.792,59
Valor Empenhado	R\$ 2.470.506,14
Valor Liquidado	R\$ 2.470.506,14



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Pinheiros
Endereço	R. Ribeirão Claro (entre R. Alvorada e R. Fiandeiras)
Nº do Termo de Contrato	988/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026826-3
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	01/03/2024 (Com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MEM

Valor do Contrato	R\$ 2.500.857,02
Valor Aprovado	R\$ 2.472.394,18
Valor Empenhado	R\$ 2.049.964,90
Valor Liquidado	R\$ 2.049.964,90



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Pirituba - Jaraguá
Endereço	R. Antônio Cardoso Nogueira (entre Estr. Turística do Jaraguá e Av. Chica Luísa)
Nº do Termo de Contrato	1078/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0027064-0
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	21/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MCQUA
Valor do Contrato	R\$ 5.155.742,14
Valor Aprovado	R\$ 2.534.561,99
Valor Empenhado	R\$ 2.411.759,52
Valor Liquidado	R\$ 2.411.759,52



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Pirituba- Jaraguá
Endereço	R. Acaricuara (entre R. Francisco da Cunha Menezes e R. Carixó)
Nº do Termo de Contrato	917/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0019359-0
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	25/06/2024 (Com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MEM

Valor do Contrato	R\$ 2.444.681,24
Valor Aprovado	R\$ 1.199.010,99
Valor Empenhado	R\$ 1.168.775,91
Valor Liquidado	R\$ 1.168.775,91



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Vila Maria-Vila Guilherme
Endereço	R. Geolândia (entre R. Jose Antônio da Silva e VP – Catolé do Rocha)
Nº do Termo de Contrato	873/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026292-3
Data da OIS	13/12/2023
Data de término	02/04/2024 (Com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MQU

Valor do Contrato	R\$ 9.061.593,93
Valor Aprovado	R\$ 8.408.257,43
Valor Empenhado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto antes:

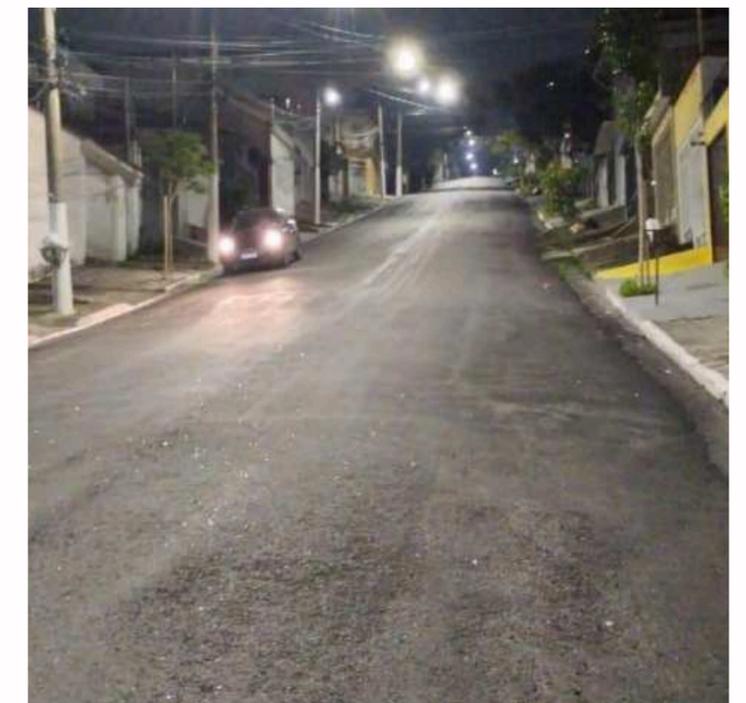


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Mooca
Endereço	R. Barão de Ladário (entre R. João Teodoro e Largo da Concórdia)
Nº do Termo de Contrato	1031/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026255-9
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	11/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MEM

Valor do Contrato	R\$ 3.080.082,48
Valor Aprovado	R\$ 2.711.465,04
Valor Empenhado	R\$ 991.583,12
Valor Liquidado	R\$ 991.583,12



Foto antes:

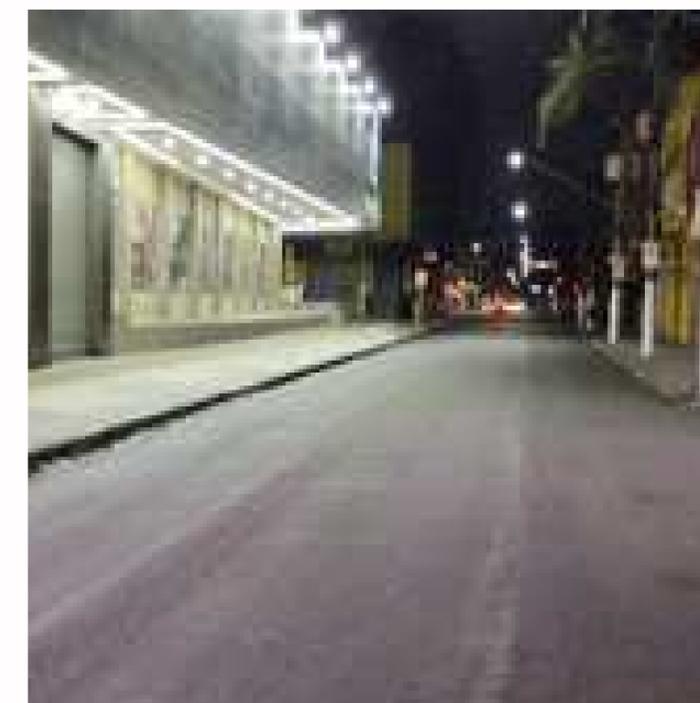


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Santo Amaro
Endereço	R. São Sebastião (entre R. Thomás Deloney e R. Job Lane)
Nº do Termo de Contrato	889/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026317-2
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	03/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MQU

Valor do Contrato	R\$ 4.327.035,33
Valor Aprovado	R\$ 3.854.942,83
Valor Empenhado	R\$ 991.583,12
Valor Liquidado	R\$ 991.583,12



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Sé
Endereço	R. Conse. Furtado (entre R. Anita Garibaldi e R. Pires da Mota)
Nº do Termo de Contrato	1094/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026294-0
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	03/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MUC

Valor do Contrato	R\$
Valor Aprovado	R\$ 5.132.256,45
Valor Empenhado	R\$ 3.667.646,25
Valor Liquidado	R\$ 3.667.646,25



Foto antes:

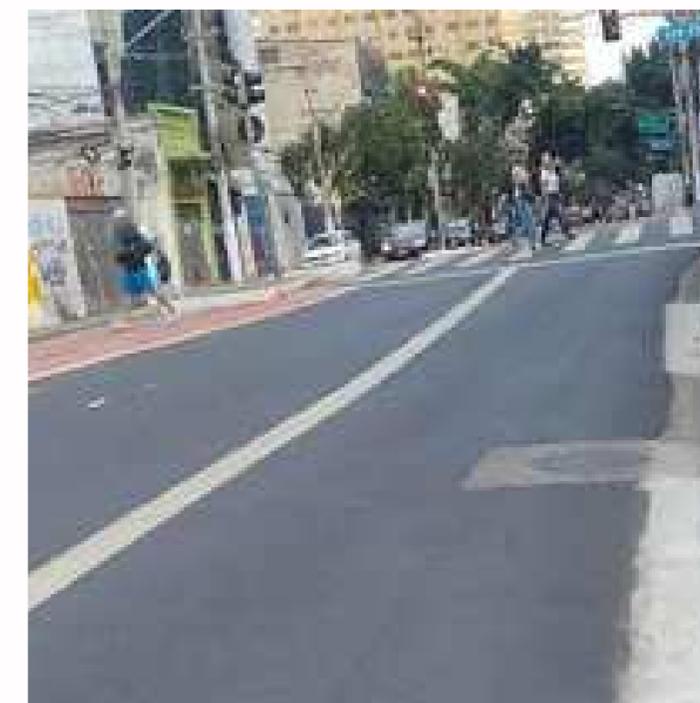


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre]
Subprefeitura	Freguesia - Brasilândia/ Pirituba - Jaraguá/ Butantã/ Pinheiros/ Capela do Socorro/ Mooca
Endereço	Rua Luiz Leite de Sousa/ Rua João Melo da Câmara/ Rua Pascoal Montanha/ Rua Antônia Felícia/ Rua Professor Sílvio de Sá e Silva/ Rua Anguilhada/ Rua Itucumã/ Rua Lício Marcondes do Amaral/ Rua Engenheiro Elias Machado de Almeida/ Rua São Manuel/ Rua Claudio Soares/ Rua dos Cariris/ Rua Novo Cancioneiro/ Rua Guido Caloi/ Rua das Crisandalias/ Rua Meteoro/ Rua dos Inocentes/ Rua Luiz Braz de Lara/ Rua Aiurama/ Rua Pacapiá/ Rua Avaí/ Rua Manaus/ Rua Décio Ábramo/ Rua dos Campineiros/ Rua França de Carvalho/ Rua Marina Crespi
Nº do SEI	6012.2024/0005613-6; 6012.2024/0005622-5; 6012.2024/0005629-2; 6012.2024/0005634-9; 6012.2024/0005663-2; 6012.2024/0012827-7

Valor Aprovado	Genérico
Valor Empenhado	R\$ 45.765.058,46
Valor Liquidado	R\$ 10.812.248,41

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua Luiz Leite de Sousa	
Valor Liquidado	R\$ 71.646,73
Situação	Concluída



Foto antes

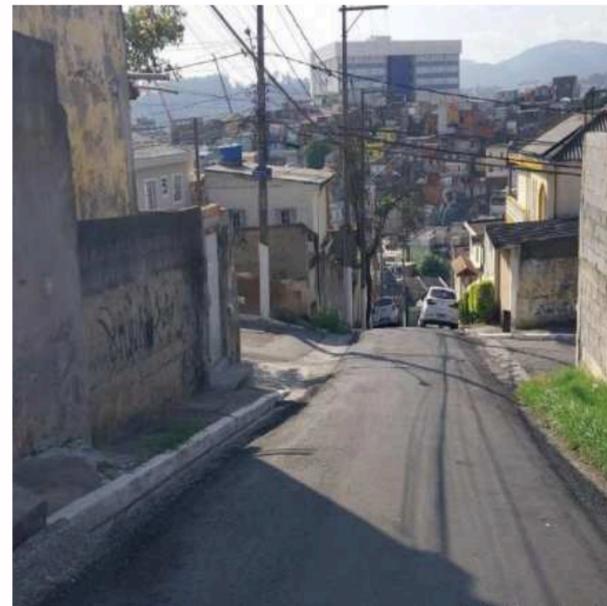


Foto depois

Rua João Melo da Câmara	
Valor Liquidado	R\$249.089,58
Situação	Concluída

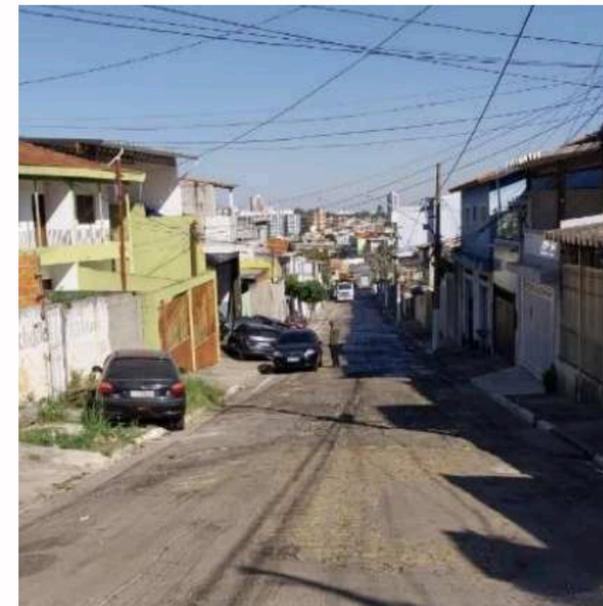


Foto antes



Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua Pascoal Montanha	
Valor Liquidado	R\$105.182,32
Situação	Concluída

Rua Antônia Felícia	
Valor Liquidado	R\$342.386,58
Situação	Concluída



Foto antes

Foto depois

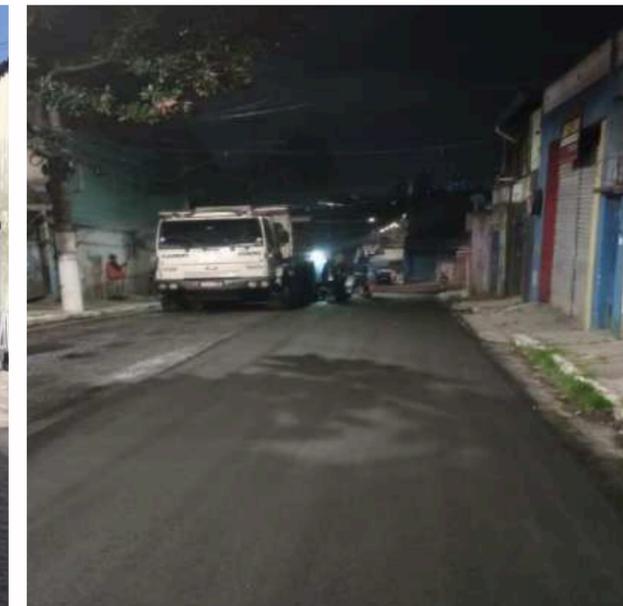


Foto antes

Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua Professor Sílvio de Sá e Silva	
Valor Liquidado	R\$211.592,22
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois

Rua Anguilhada	
Valor Liquidado	R\$179.451,64
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua Itucumã	
Valor Liquidado	R\$73.402,26
Situação	Concluída



Foto antes



Foto durante

Rua Lício Marcondes do Amaral	
Valor Liquidado	R\$835.107,44
Situação	Concluída

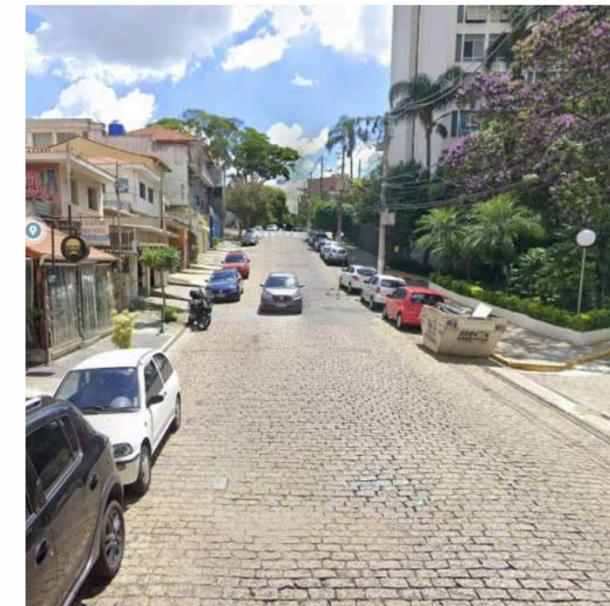


Foto antes



Foto durante

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua Engenheiro Elias Machado de Almeida	
Valor Liquidado	R\$348.684,34
Situação	Concluída

Rua São Manuel	
Valor Liquidado	R\$243.267,17
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois

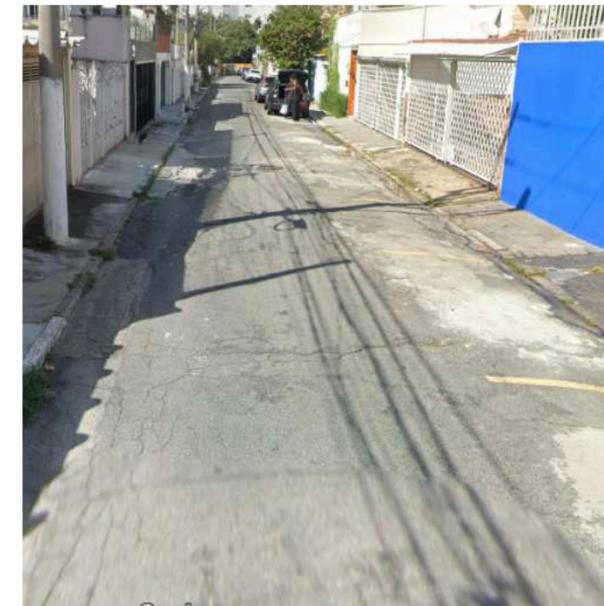


Foto antes



Foto durante

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua Claudio Soares	
Valor Liquidado	R\$300.642,05
Situação	Concluída

Rua dos Cariris	
Valor Liquidado	R\$631.305,87
Situação	Concluída



Foto antes

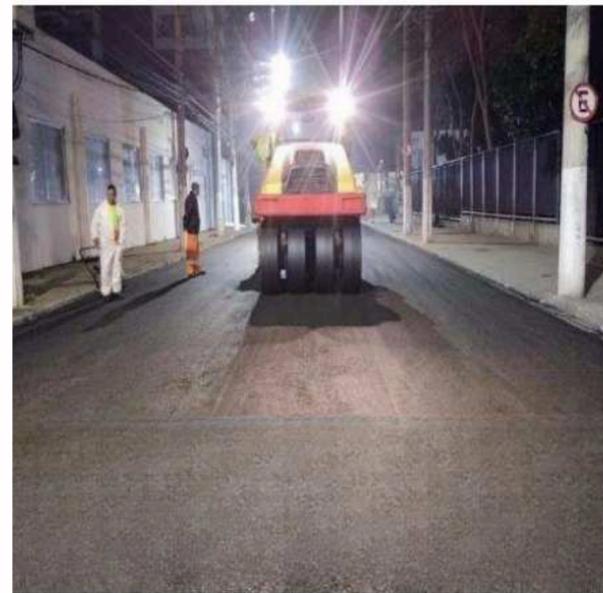


Foto durante



Foto antes



Foto durante

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua Novo Cancioneiro	
Valor Liquidado	R\$195.417,34
Situação	Concluída

Rua Guido Caloi	
Valor Liquidado	R\$100.828,25
Situação	Concluída

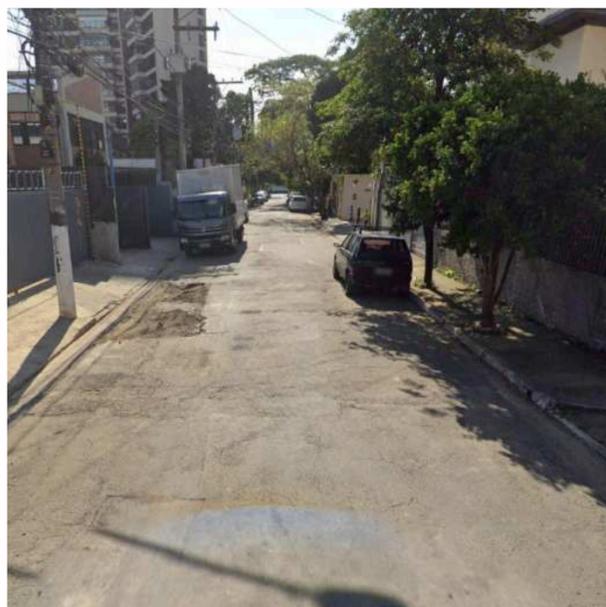


Foto antes

Foto durante

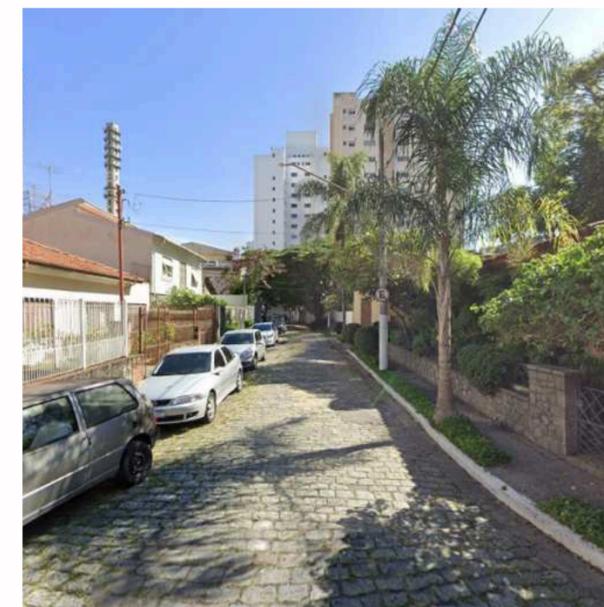


Foto antes

Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua das Crisandalias	
Valor Liquidado	R\$182.472,05
Situação	Concluída

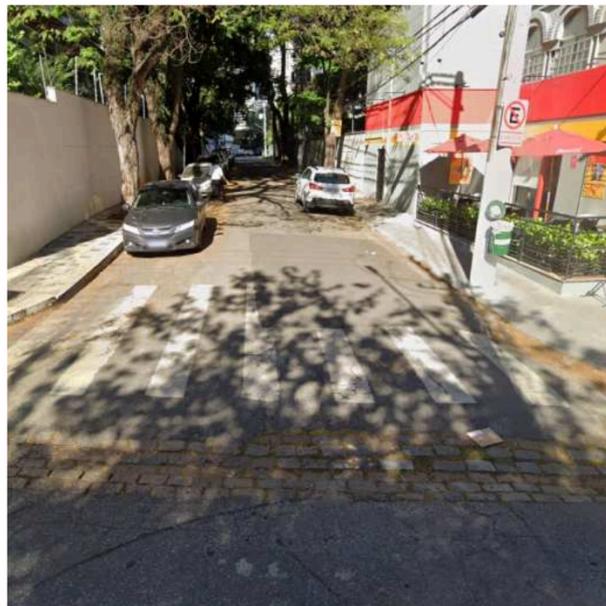


Foto antes:



Foto durante:

Rua Meteoro	
Valor Liquidado	R\$110.883,86
Situação	Concluída

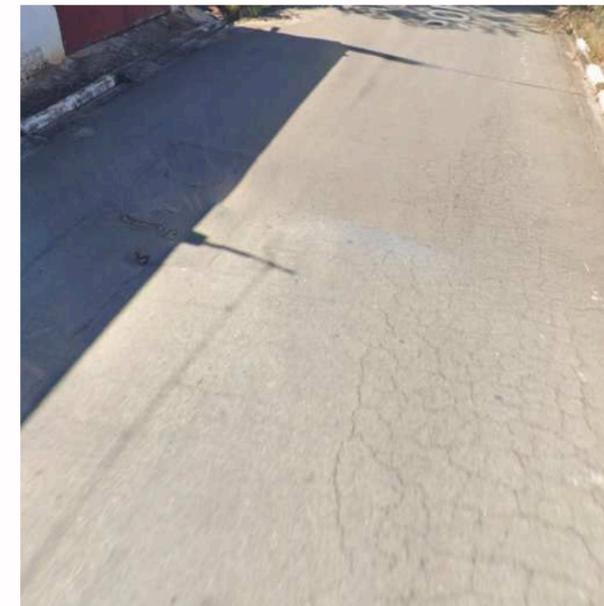


Foto antes:



Foto durante:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua dos Inocentes	
Valor Liquidado	R\$1.124.007,68
Situação	Concluída

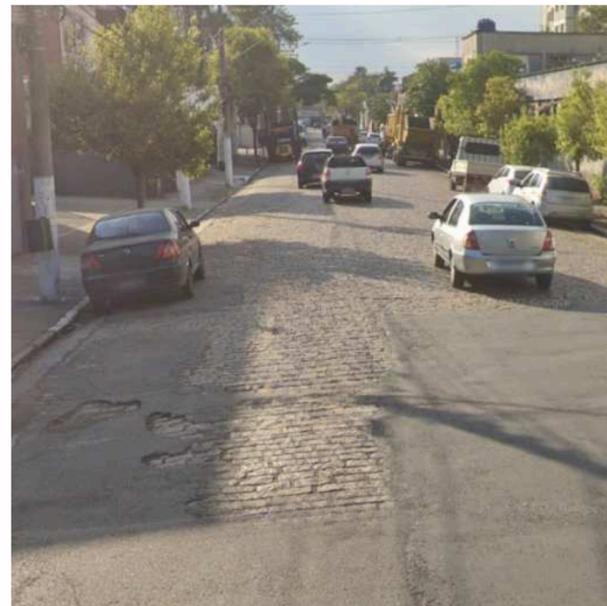


Foto antes



Foto depois

Rua Luiz Braz de Lara	
Valor Liquidado	R\$54.378,92
Situação	Concluída



Foto antes

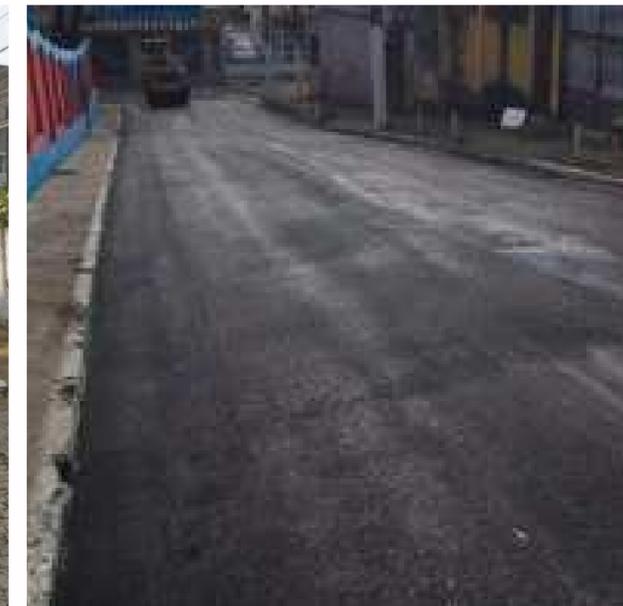


Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua Aiurama	
Valor Liquidado	R\$26.300,36
Situação	Concluída

Rua Pacapiá	
Valor Liquidado	R\$98.940,91
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois



Foto antes



Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua Avaí	
Valor Liquidado	R\$738.685,10
Situação	Concluída

Rua Manaus	
Valor Liquidado	R\$1.139.215,80
Situação	Concluída



Foto antes

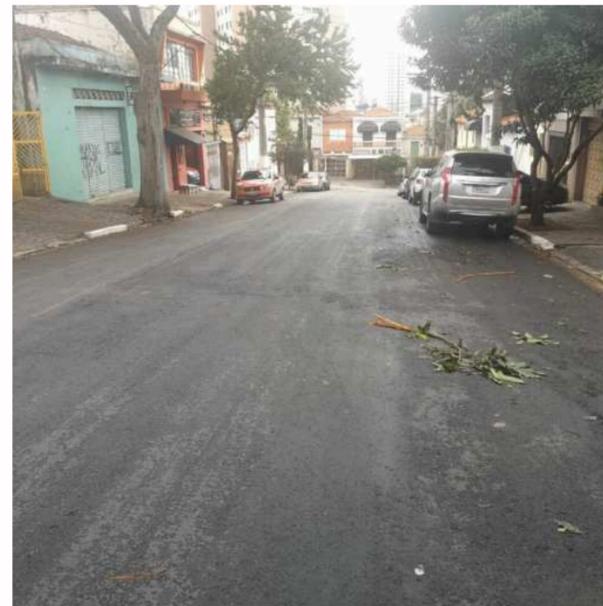


Foto depois

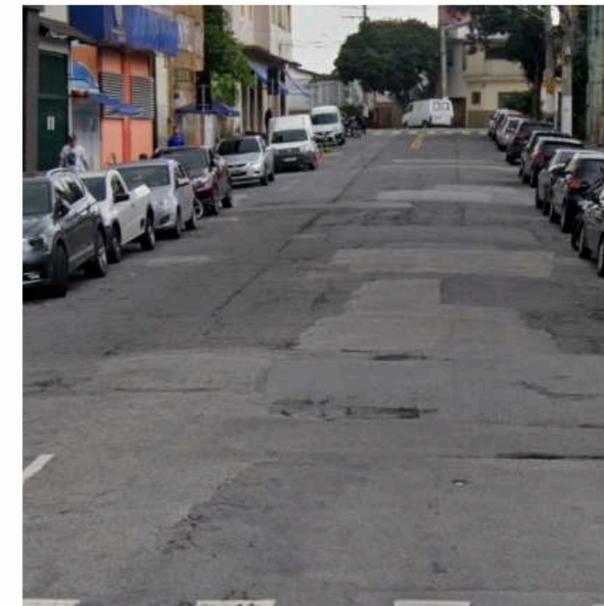


Foto antes



Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua Décio Ábramo	
Valor Liquidado	R\$529.108,40
Situação	Concluída

Rua dos Campineiros	
Valor Liquidado	R\$1.666.570,95
Situação	Concluída



Foto antes

Foto depois

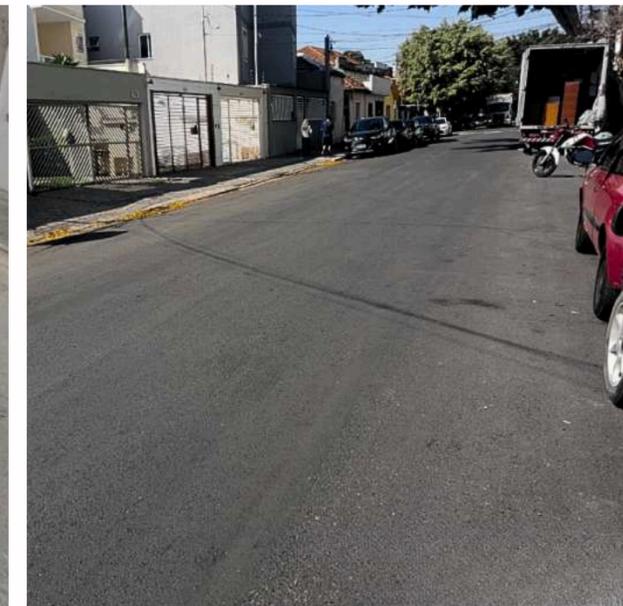


Foto antes

Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE]

Rua França de Carvalho	
Valor Liquidado	R\$678.734,80
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois

Rua Marina Crespi	
Valor Liquidado	R\$574.945,80
Situação	Concluída

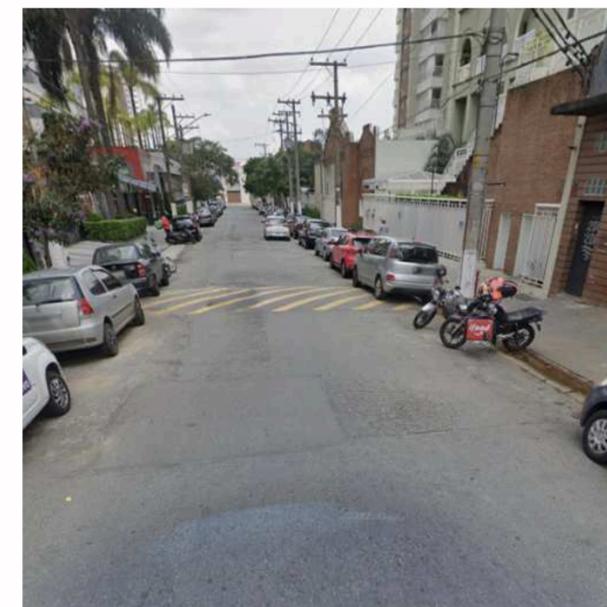


Foto antes

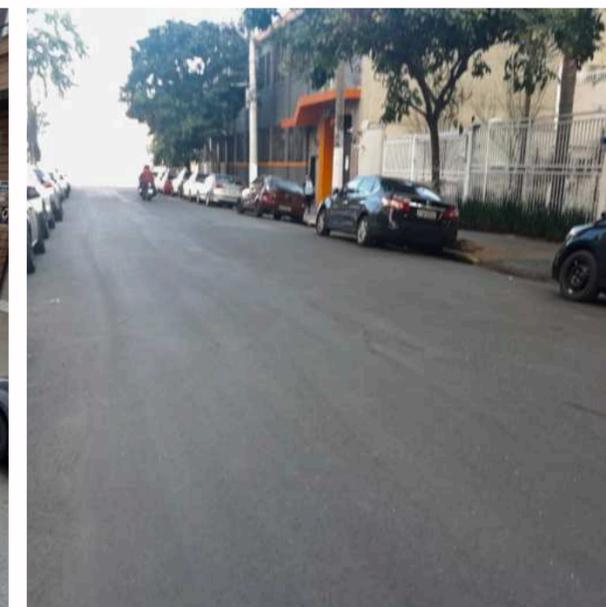


Foto depois

**PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE)[LIVRE][BP]:
META 34 DO PDM 2021/2024**

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Cidade Ademar
Endereço	Estr. Água Santa (entre Estr. do Alvarenga e Estr. da Encosta)
Nº do Termo de Contrato	890/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026319-9
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	09/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 6.245.341,84
Valor Aprovado	R\$ 5.620.383,32
Valor Empenhado	R\$ 4.465.701,37
Valor Liquidado	R\$ 4.465.701,37



Foto antes:

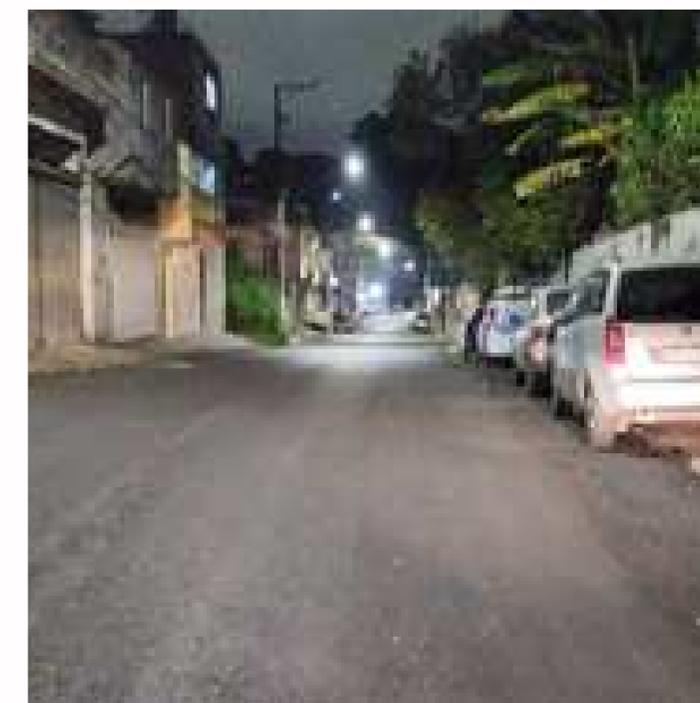


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Cidade Ademar
Endereço	R. Domênico Palma (entre Av. Celso dos Santos e Av. Cupecê)
Nº do Termo de Contrato	764/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0021669-7
Data da OIS	24/10/2023
Data de término	14/06/2024 (com aditamento)
% de Execução	Obra concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 3.239.268,15
Valor Aprovado	R\$ 1.849.679,52
Valor Empenhado	R\$ 57.518,09
Valor Liquidado	R\$ 57.518,09



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Cidade Ademar
Endereço	R. Alcides Arguedas (entre Av. Ângelo Cristianini e R. Capitão John Cordeiro e Silva)
Nº do Termo de Contrato	1102/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026323-7
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	15/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 1.477.969,93
Valor Aprovado	R\$ 1.240.665,73
Valor Empenhado	R\$ 1.124.523,00
Valor Liquidado	R\$ 1.124.523,00



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Campo Limpo
Endereço	Estr. do Campo Limpo – Tr. III (entre Av. Carlos Lacerda e Passagem sobre Córrego Pirajussara (divisa com Mun. de Taboão da Serra))
Nº do Termo de Contrato	894/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026218-4
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	09/04/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 24.981.532,34
Valor Aprovado	R\$ 16.943.823,12
Valor Empenhado	R\$ 12.842.787,11
Valor Liquidado	R\$ 12.842.787,11



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Campo Limpo
Endereço	R. Dr. Chibata Miyakoshi (entre R. Dr. José Gustavo Bush e R. Dr. Mário Vatanabe)
Nº do Termo de Contrato	1035/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026219-2
Data da OIS	19/12/2023
Data de término	08/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU
Valor do Contrato	R\$ 1.559.281,23
Valor Aprovado	R\$ 1.532.280,23
Valor Empenhado	R\$ 776.109,40
Valor Liquidado	R\$ 776.109,40



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Campo Limpo
Endereço	Av. Dn. Maria Mesquita de Mota e Silva (R. Paulo II e R. Prof. Benedito Montenegro)
Nº do Termo de Contrato	1032/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026225-7
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	07/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU
Valor do Contrato	R\$ 994.625,84
Valor Aprovado	R\$ 970.037,43
Valor Empenhado	R\$ 829.058,43
Valor Liquidado	R\$ 829.058,43



Foto antes:

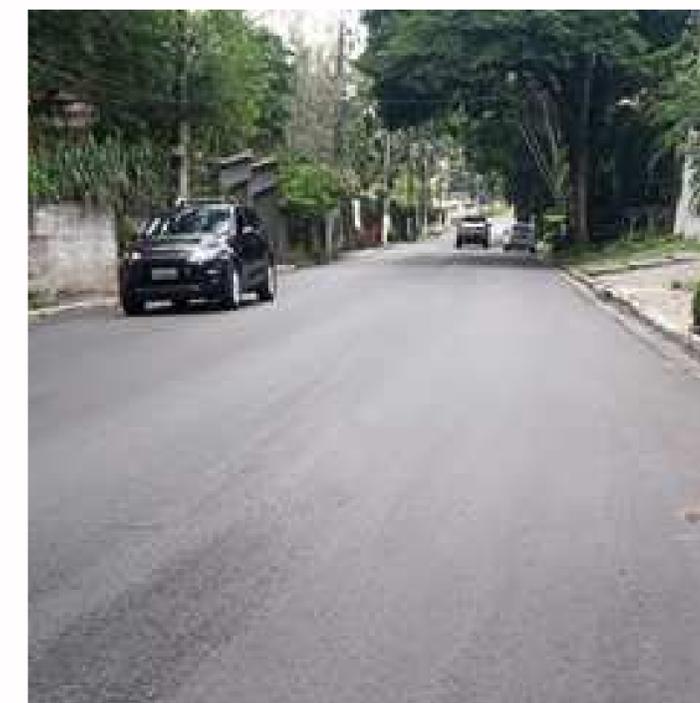


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Campo Limpo
Endereço	R. Dr. Mário Vatanabe (R. Dr. Chibata Miyakoshi e R. Dep. Laércio Corte)
Nº do Termo de Contrato	1034/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026221-4
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	04/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 609.228,18
Valor Aprovado	R\$ 591.084,57
Valor Empenhado	R\$ 354.083,56
Valor Liquidado	R\$ 354.083,56

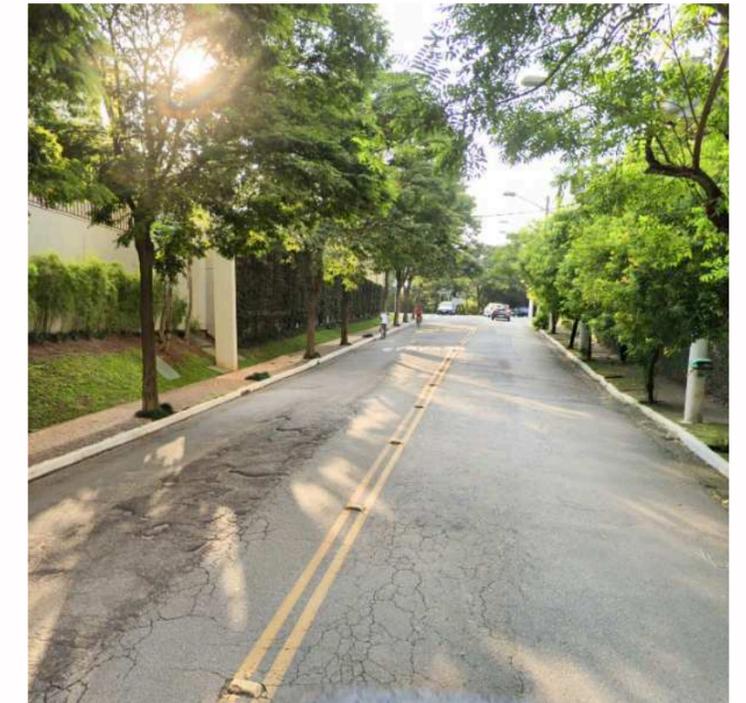


Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Capela do Socorro
Endereço	Estr. Canal de Cocaia (entre Av. Dn. Belmira Marin e Av. Gaivotas)
Nº do Termo de Contrato	888/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026315-6
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	29/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 11.649.939,80
Valor Aprovado	R\$ 10.969.507,38
Valor Empenhado	R\$ 8.878.844,58
Valor Liquidado	R\$ 8.878.844,58



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Capela do Socorro
Endereço	Av. Carlos Barbosa Santos (entre Av. Dn. Belmira Marin e Av. Paulo Guilguer Reimberg)
Nº do Termo de Contrato	933/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026305-9
Data da OIS	13/12/2023
Data de término	30/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA
Valor do Contrato	R\$ 15.739.679,87
Valor Aprovado	R\$ 10.472.131,76
Valor Empenhado	R\$ 4.989.623,52
Valor Liquidado	R\$ 4.989.623,52



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Capela do Socorro
Endereço	Av. Pref. Paulo Lauro (entre R. Giovanni Bononcini e Av. Antônio Carlos Benjamin dos Santos)
Nº do Termo de Contrato	904/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026302-4
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	08/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 8.334.756,71
Valor Aprovado	R\$ 7.691.651,46
Valor Empenhado	R\$ 6.943.275,67
Valor Liquidado	R\$ 6.943.275,67



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Capela do Socorro
Endereço	Av. Alziro Pinheiro Magalhães (entre R. Major Lúcio Dias Ramos e R. Taboão da Serra)
Nº do Termo de Contrato	881/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026309-1
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	23/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA
Valor do Contrato	R\$ 6.849.089,29
Valor Aprovado	R\$ 6.169.273,89
Valor Empenhado	R\$ 5.509.346,53
Valor Liquidado	R\$ 5.509.346,53



Foto antes:

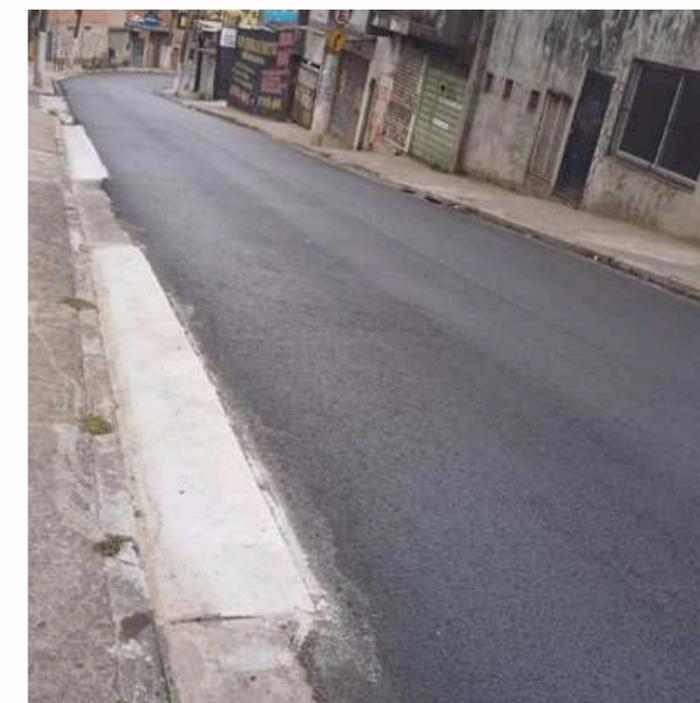


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Capela do Socorro
Endereço	R. Dr. Oscar Andrade Lemos (entre R. Jequirituba e Av. Dn. Belmira Marin)
Nº do Termo de Contrato	887/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026311-3
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	02/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 5.446.946,78
Valor Aprovado	R\$ 4.881.019,79
Valor Empenhado	R\$ 3.088.932,74
Valor Liquidado	R\$ 3.088.932,74

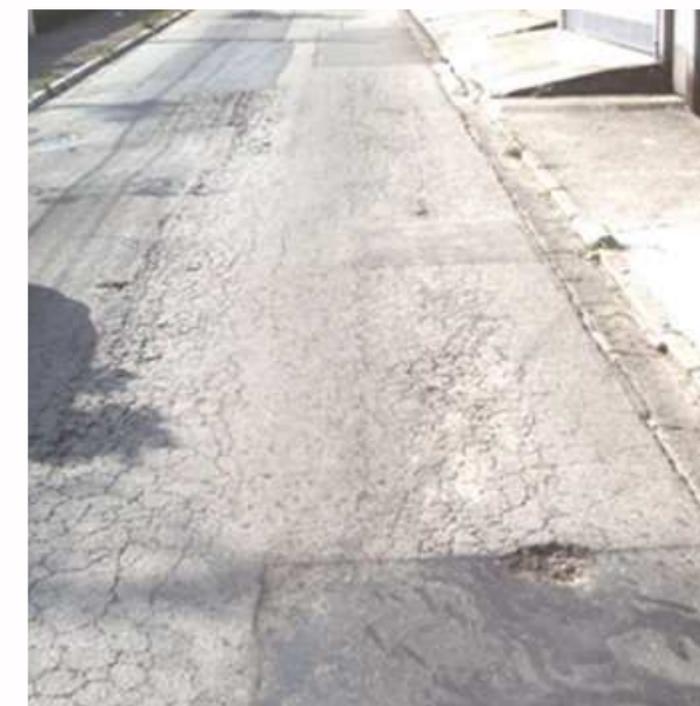


Foto antes:

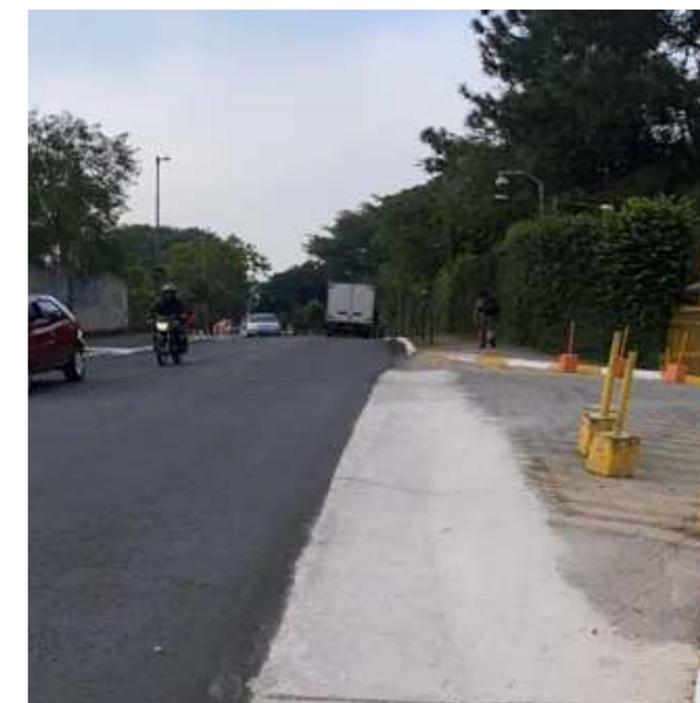


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Capela do Socorro
Endereço	R. Cel. João Cabanas (entre R. Alziro Pinheiro Magalhães e R. Major Lúcio Dias Ramos)
Nº do Termo de Contrato	964/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026307-5
Data da OIS	13/12/2023
Data de término	30/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 4.457.428,92
Valor Aprovado	R\$ 3.973.466,15
Valor Empenhado	R\$ 2.808.565,70
Valor Liquidado	R\$ 2.808.565,70



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Cidade Tiradentes
Endereço	R. Igarapé da Bela Aurora (R. Inácio Monteiro Até o fim da via)
Nº do Termo de Contrato	1120/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026911-1
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	21/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 3.772.847,05
Valor Aprovado	R\$ 3.707.414,69
Valor Empenhado	R\$ 3.464.237,08
Valor Liquidado	R\$ 3.464.237,08

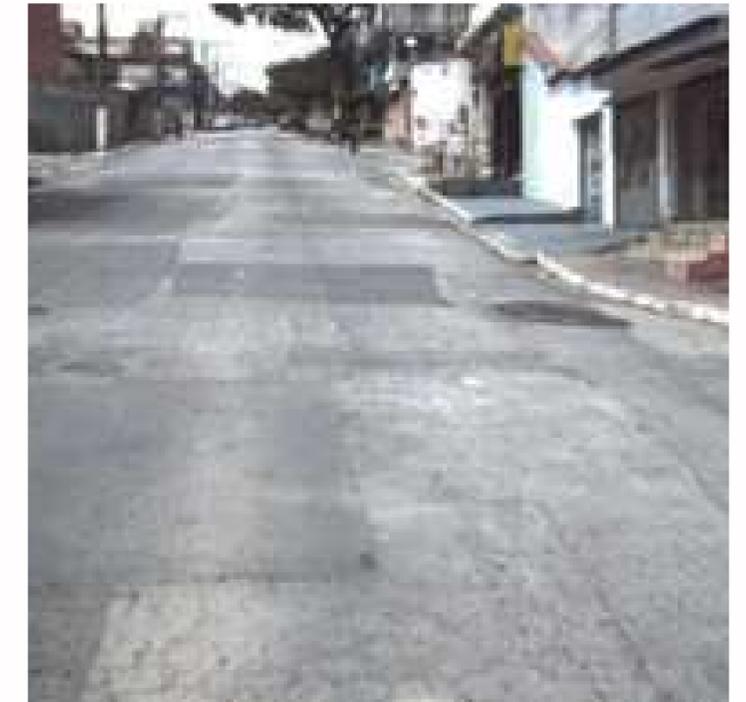


Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Cidade Tiradentes
Endereço	R. Dn. Eloá do Valle Quadros (entre R. Nascer do Sol e Av. dos Metalúrgicos)
Nº do Termo de Contrato	1121/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026915-4
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	10/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 3.270.852,71
Valor Aprovado	R\$ 3.187.143,34
Valor Empenhado	R\$ 3.020.920,22
Valor Liquidado	R\$ 3.020.920,22



Foto antes:

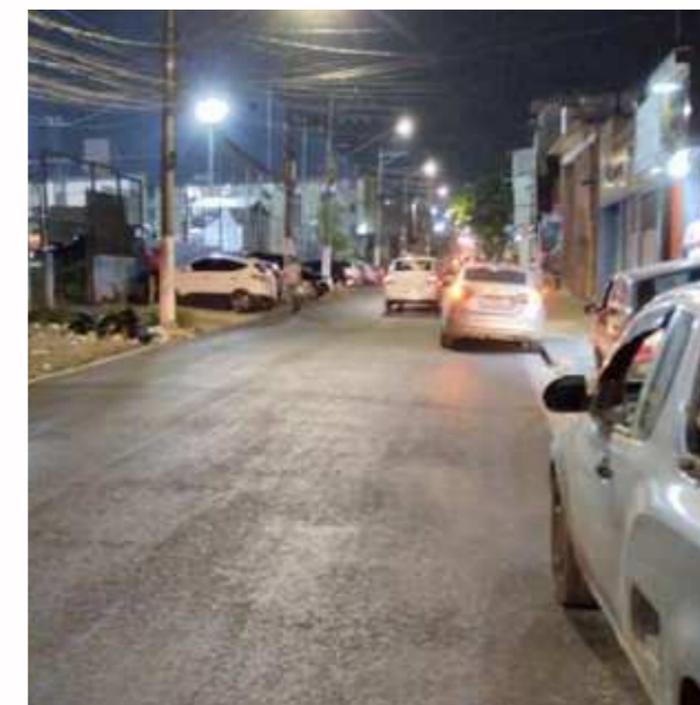


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Casa Verde
Endereço	R. Dário Vilares Barbosa (entre R. Morro do Valongo e R. Gervásio Leite Rebelo)
Nº do Termo de Contrato	901/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0019405-7
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	10/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 4.496.130,80
Valor Aprovado	R\$ 4.301.135,41
Valor Empenhado	R\$ 4.081.708,32
Valor Liquidado	R\$ 4.081.708,32



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Casa Verde
Endereço	R. Ministro Lins de Barros (entre Av. Masao Watanabe e R. Taquaraçu de Minas)
Nº do Termo de Contrato	1069/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026835-2
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	20/04/2024
% de Execução	Concluído
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 3.679.384,86
Valor Aprovado	R\$ 3.600.389,09
Valor Empenhado	R\$ 3.220.192,88
Valor Liquidado	R\$ 3.220.192,88



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Casa Verde
Endereço	Av. Dep. Emílio Carlos – Tr. II (entre Av. Imirim e R. Edson Andrade Silva)
Nº do Termo de Contrato	1070/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026838-7
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	21/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 1.776.326,58
Valor Aprovado	R\$ 1.702.283,00
Valor Empenhado	R\$ 1.457.620,59
Valor Liquidado	R\$ 1.457.620,59



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Casa Verde
Endereço	Av. Mariana Caligiori Ronchetti - Ambos os sentidos (entre Av. Maria Antônia Martins e R. Alto Sucuriú)
Nº do Termo de Contrato	903/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0019411-1
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	09/04/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 5.649.194,68
Valor Aprovado	R\$ 896.970,53
Valor Empenhado	R\$ 342.157,42
Valor Liquidado	R\$ 342.157,42

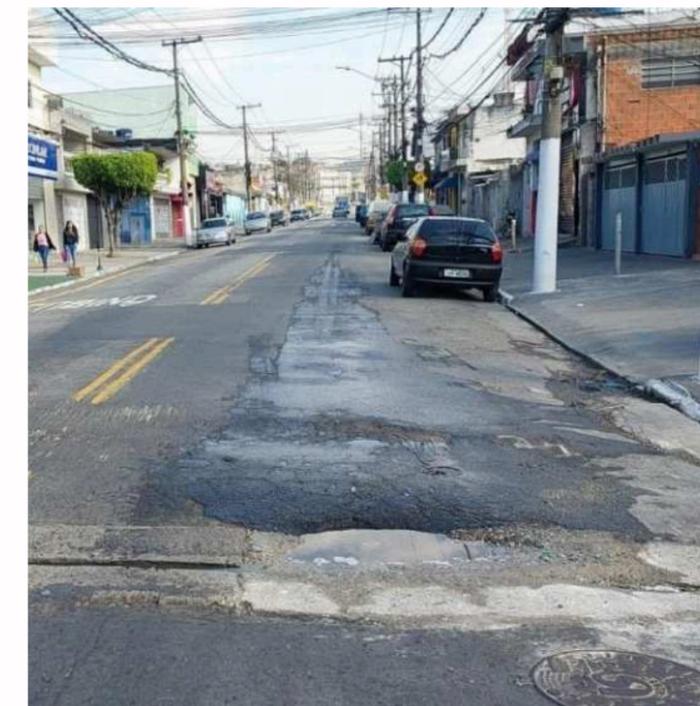


Foto antes:

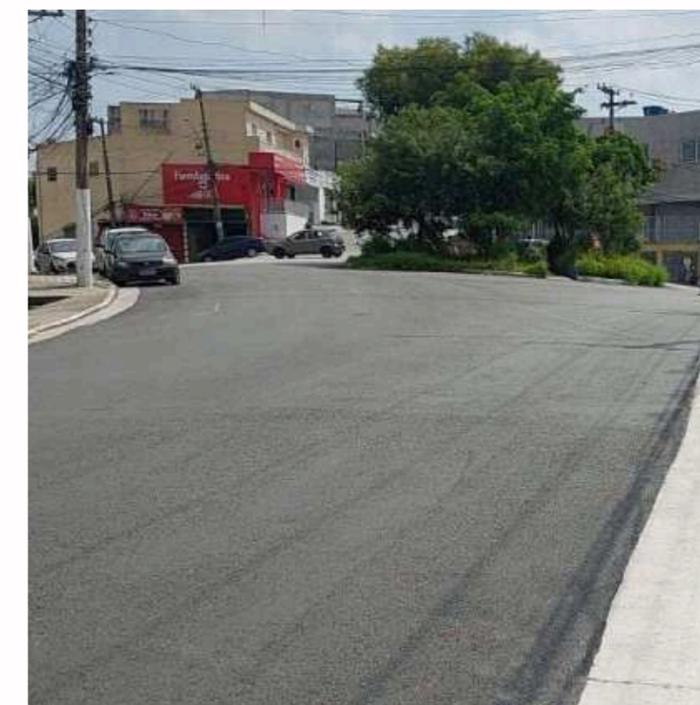


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Freguesia do ó-Brasilândia
Endereço	Av. Dep. Cantídio Sampaio (entre Av. Inajar de Souza e R. Talha-mar)
Nº do Termo de Contrato	898/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0019374-3
Data da OIS	13/12/2023
Data de término	02/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 17.431.147,12
Valor Aprovado	R\$ 15.622.381,13
Valor Empenhado	R\$ 13.054.403,60
Valor Liquidado	R\$ 13.054.403,60

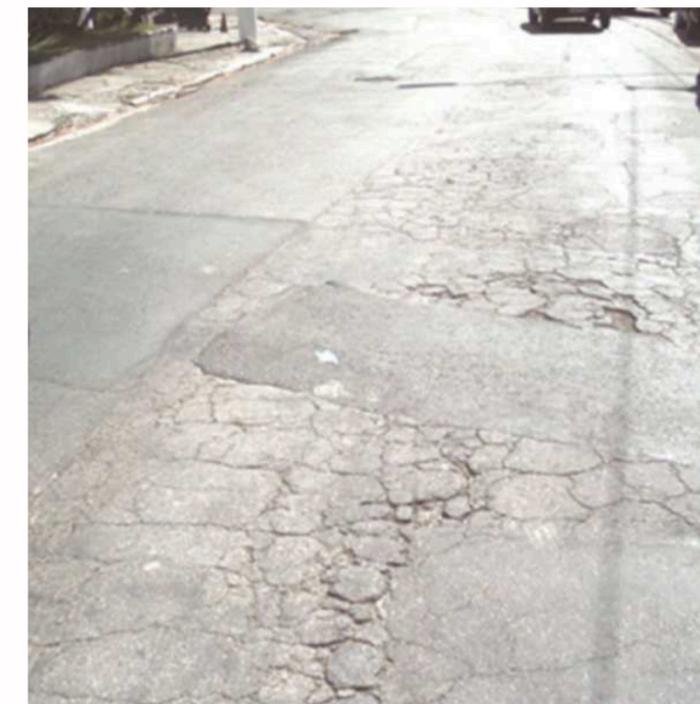


Foto antes:

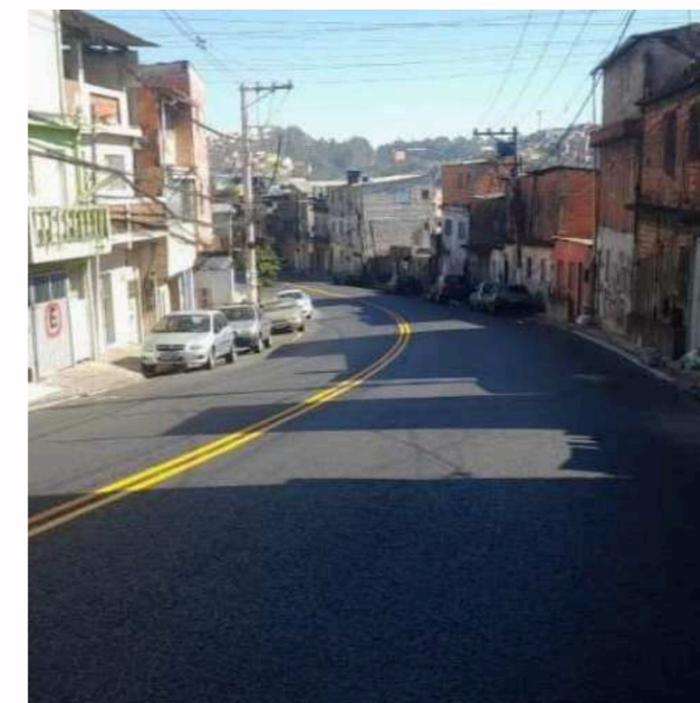


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Freguesia do ó-Brasilândia
Endereço	R. Nícia Coutinho Patricio (Av. Guilherme de Almeida e R. Pe. Manoel Honorato)
Nº do Termo de Contrato	936/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026084-0
Data da OIS	12/12/2023
Data de término	10/04/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 3.026.924,93
Valor Aprovado	R\$ 2.906.419,54
Valor Empenhado	R\$ 2.726.941,13
Valor Liquidado	R\$ 2.726.941,13



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Freguesia do ó-Brasilândia
Endereço	R. Domingos Veja (entre R. Manuel Algante e Av. Almyr Dehar)
Nº do Termo de Contrato	939/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026090-4
Data da OIS	12/12/2023
Data de término	10/04/2023 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 2.992.470,61
Valor Aprovado	R\$ 2.881.959,37
Valor Empenhado	R\$ 2.628.549,78
Valor Liquidado	R\$ 2.628.549,78



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Freguesia do ó-Brasilândia
Endereço	Estr. Lázaro Amâncio de Barros (entre R. Parapuã e R. Joviniano de Oliveira)
Nº do Termo de Contrato	925/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026192-7
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	09/04/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU/MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 3.881.549,65
Valor Aprovado	R\$ 1.507.387,04
Valor Empenhado	R\$ 851.591,37
Valor Liquidado	R\$ 851.591,37

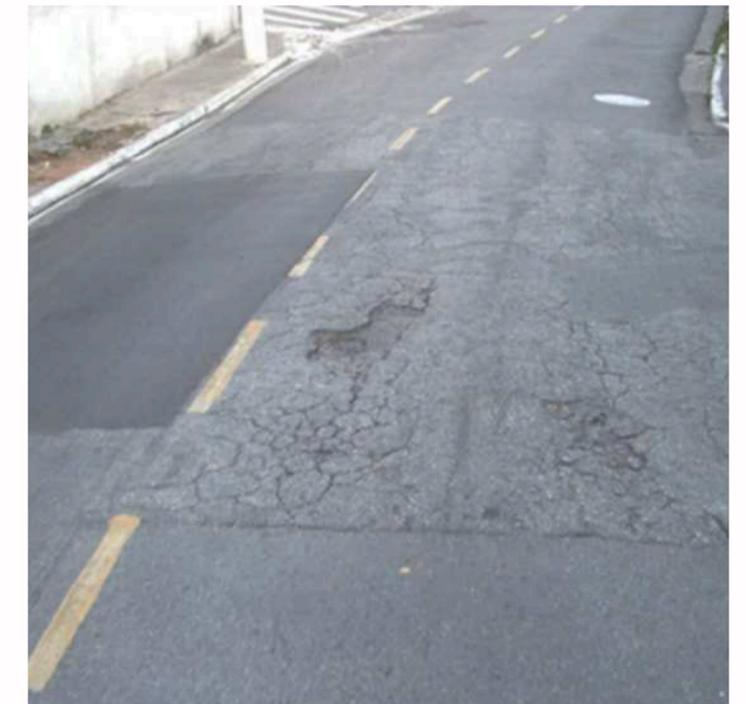


Foto antes:

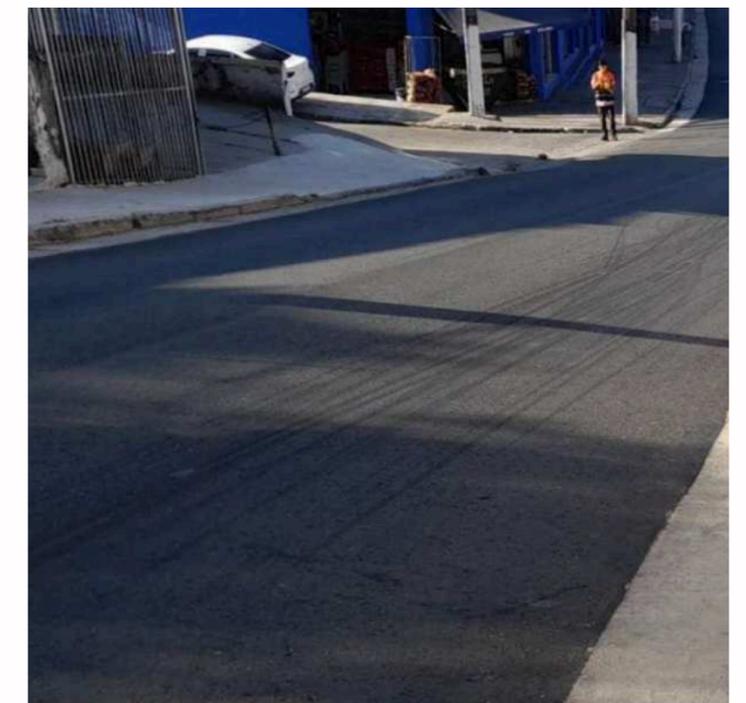


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Guaianases
Endereço	Av. Miguel Achiole da Fonseca (entre R. Otelo Augusto Ribeiro e Av. José Higino Neves)
Nº do Termo de Contrato	1117/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0027051-9
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	20/04/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU
Valor do Contrato	R\$ 7.475.493,14
Valor Aprovado	R\$ 7.348.691,63
Valor Empenhado	R\$ 6.696.858,76
Valor Liquidado	R\$ 6.696.858,76



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Guaianases
Endereço	Estr. de Poá (entre Passagem sobre Córrego Mirim (Divisa com Mun. de Ferraz de Vasconcelos) e R. Otelo Augusto Ribeiro)
Nº do Termo de Contrato	812/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0025022-4
Data da OIS	21/11/2023
Data de término	22/06/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 5.399.300,60
Valor Aprovado	R\$ 3.668.989,45
Valor Empenhado	R\$ 3.303.616,03
Valor Liquidado	R\$ 3.303.616,03

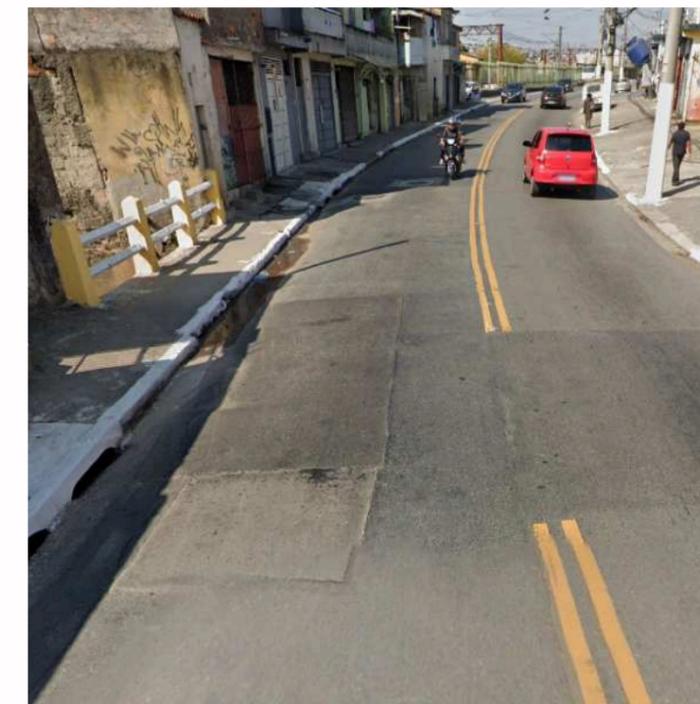


Foto antes:

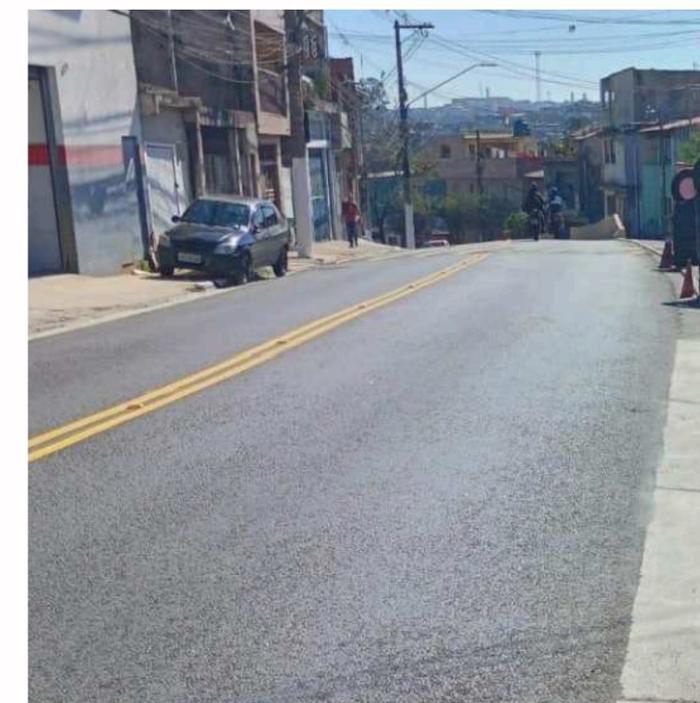


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaquera
Endereço	R. Cachoeira da Ilha (entre R. Rio do Veríssimo e R. Santa Marcelina)
Nº do Termo de Contrato	1052/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026947-2
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	24/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 1.437.890,37
Valor Aprovado	R\$ 1.192.046,17
Valor Empenhado	R\$ 1.143.547,14
Valor Liquidado	R\$ 1.143.547,14



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaquera
Endereço	R. Senembi (entre R. Elza dos Anjos Neves e R. Bom Jesus do Monte)
Nº do Termo de Contrato	1049/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026993-6
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	24/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 1.221.907,32
Valor Aprovado	R\$ 993.216,86
Valor Empenhado	R\$ 942.532,04
Valor Liquidado	R\$ 942.532,04



Foto antes:

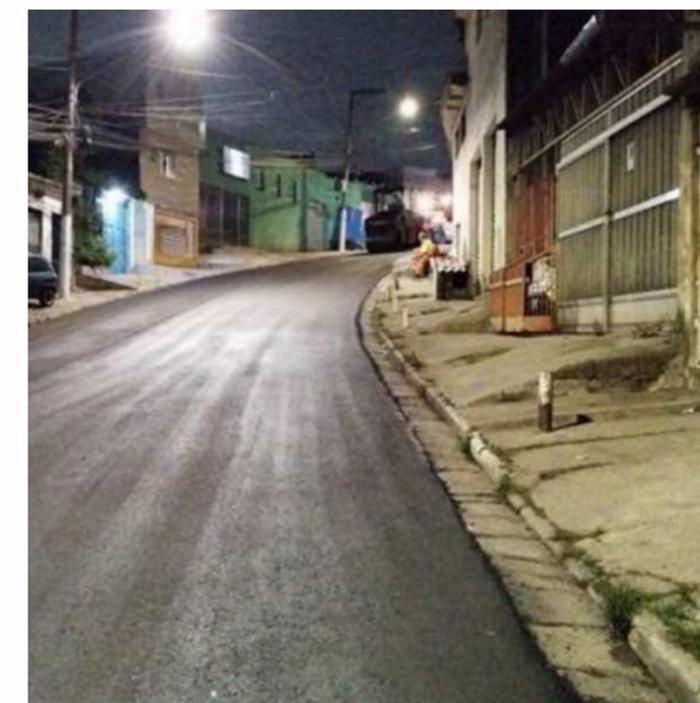


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaquera
Endereço	R. Bom Jesus do Monte (entre Início da via e R. Alfredo Pimenta)
Nº do Termo de Contrato	1053/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026946-4
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	04/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 4.232.628,78
Valor Aprovado	R\$ 366.396,90
Valor Empenhado	R\$ 255.257,60
Valor Liquidado	R\$ 255.257,60

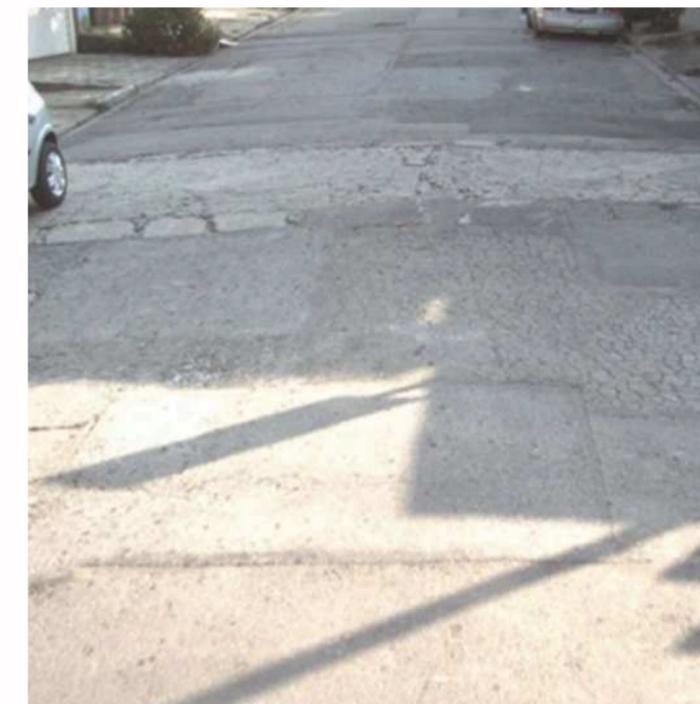


Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaim Paulista
Endereço	R. Itajuíbe (entre Av. Mal. Tito e R. Manuel Rodrigues Santiago)
Nº do Termo de Contrato	945/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0018207-5
Data da OIS	13/12/2023
Data de término	30/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 11.319.692,47
Valor Aprovado	R\$ 6.560.198,79
Valor Empenhado	R\$ 5.547.710,44
Valor Liquidado	R\$ 5.547.710,44



Foto antes:

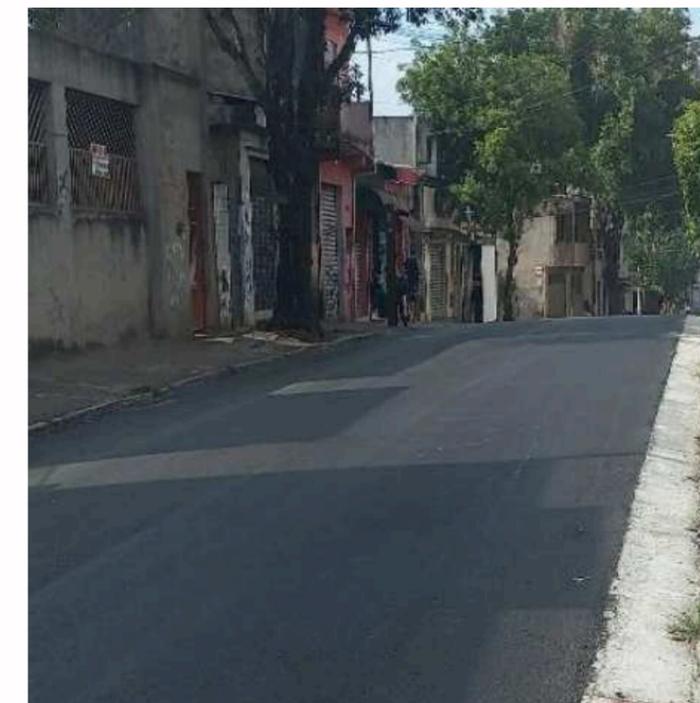


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaim Paulista
Endereço	R. Manuel Rodrigues Santiago (entre R. Itajuíbe e R. Tibúrcio de Sousa)
Nº do Termo de Contrato	944/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0018205-9
Data da OIS	13/12/2023
Data de término	04/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 3.636.386,50
Valor Aprovado	R\$ 3.194.962,08
Valor Empenhado	R\$ 2.786.543,63
Valor Liquidado	R\$ 2.786.543,63



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaim Paulista
Endereço	R. Estudantes da China (entre R. Pe. Francisco Veloso e Av. Rio Mirivaí)
Nº do Termo de Contrato	1058/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026941-3
Data da OIS	15/12/2023
Data de término	24/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 2.679.994,39
Valor Aprovado	R\$ 2.277.412,07
Valor Empenhado	R\$ 1.462.738,35
Valor Liquidado	R\$ 1.462.738,35

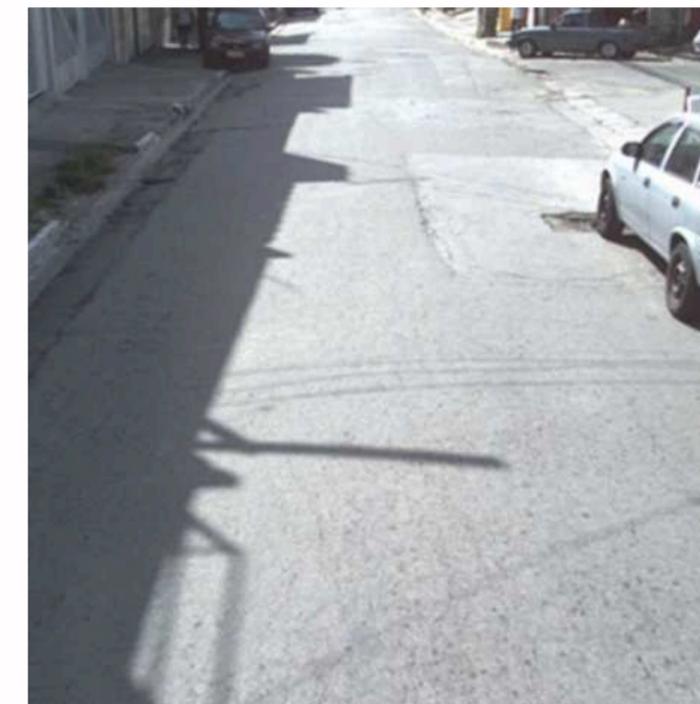


Foto antes:

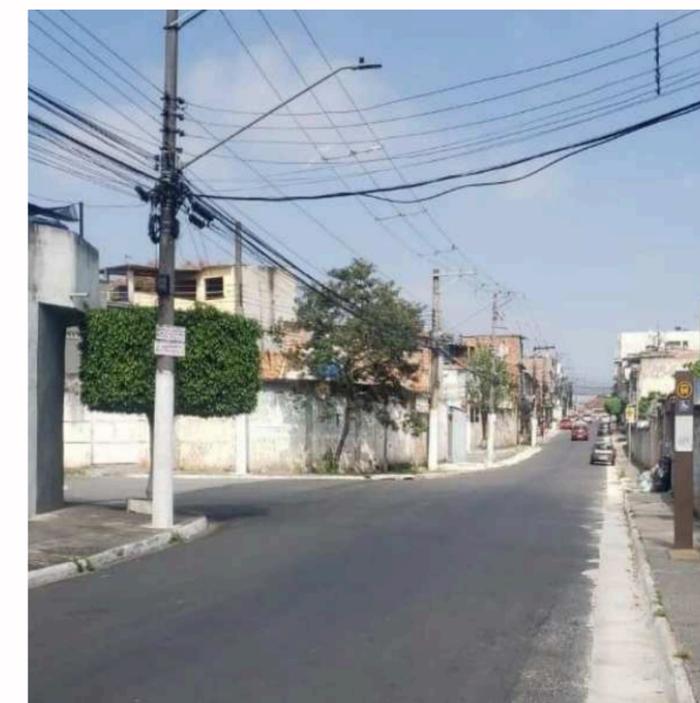


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaim Paulista
Endereço	Av. Rio Mirivaí (entre R. Estudantes da China e Pç. Damasco Coelho de Pinho)
Nº do Termo de Contrato	1013/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0018214-8
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	24/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 2.347.469,89
Valor Aprovado	R\$ 2.038.977,27
Valor Empenhado	R\$ 1.859.108,82
Valor Liquidado	R\$ 1.859.108,82



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaim Paulista
Endereço	Av. dos Guachos (entre R. Guirapa e Pç. Francisco Pereira)
Nº do Termo de Contrato	1011/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026280-0
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	24/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 1.598.617,95
Valor Aprovado	R\$ 1.343.973,26
Valor Empenhado	R\$ 1.225.759,47
Valor Liquidado	R\$ 1.225.759,47



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaim Paulista
Endereço	R. Paulo Tapajós (entre R. Ary Cordovil e R. Pe. Francisco Veloso)
Nº do Termo de Contrato	1014/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0018210-5
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	08/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 4.735.426,62
Valor Aprovado	R\$ 1.333.701,15
Valor Empenhado	R\$ 229.345,59
Valor Liquidado	R\$ 229.345,59



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaim Paulista
Endereço	R. Areado (entre R. Alpercata e R. José Pessota)
Nº do Termo de Contrato	986/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026284-2
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	24/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 1.307.748,07
Valor Aprovado	R\$ 1.071.392,76
Valor Empenhado	R\$ 1.014.421,30
Valor Liquidado	R\$ 1.014.421,30



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaim Paulista
Endereço	R. Ponta da Pinheira (entre R. Lagoa Cajubá e R. Jeceaba)
Nº do Termo de Contrato	982/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026282-6
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	23/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 980.444,41
Valor Aprovado	R\$ 761.830,00
Valor Empenhado	R\$ 739.292,34
Valor Liquidado	R\$ 739.292,34



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaim Paulista
Endereço	R. Alpercata (entre R. Areado e R. José Maria Alves de Deus)
Nº do Termo de Contrato	984/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026283-4
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	24/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 766.962,45
Valor Aprovado	R\$ 573.891,18
Valor Empenhado	R\$ 411.791,98
Valor Liquidado	R\$ 411.791,98



Foto antes:

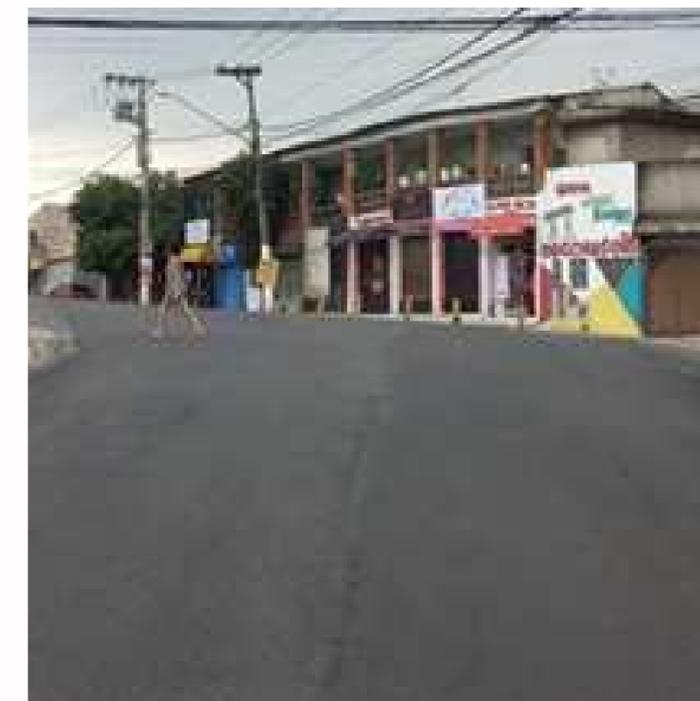


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Itaim Paulista
Endereço	Av. Dr. Almiro Leal da Costa (entre R. Manuel Lemes da Silva e Pç. Damasco Coelho de Pinho)
Nº do Termo de Contrato	1012/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0018211-3
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	21/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU
Valor do Contrato	R\$ 1.930.054,72
Valor Aprovado	R\$ 162.035,28
Valor Empenhado	R\$ 126.128,17
Valor Liquidado	R\$ 126.128,17



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Jaçanã-Tremembé
Endereço	Av. Antônio Cesar Neto (entre R. Francisca Espósito Tonetti e R. Emília Machado de Figueiredo)
Nº do Termo de Contrato	877/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026308-3
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	10/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU
Valor do Contrato	R\$ 4.882.546,84
Valor Aprovado	R\$ 452.152,23
Valor Empenhado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Penha
Endereço	R. Desemb. Rocha Portela (entre R. Demerval Lessa e R. Peixoto Werneck)
Nº do Termo de Contrato	1021/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026275-3
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	01/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 3.494.497,29
Valor Aprovado	R\$ 3.104.967,96
Valor Empenhado	R\$ 2.993.592,25
Valor Liquidado	R\$ 2.993.592,25

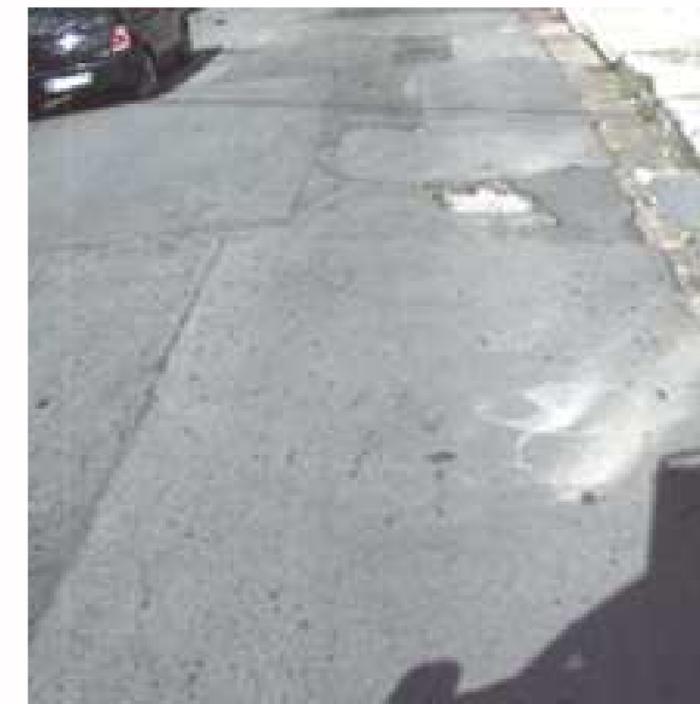


Foto antes:

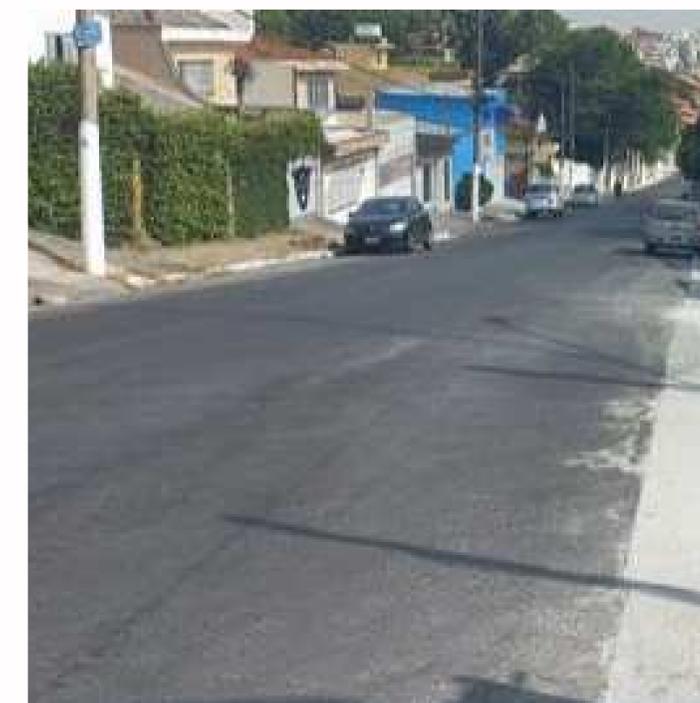


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Penha
Endereço	R. Pe. Gabriel de Campos (entre Av. Waldemar Tietz e Av. Pe. Francisco de Toledo)
Nº do Termo de Contrato	1006/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026939-1
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	24/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU
Valor do Contrato	R\$ 2.945.819,11
Valor Aprovado	R\$ 2.604.954,25
Valor Empenhado	R\$ 1.708.206,53
Valor Liquidado	R\$ 1.708.206,53

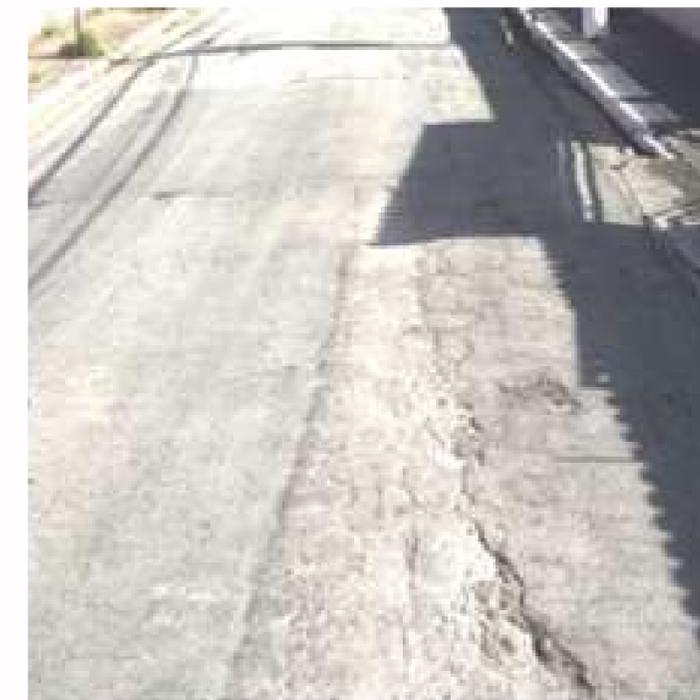


Foto antes:

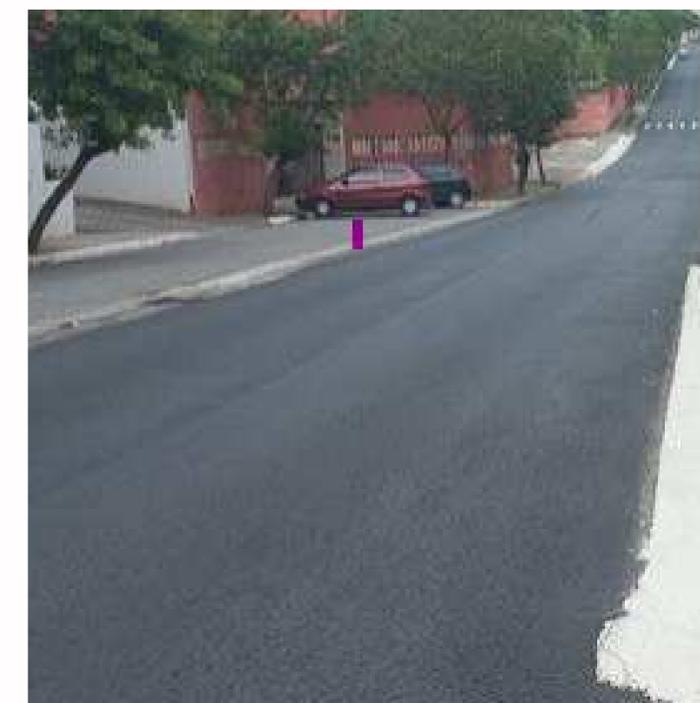


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Perus
Endereço	R. Profa. Maria Aparecida Nigro Gava (entre R. Dep. Cyro de Albuquerque e R. Luís Pereira Rebouças)
Nº do Termo de Contrato	923/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026925-1
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	09/03/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 1.665.804,45
Valor Aprovado	R\$ 1.624.805,69
Valor Empenhado	R\$ 1.484.484,34
Valor Liquidado	R\$ 1.484.484,34



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Sapopemba
Endereço	R. Manoel Quirino de Mattos (entre R. Maria Rosa de Souza e Av. Sapopemba)
Nº do Termo de Contrato	996/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0017725-0
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	11/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 6.523.885,21
Valor Aprovado	R\$ 6.421.456,8
Valor Empenhado	R\$ 5.785.470,58
Valor Liquidado	R\$ 5.785.470,58



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Sapopemba
Endereço	Av. Dr. Frederico Martins da Costa (entre Av. Sapopemba e R. Espinhel)
Nº do Termo de Contrato	989/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0017722-5
Data da OIS	14/12/2023
Data de término	11/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 5.290.615,82
Valor Aprovado	R\$ 5.192.254,75
Valor Empenhado	R\$ 4.443.965,30
Valor Liquidado	R\$ 4.443.965,30



Foto antes:

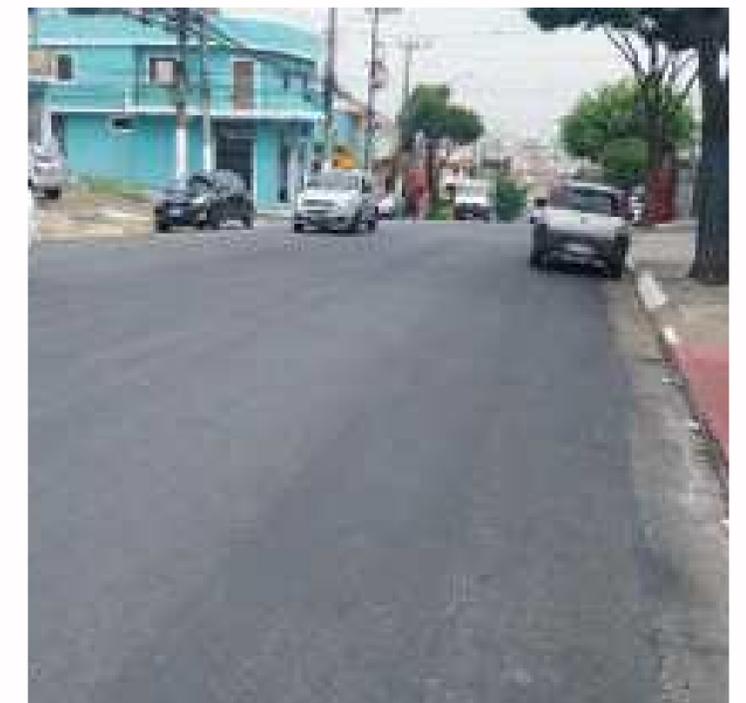


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	São Mateus
Endereço	R. Confederação dos Tamoios (entre R. Dorotéia Eugrassia e Av. Ragueb Chohfi)
Nº do Termo de Contrato	1115/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0019372-7
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	21/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA
Valor do Contrato	R\$ 3.291.965,79
Valor Aprovado	R\$ 1.309.647,34
Valor Empenhado	R\$ 1.035.016,76
Valor Liquidado	R\$ 1.035.016,76



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Pirirtuba-Jaraguá
Endereço	R. Antônio Cardoso Nogueira (entre Estr. Turística do Jaraguá e Av. Chica Luísa)
Nº do Termo de Contrato	1078/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0027064-0
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	21/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA
Valor do Contrato	R\$ 5.155.742,14
Valor Aprovado	R\$ 2.534.561,98
Valor Empenhado	R\$ 2.411.759,52
Valor Liquidado	R\$ 2.411.759,52



Foto antes:

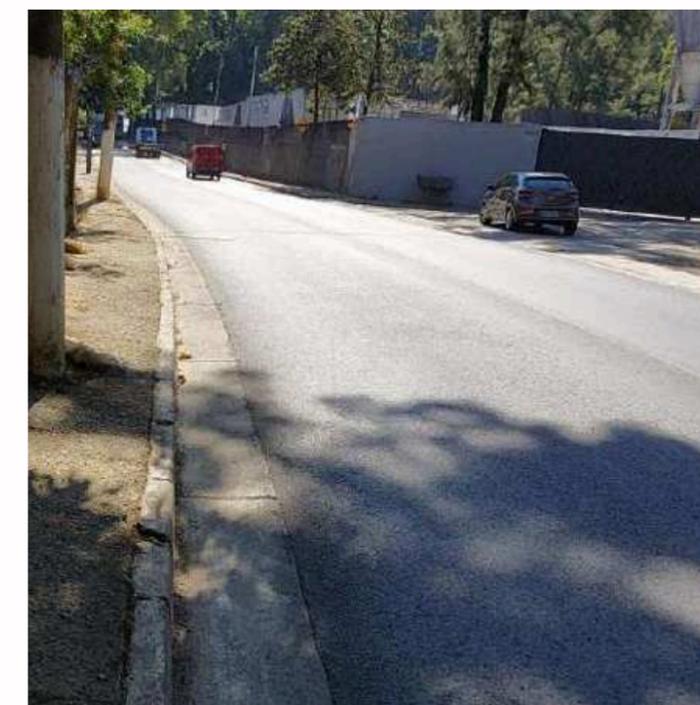


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Pirituba-Jaraguá
Endereço	R. Acaricuara (entre R. Francisco da Cunha Menezes e R. Carixó)
Nº do Termo de Contrato	917/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0019359-0
Data da OIS	11/12/2023
Data de término	05/07/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 2.444.681,24
Valor Aprovado	R\$ 1.199.010,99
Valor Empenhado	R\$ 1.168.775,90
Valor Liquidado	R\$ 1.168.775,90



Foto antes:



Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Cidade Ademar
Endereço	Av. Alda (entre Estr. do Alvarenga e R. Modesto Álvares Dias (Divisa com Mun. de Diadema))
Nº do Termo de Contrato	1103/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026326-1
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	20/04/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 12.927.491,08
Valor Aprovado	R\$ 8.681.240,83
Valor Empenhado	R\$ 72.248,65
Valor Liquidado	R\$ 72.248,65



Foto antes:

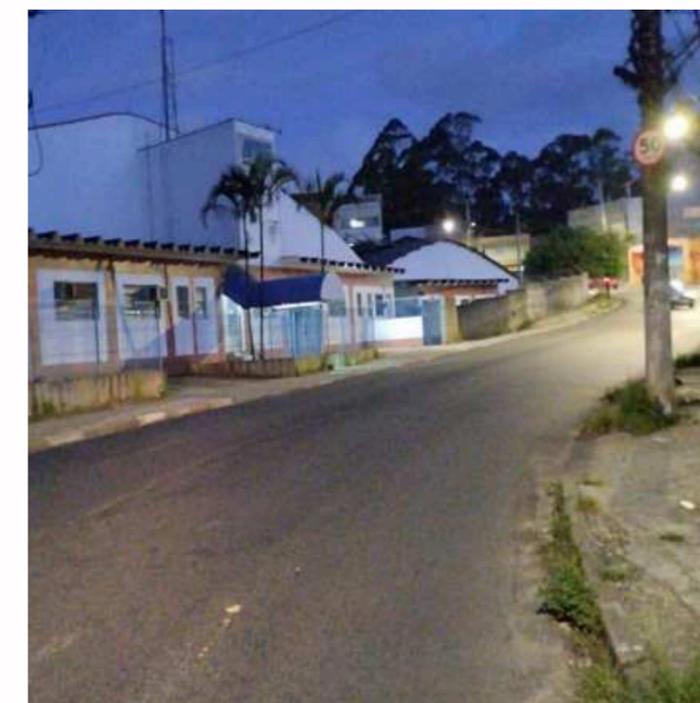


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Freguesia do Ó - Vila Brasilândia
Endereço	Av. Pe. Orlando Garcia da Silveira (Ambos os Sentidos) (entre Av. João Paulo I e Av. Dep. Cantídio Sampaio)
Nº do Termo de Contrato	938/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026087-4
Data da OIS	12/12/2023
Data de término	10/04/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 7.850.042,28
Valor Aprovado	R\$ 2.213.556,50
Valor Empenhado	R\$ 32.620,58
Valor Liquidado	R\$ 32.620,58



Foto antes:

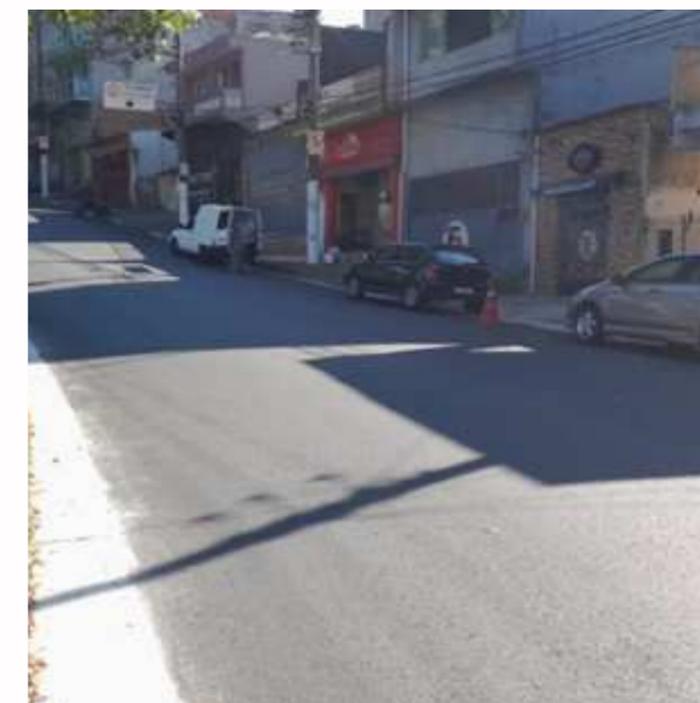


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Guaianases
Endereço	R. Otelo Augusto Ribeiro (entre R. Salvador Gianetti e R. Serra do Caburaí)
Nº do Termo de Contrato	1118/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0026910-3
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	21/03/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVU

Valor do Contrato	R\$ 4.564.973,68
Valor Aprovado	R\$ 4.458.008,97
Valor Empenhado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto antes:

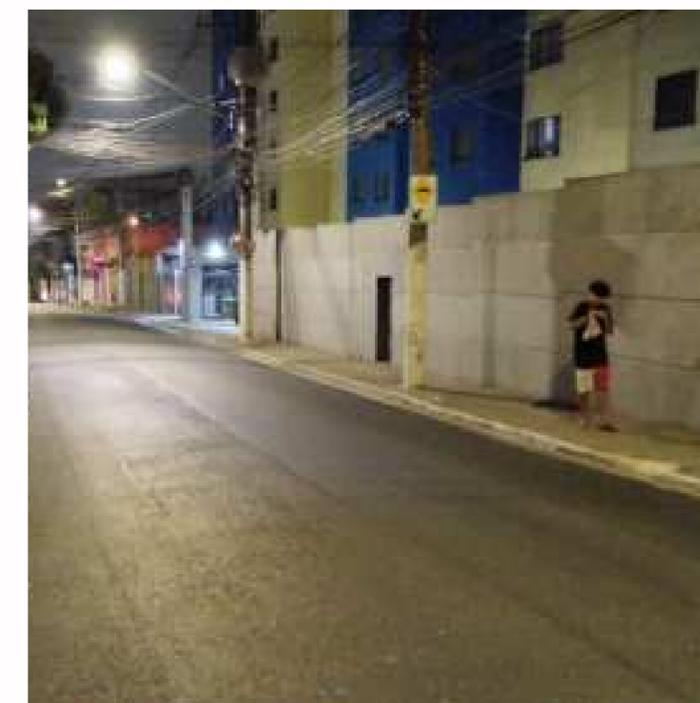


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	São Mateus
Endereço	R. Francisco de Melo Palheta (entre Av. Ragueb Chohfi e R. Morro do Frade)
Nº do Termo de Contrato	1113/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2023/0019371-9
Data da OIS	22/12/2023
Data de término	19/04/2024
% de Execução	Concluída
Macroárea	MRVURA

Valor do Contrato	R\$ 7.013.829,20
Valor Aprovado	R\$ 6.518.973,98
Valor Empenhado	R\$ 974.116,21
Valor Liquidado	R\$ 974.116,21



Foto antes:

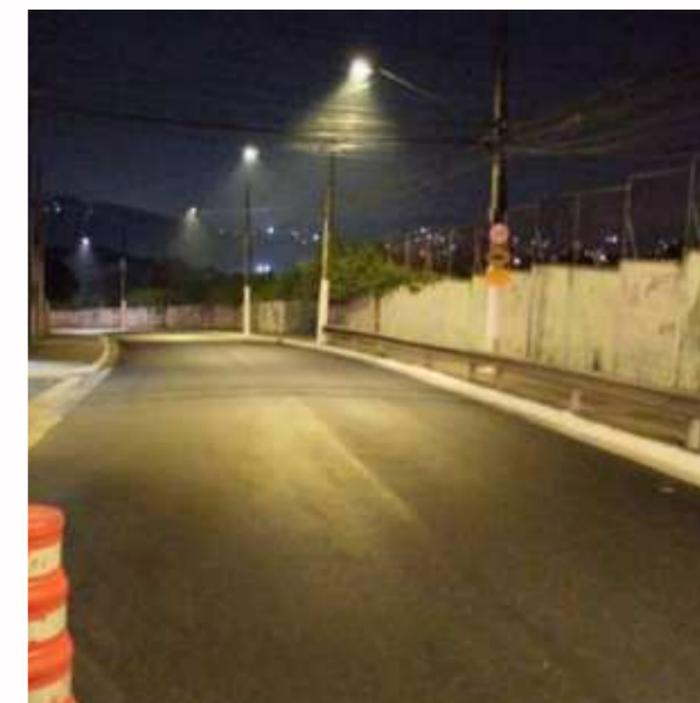


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Objeto	Pavimentação e recapeamento de vias (Recape)[Livre] [BP]
Subprefeitura	Freguesia - Brasilândia/ Capela do Socorro/ M'Boi Mirim/ Aricanduva - Formosa
Endereço	Rua Almotacel/ Rua Silvio Cassiano/ Rua Mariano de Araujo Carvalho/ Rua São João do Pau D'Alho/ Rua Dolcinópolis/ R. Santo Antônio do Jardim/ R. São Sebastião da Grama/ R. Campos Novos Paulista/ R. Santa Clara D'Oeste/ R. Populina/ Rua Pontes Gestal/ Rua Presidente Alves / Rua João Carvalho da Silva/ Rua Taboão da Serra/ Rua Embu/ Rua Itaquaquecetuba/ Rua Viriato Leão de Moura/ Rua Otacílio Ferreira Santos/ Rua Nei José Borges/ Rua Benedito Moreira Santos/ Rua Anderson Oliveira Flora/ Rua Geraldo Rodrigues Santos/ Rua Eurico Branco Ribeiro/ Rua José Geniulli/ Rua Evaristo Luz
Nº do SEI	6012.2024/0005613-6; 6012.2024/0005632-2; 6012.2024/0005634-9; 6012.2024/0005642-0; 6012.2024/0005663-2
Macroárea	MRVURA/MRVU
Valor Aprovado	Genérico
Valor Empenhado	R\$ 23.636.373,80
Valor Liquidado	R\$ 4.419.724,17

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Rua Almotacel	
Valor Liquidado	R\$ 212.931,40
Situação	Concluída

Rua Silvio Cassiano	
Valor Liquidado	R\$ 150.882,22
Situação	Concluída



Foto antes

Foto depois



Foto antes

Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Rua Mariano de Araujo Carvalho	
Valor Liquidado	R\$ 173.107,95
Situação	Concluída

Rua São João do Pau D'Alho	
Valor Liquidado	R\$ 135.961,87
Situação	Concluída



Foto antes

Foto depois

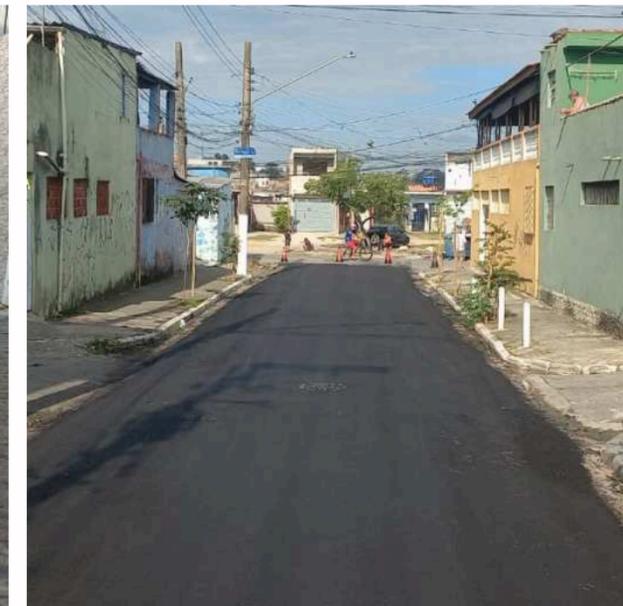


Foto antes

Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Rua Dolcinópolis	
Valor Liquidado	R\$ 73.859,39
Situação	Concluída

R. Santo Antônio do Jardim	
Valor Liquidado	R\$ 427.288,13
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois

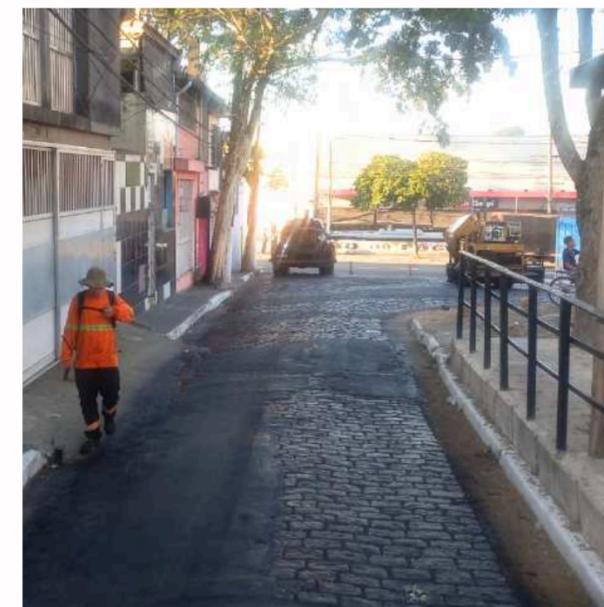


Foto antes



Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

R. São Sebastião da Grama	
Valor Liquidado	R\$ 176.910,56
Situação	Concluída

R. Campos Novos Paulista	
Valor Liquidado	R\$ 122.098,81
Situação	Concluída



Foto antes

Foto depois



Foto antes

Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

R. Santa Clara D'Oeste	
Valor Liquidado	R\$ 104.241,28
Situação	Concluída

R. Populina	
Valor Liquidado	R\$ 104.241,28
Situação	Concluída

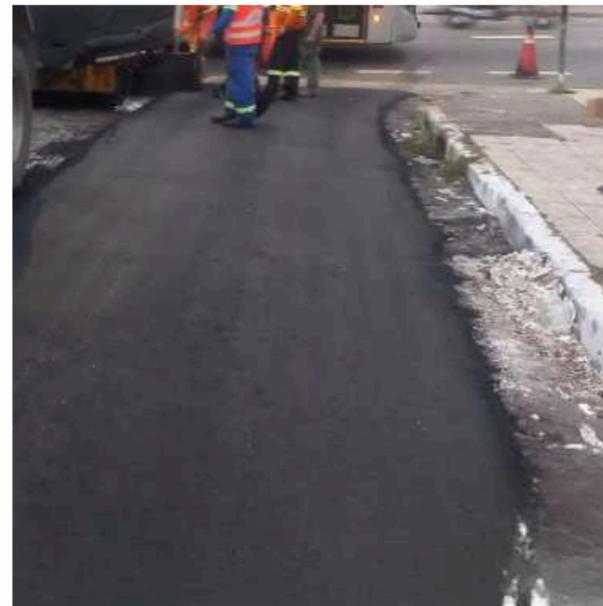


Foto antes:

Foto depois:

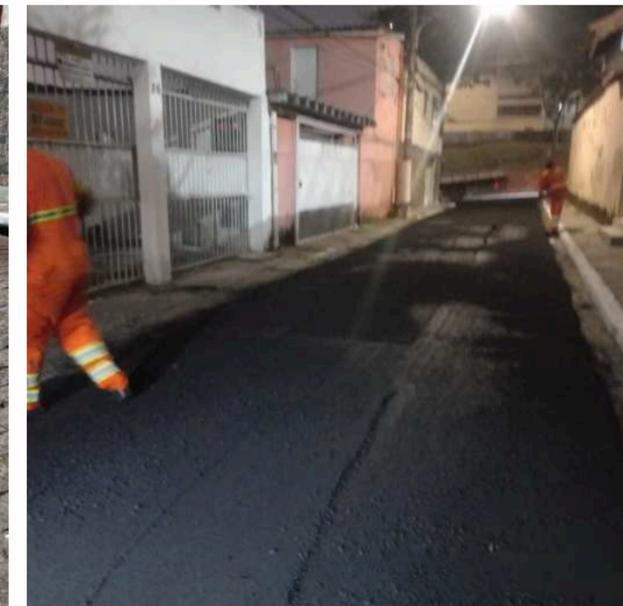
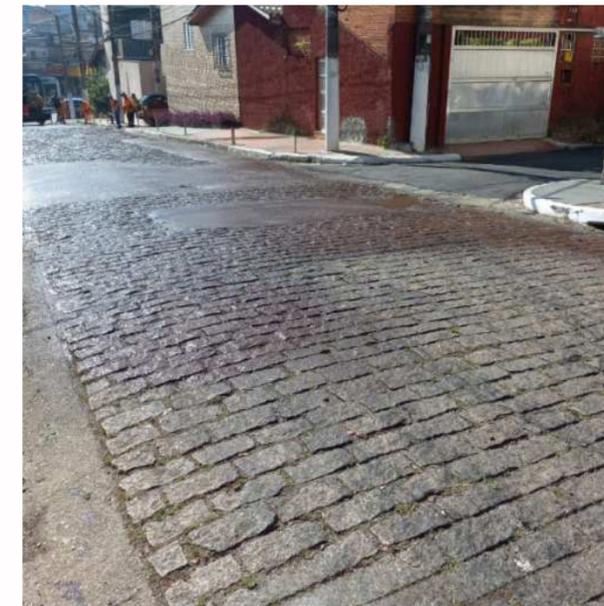


Foto antes:

Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Rua Pontes Gestal	
Valor Liquidado	R\$ 129.830,98
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois

Rua Presidente Alves	
Valor Liquidado	R\$ 174.853,46
Situação	Concluída



Foto antes:

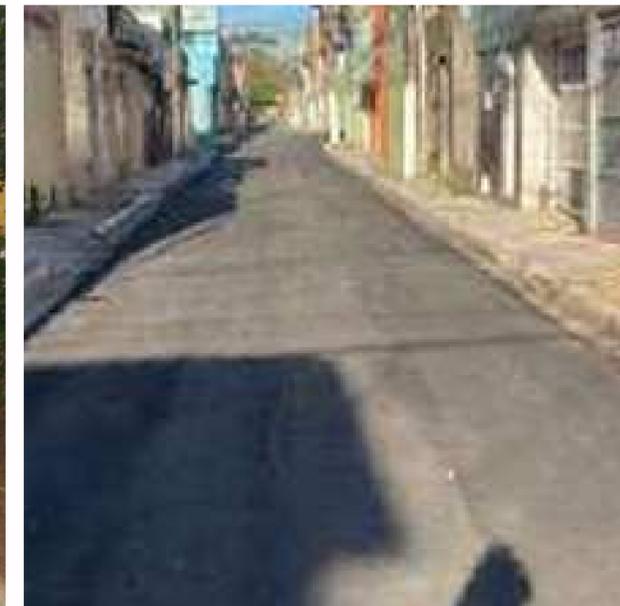


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Rua João Carvalho da Silva	
Valor Liquidado	R\$ 16.403,06
Situação	Concluída

Rua Taboão da Serra	
Valor Liquidado	R\$ 151.285,66
Situação	Concluída



Foto antes



Foto depois



Foto antes

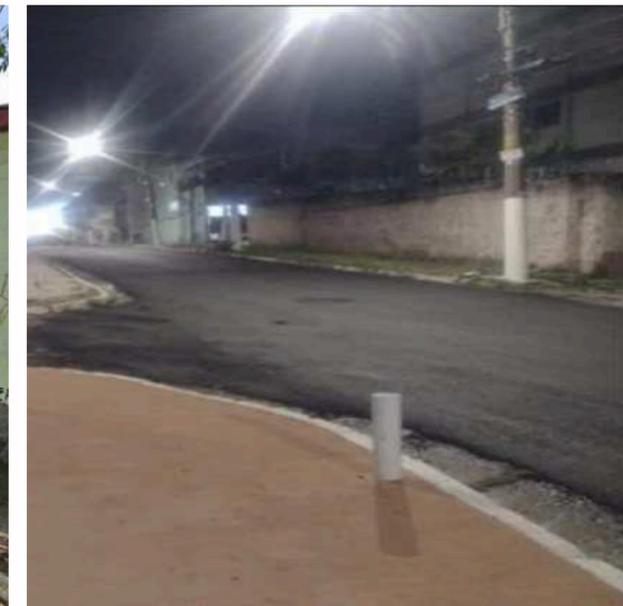


Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Rua Embu	
Valor Liquidado	R\$ 165.882,10
Situação	Concluída

Rua Itaquaquetuba	
Valor Liquidado	R\$ 207.618,92
Situação	Concluída

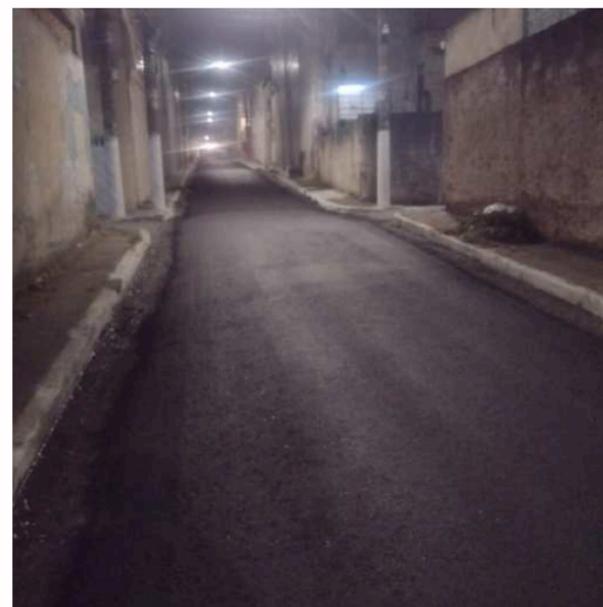


Foto antes

Foto depois



Foto antes

Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Rua Viriato Leão de Moura	
Valor Liquidado	R\$ 416.443,38
Situação	Concluída

Rua Otacílio Ferreira Santos	
Valor Liquidado	R\$ 110.392,88
Situação	Concluída



Foto antes

Foto depois



Foto antes

Foto depois

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Rua Nei José Borges	
Valor Liquidado	R\$ 114.333,65
Situação	Concluída

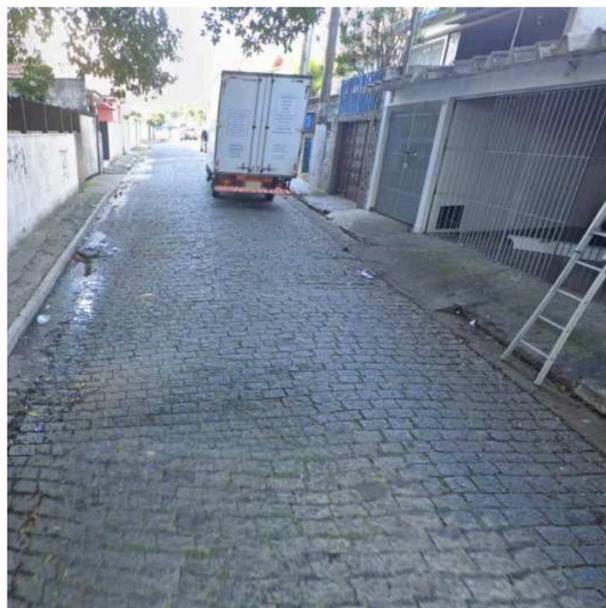


Foto antes:

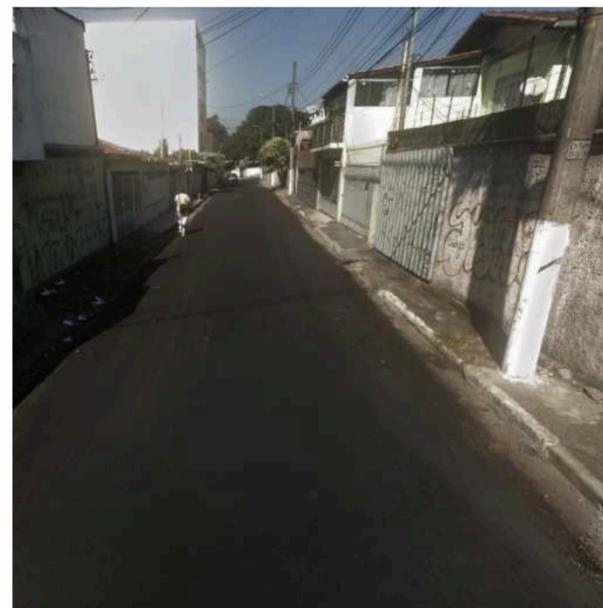


Foto depois:

Rua Benedito Moreira Santos	
Valor Liquidado	R\$ 119.394,85
Situação	Concluída

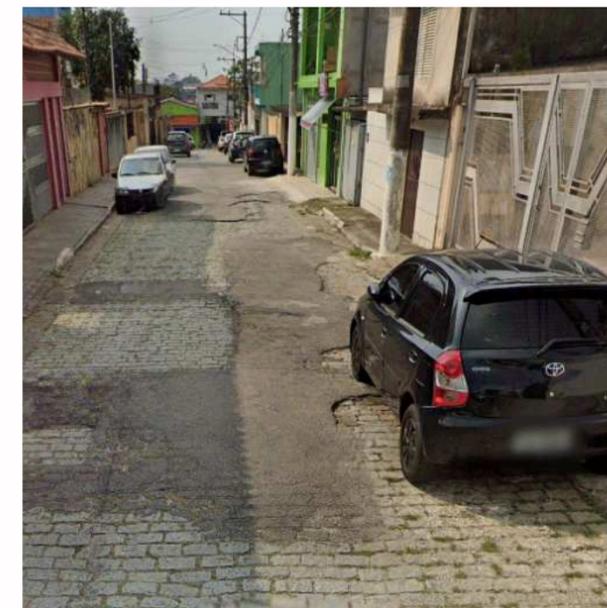


Foto antes:

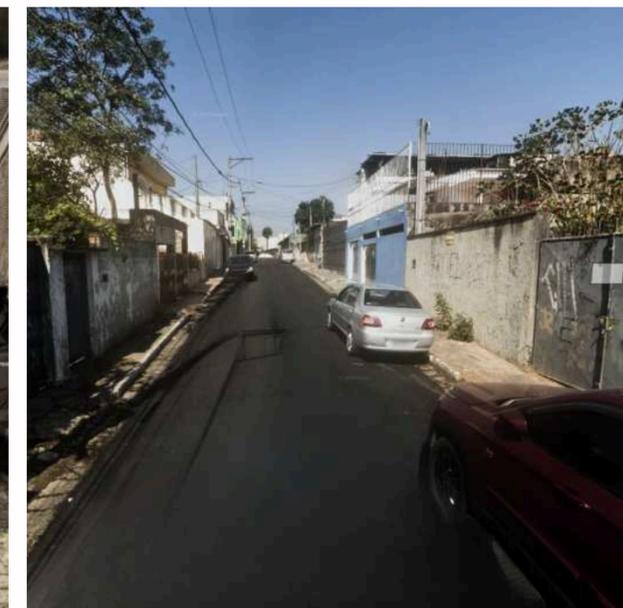


Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Rua Anderson Oliveira Flora	
Valor Liquidado	R\$ 127.657,35
Situação	Concluída

Rua Geraldo Rodrigues Santos	
Valor Liquidado	R\$ 113.226,72
Situação	Concluída

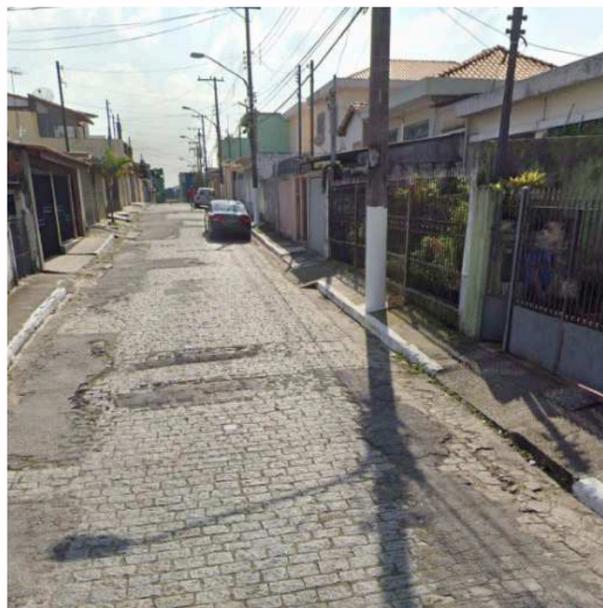


Foto antes:

Foto depois:



Foto antes:

Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Rua Eurico Branco Ribeiro	
Valor Liquidado	R\$ 176.204,65
Situação	Concluída

Rua José Genioli	
Valor Liquidado	R\$ 621.023,50
Situação	Concluída



Foto antes:

Foto depois:

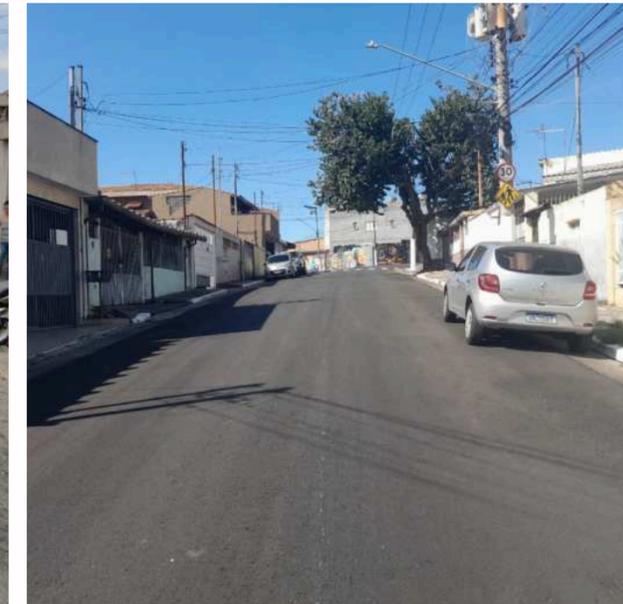


Foto antes:

Foto depois:

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DE VIAS (RECAPE) [LIVRE] [BP]

Rua Evaristo Luz	
Valor Liquidado	R\$ 93.650,12
Situação	Concluída

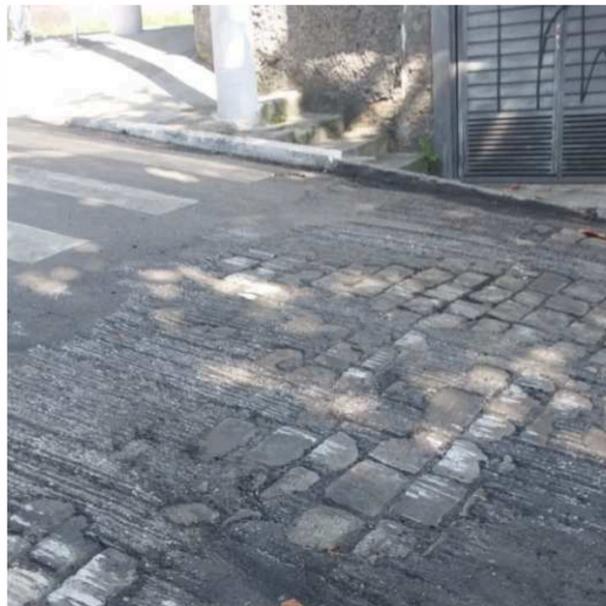


Foto antes:



Foto depois:

OBRAS DE MELHORIA DE BAIRRO

OBRAS DE MELHORIA DE BAIRRO [LIVRE]:

Objeto	Praça da Primeira Infância
Subprefeitura	Capela do Socorro
Endereço	Praça Yvonne dos Santos Rattis - Parque América
Nº do SEI	6012.2024/0003954-1
% de Execução	A licitar



Local:



Projeto Basico:

OBRAS DE MELHORIA DE BAIRRO [LIVRE]:

Objeto	Praça da Primeira Infância
Subprefeitura	Itaquera
Endereço	Praça Carmem Verdegay - Conjunto Residencial José Bonifácio
Nº do SEI	6012.2023/0015844-1
% de Execução	A licitar



Local:



Projeto Basico:

OBRAS DE MELHORIA DE BAIRRO [LIVRE]:

Objeto	Pátio de Compostagem
Subprefeitura	Lapa
Endereço	Av. Alexandre Colares, 31 - Jaraguá
Nº do Termo de Contrato	196/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2022/0020268-6
Data da OIS	15/05/2023
Data de término	03/11/2024 (com aditamento)
% de Execução	20%

Valor do Contrato	R\$ 4.009.518,68
Valor Aprovado	R\$ 3.561.308,84
Valor Empenhado	R\$ 3.561.009,76
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto em execução:



Foto em execução:

OBRAS DE MELHORIA DE BAIRRO [LIVRE]:

Objeto	Pátio de Compostagem
Subprefeitura	Penha
Endereço	Av. Condessa Elizabeth de Robiano x Viaduto Domingos Franciulli Netto
Nº do Termo de Contrato	279/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2022/0021465-0
Data da OIS	06/07/2023
Data de término	08/07/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluído

Valor do Contrato	R\$ 2.619.096,18
Valor Aprovado	R\$ 1.669.369,93
Valor Empenhado	R\$ 1.669.369,93
Valor Liquidado	R\$ 452.973,22




Foto antes:

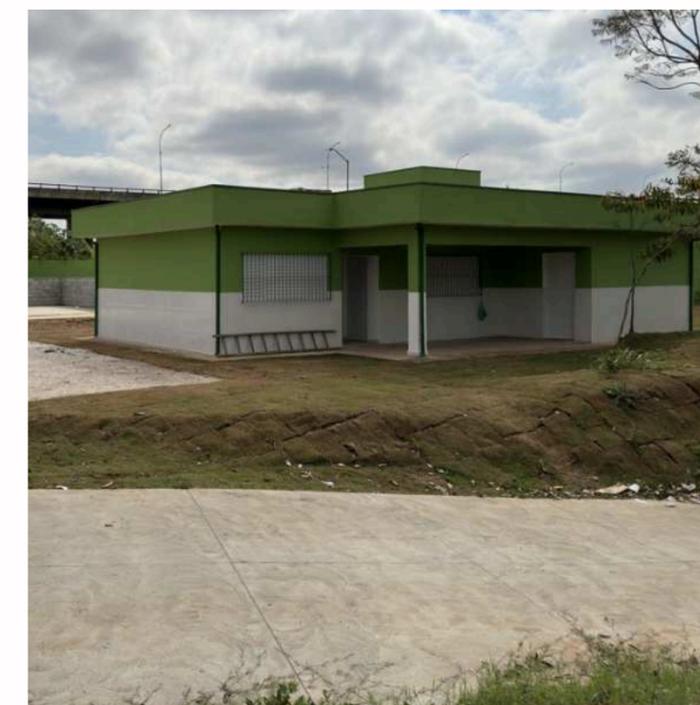



Foto depois:

OBRAS DE MELHORIA DE BAIRRO [LIVRE]:

Objeto	Praça Vila Carmosina
Subprefeitura	Itaquera
Endereço	Av. Francisco Tranchesi x Av. Afonso de Sampaio e Souza
Nº do SEI	6012.2024/0005756-6
% de Execução	A licitar



Local:

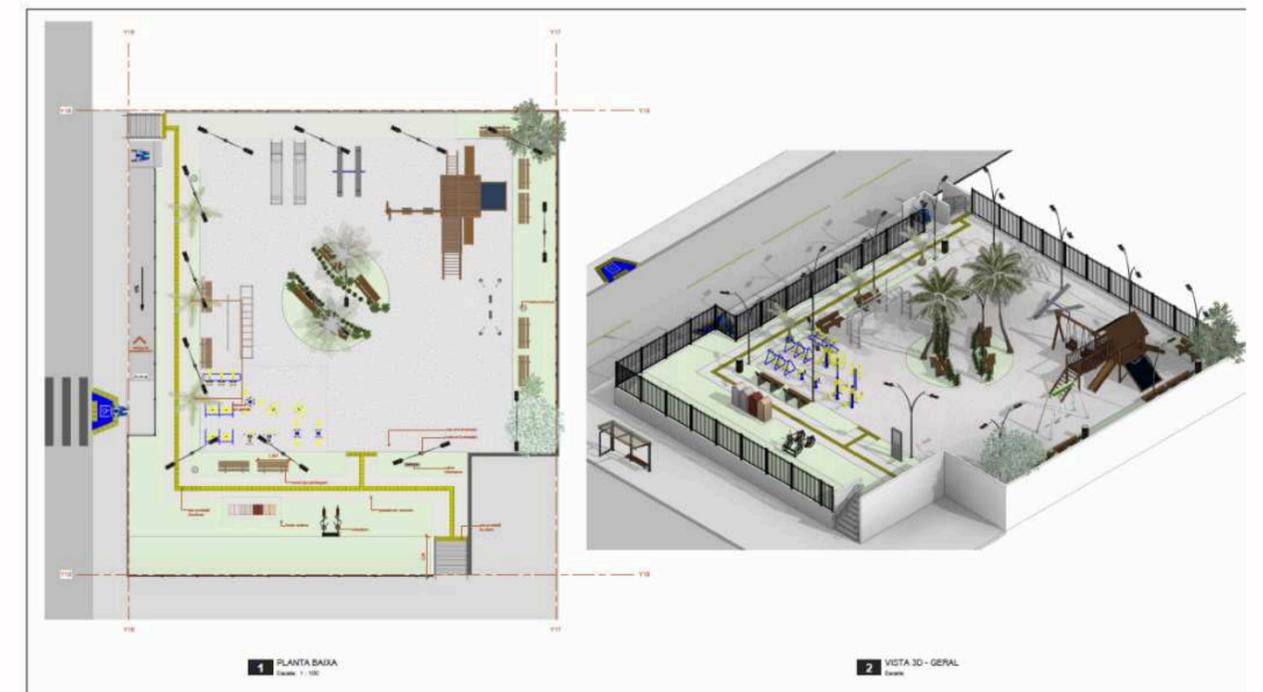

Projeto :

OBRAS DE MELHORIA DE BAIRRO [LIVRE]:

Objeto	Praça Carlos Casado
Subprefeitura	Brasilândia
Endereço	Rua São Miguel dos Milagres
Nº do Termo de Contrato	126/SMSUB/COGEL/2022
Nº do SEI	6012.2022/0012434-0
Data da OIS	23/11/2023
Data de término	26/05/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluído

Valor do Contrato	R\$ 340.153,56
Valor Aprovado	R\$ 328.675,22
Valor Empenhado	R\$ 0,00
Valor Liquidado	R\$ 0,00



Foto antes:




Foto depois:

OBRAS DE DRENAGEM E ÁREAS DE RISCO

META 32 DO PDM 2021/2024

OBRAS DE DRENAGEM E ÁREAS DE RISCO:

Objeto	Execução de Sistema de Grelhas
Subprefeitura	Sé
Endereço	Túnel Anhagabaú - (Av. 23 de Maio - Av. Prestes Maia)
Nº do Termo de Contrato	220/SMSUB/COGEL/2022
Nº do SEI	6012.2022/0022271-7
Data da OIS	24/02/2022
Data de término	11/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluído

Valor do Contrato	R\$ 1.231.782,19
Valor Aprovado	R\$ 566.334,66
Valor Empenhado	R\$ 566.334,66
Valor Liquidado	R\$ 499.489,97



Foto antes:



Foto depois:

OBRAS DE DRENAGEM E ÁREAS DE RISCO:

Objeto	Implantação de Reservatório de Amortecimento de Cheia
Subprefeitura	São Miguel Paulista
Endereço	Rua Serra do Grão Mogol, s/n - Rua Tite de Lemos, s/n - Vila Seabra, São Paulo/SP
Nº do Termo de Contrato	120/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2022/0025358-2
Data da OIS	18/04/2023
Data de término	31/07/2024 (com aditamento)
% de Execução	50%

Valor do Contrato	R\$ 6.565.415,84
Valor Aprovado	R\$ 5.847.052,91
Valor Empenhado	R\$ 5.847.052,91
Valor Liquidado	R\$ 3.836.281,23



Foto em Execução:

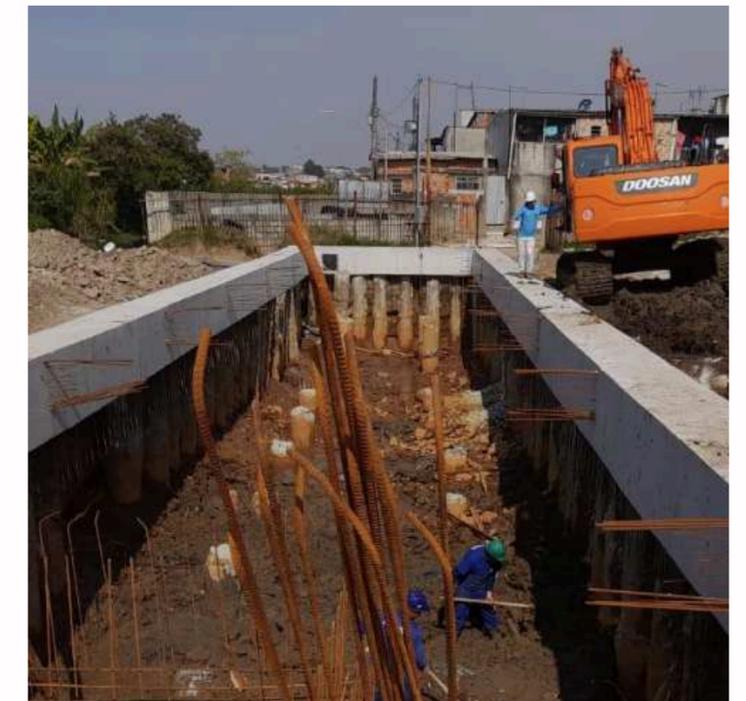


Foto em Execução:

OBRAS DE DRENAGEM E ÁREAS DE RISCO:

Objeto	Execução de contenção e drenagem
Subprefeitura	Aricanduva-Formosa
Endereço	Rua Floriza, altura do nº 376 - Fundos - Vila Formosa "Zum"
Nº do Termo de Contrato	085/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2022/0019143-9
Data da OIS	14/04/2023
Data de término	24/04/2024 (com aditamento)
% de Execução	Concluído

Valor do Contrato	R\$ 2.666.212,02
Valor Aprovado	R\$ 1.415.878,70
Valor Empenhado	R\$ 1.415.878,70
Valor Liquidado	R\$ 1.297.104,21



Foto antes:



Foto depois:

OBRAS DE DRENAGEM E ÁREAS DE RISCO:

Objeto	Execução de obras de drenagem
Subprefeitura	Vila Mariana
Endereço	Rua Correia de Lemos - Chácara Inglesa
Nº do Termo de Contrato	244/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2022/0022216-4
Data da OIS	25/05/2023
Data de término	03/08/2024
% de Execução	Concluída

Valor do Contrato	R\$ 3.332.432,08
Valor Aprovado	R\$ 912.604,54
Valor Empenhado	R\$ 912.604,54
Valor Liquidado	R\$ 0,00

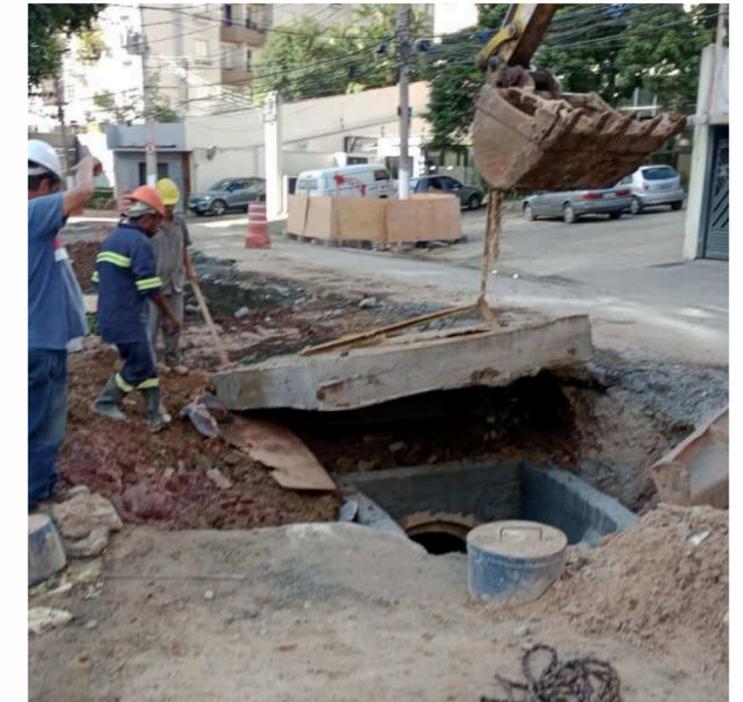


Foto durante:


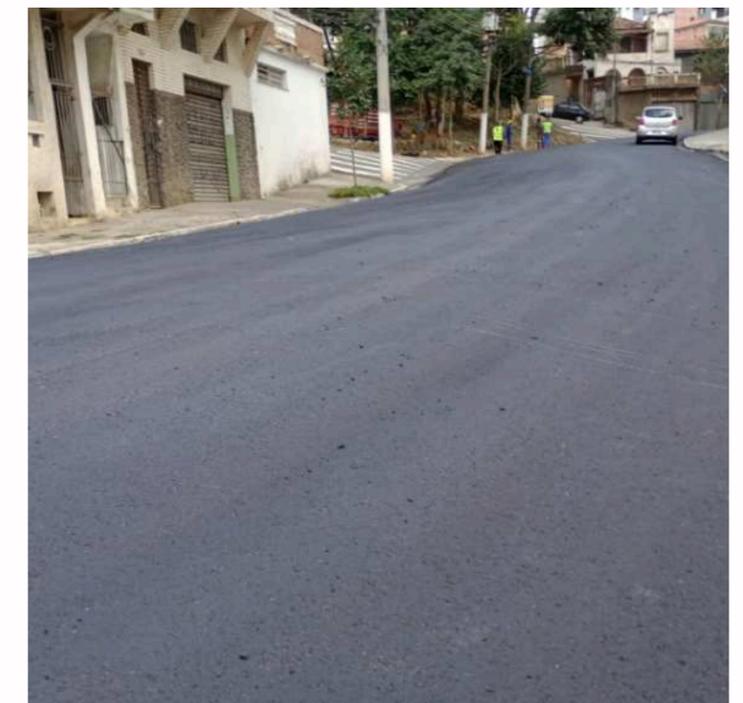


Foto depois:

OBRAS DE DRENAGEM E ÁREAS DE RISCO:

Objeto	Elaboração de projeto executivo e execução de obras de drenagem
Subprefeitura	Cidade Ademar
Endereço	Rua Tomasina x Praça Luigi Palma
Nº do Termo de Contrato	/SMSUB/COGEL/2023
Nº do SEI	6012.2024/0008766-0
% de Execução	A licitar

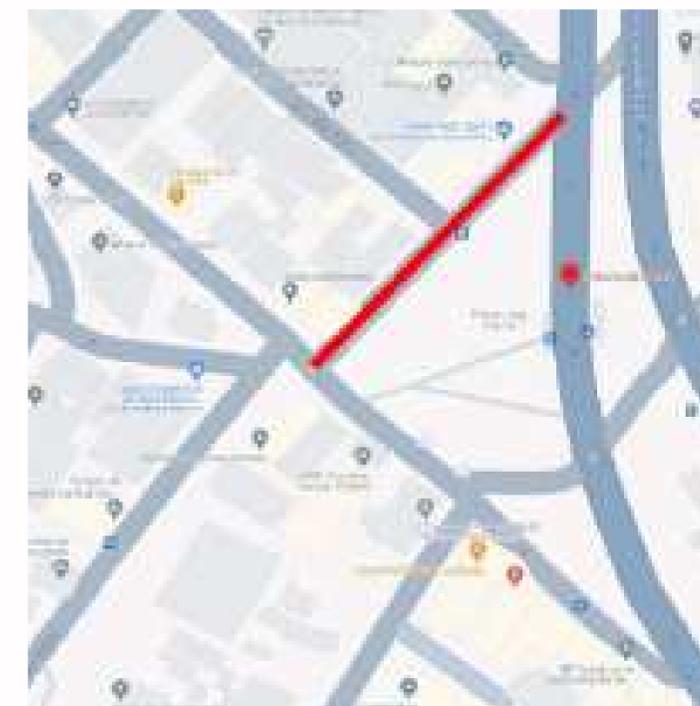


Localização:




Foto Projeto:

OBRAS DE DRENAGEM E ÁREAS DE RISCO:

Objeto	Execução de obras de drenagem
Subprefeitura	Mooca
Endereço	Rua Tiers - Trecho I
Nº do SEI	6012.2023/0024810-6
% de Execução	A licitar

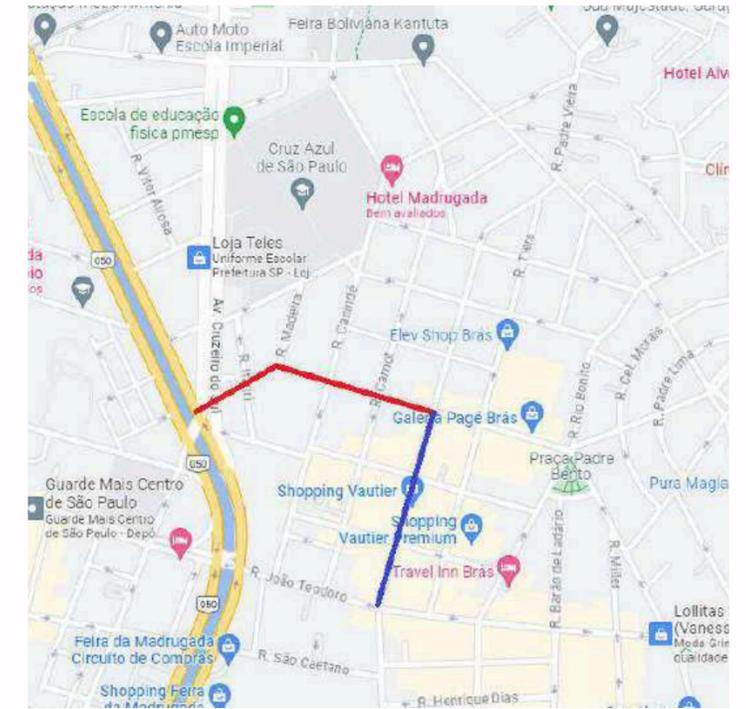

Croqui de Localização:

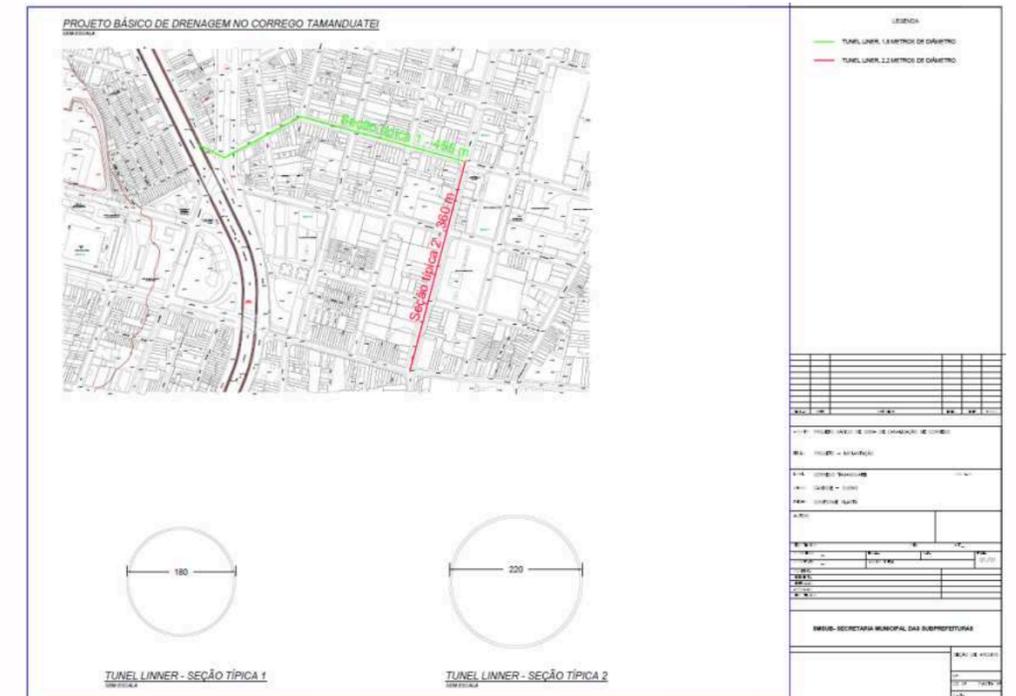

Projeto:

OBRIGADO!
