

# **PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024**

## **Agosto**

**FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEME**

**PROCESSO SEI: 6019.2023/0002929-1**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO  
ESPORTES E LAZER**

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## Valores em [R\$]




OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Centro Esportivo Juscelino Kubitschek (Arena de Lutas)	2.839.132,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Esportivo Náutico Guarapiranga (Hub Náutico)	2.839.132,57*	0,00	0,00	0,00	0,00
Centro Esportivo Náutico Guarapiranga (Transformação do Centro Esportivo em Núcleo Olímpico Regional)	11.822.308,37*	11.822.308,37	2.204.693,49	2.204.693,49	18,65
Novo Centro Esportivo - sem nome - Cidade Tiradentes	407.380,74	180.379,87	180.361,86	180.361,86	44,27
Novo Centro Esportivo - Cidade Líder (Centro Esportivo e Ambiental Parque Savoy)	1.685.550,39	1.054.631,07	549.778,84	549.778,84	32,62
Novo Centro Esportivo - Cidade Ademar (Vila Missionária)	406.495,35	193.452,51	193.437,22	193.437,22	47,59
<b>TOTAL</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>13.250.771,82</b>	<b>3.128.271,41</b>	<b>3.128.271,41</b>	<b>21,84</b>

### VALORES RELATIVOS AO SISTEMA SOF EM 09 / 08 / 2024

\* O valor de R\$ 14.661.440,94 aprovado na Res. 013/2024 contempla tanto a iniciativa do "Hub Náutico" como a "Transformação do Centro Esportivo em Núcleo Olímpico Regional", ambas no Centro Esportivo Náutico Guarapiranga, conforme apresentação e aprovação obtida na 38ª Reunião Ordinária do Conselho do FUNDURB. Formalmente, essa subdivisão das aplicações propostas para o Centro Esportivo Náutico Guarapiranga não constou na Res. 013/2024, que conjugou os valores de ambas as iniciativas.

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## MAPA DAS INTERVENÇÕES

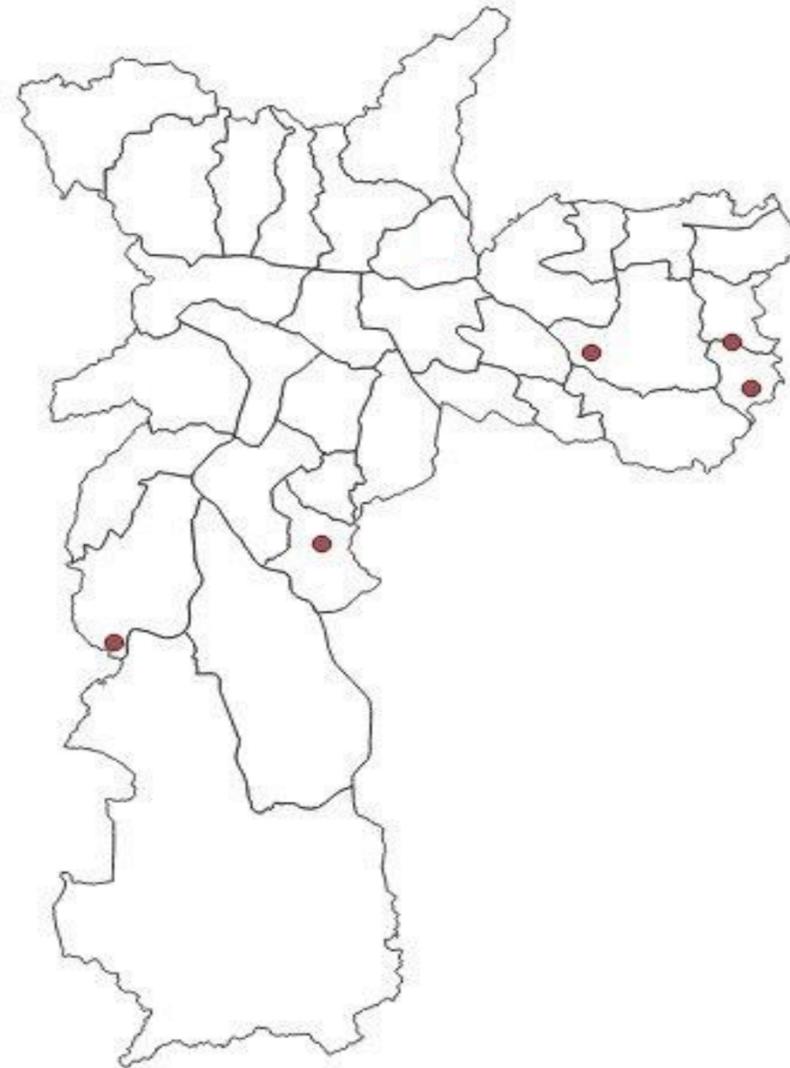

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

### OBJETO Centro Esportivo Juscelino Kubitscheck (Arena de Lutas)

DESCRIÇÃO	
<b>Ação</b>	Transformação do Centro Esportivo em Núcleo Olímpico Regional
<b>Endereço/Distrito/Subprefeitura</b>	Inácio Monteiro, 55 - Cidade Tiradentes
<b>Situação</b>	Em desenvolvimento do Projeto Executivo (pela ADESAMPA) À licitar À contratar
<b>Processo Administrativo</b>	6019.2023/0001590-8
<b>Início da Obra</b>	Previsão: 04/2025
<b>Previsão de Término</b>	Previsão: 12/2027
<b>Unidade de Medida</b>	Usuários / metros quadrados construídos
<b>Possui mais de uma Fonte de Recurso</b>	Não



*Foto antes da Intervenção.  
Novembro/2023.*

### INVESTIMENTO 2024

(Execução em andamento - Convênio 2023)

<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 2.839.132,58	Res. 013/2024
<b>Valor Empenhado</b>	0,00	0,00%
<b>Valor Pago</b>	0,00	0,00%




*Projeto básico  
Abril/2024.*

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

**OBJETO** Centro Esportivo Juscelino Kubitscheck (Arena de Lutas)

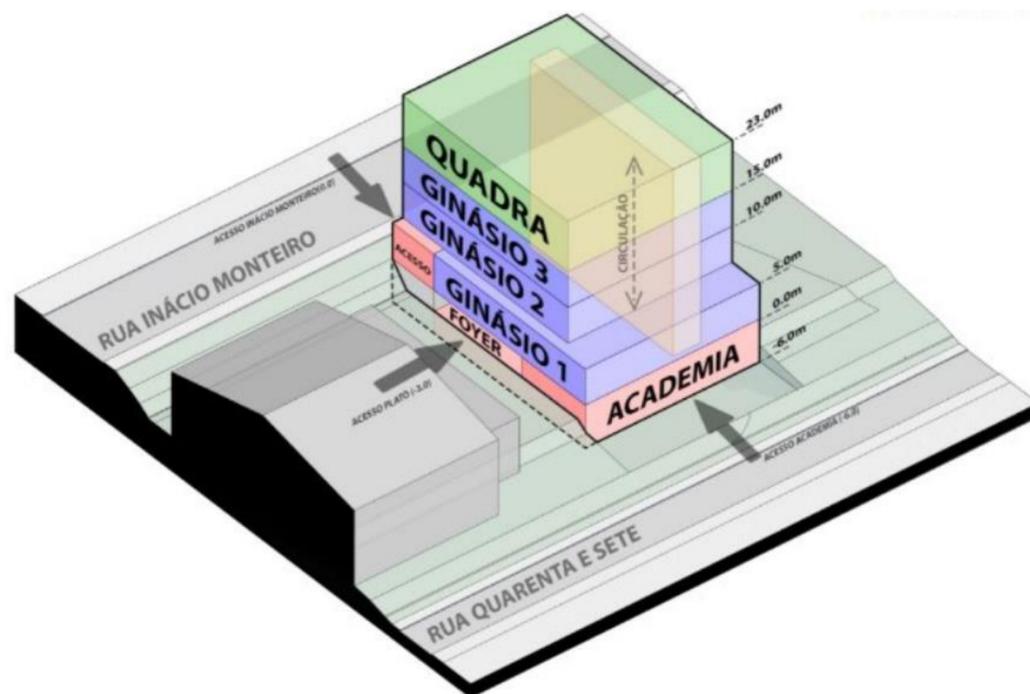

*Projeto Arena de Lutas*

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

### OBJETO Centro Náutico Guarapiranga (Hub Náutico)

DESCRIÇÃO	
Ação	Hub Náutico
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. dos Funcionários Públicos, 2501 - Jardim Horizonte Azul
Situação	Entregue Projeto Executivo
Processo Administrativo	6019.2023/0001590-8
Início da Obra	Previsão: 06/2026
Previsão de Término	Previsão: 12/2027
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não



*Foto antes da Intervenção.  
Novembro/2023.*

INVESTIMENTO 2024 (Execução em andamento - Convênio 2023)		
Valor Aprovado	R\$ 2.839.132,57	Res. 013/2024
Valor Empenhado	0,00	0,00%
Valor Pago	0,00	0,00%




*Projeto básico  
Abril/2024.*

### OBJETO Centro Náutico Guarapiranga (Hub Náutico)

Escola de Carpinataria  
Naval, Remo e Canagem



Projeto

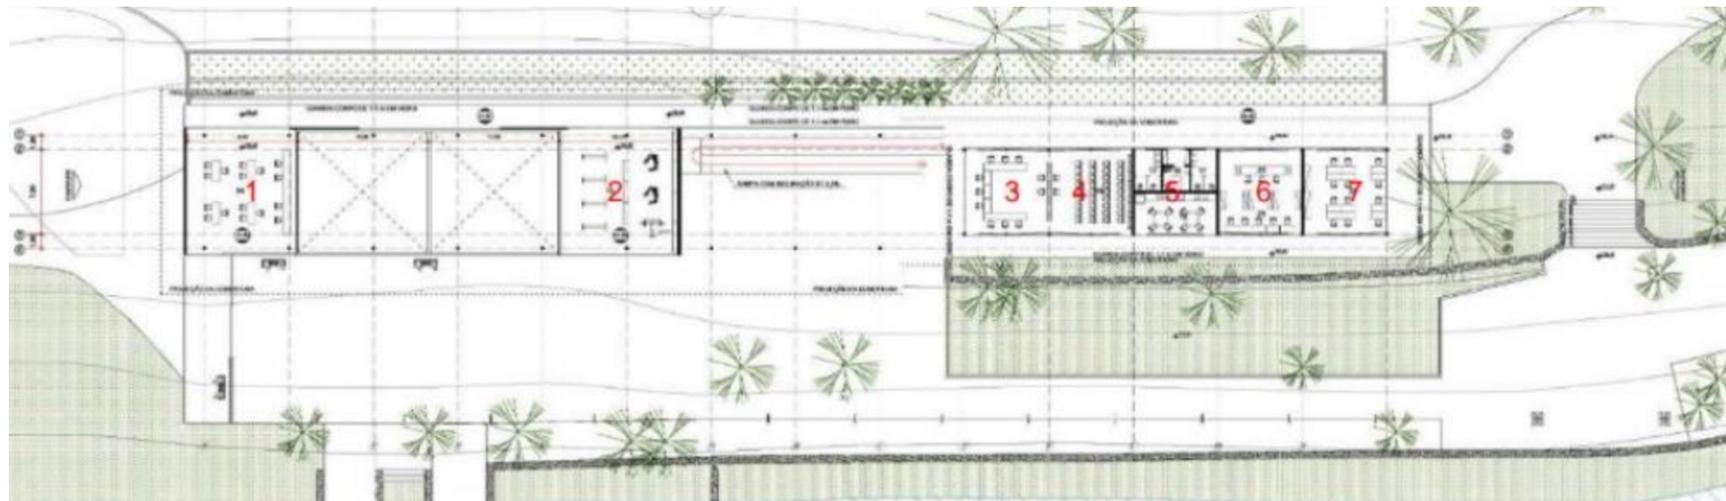

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

### OBJETO Centro Náutico Guarapiranga (Reforma)

DESCRIÇÃO	
<b>Ação</b>	Reforma - Transformação do Centro Esportivo em Núcleo Olímpico Regional
<b>Endereço/Distrito/Subprefeitura</b>	Av. dos Funcionários Públicos, 2501 - Jardim Horizonte Azul
<b>Situação</b>	Em andamento 50%
<b>Processo Administrativo</b>	6019.2023/0002964-0
<b>Início da Obra</b>	11/2023
<b>Previsão de Término</b>	12/2024
<b>Unidade de Medida</b>	Usuários / metros quadrados construídos
<b>Possui mais de uma Fonte de Recurso</b>	Não



*Foto antes da Intervenção.  
Novembro/2022.*

INVESTIMENTO 2024		
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 11.822.308,37	Res. 013/2024
<b>Valor Empenhado</b>	11.822.308,37	100,00%
<b>Valor Pago</b>	2.204.693,49	18,65%




*Foto - medição  
Junho/2024.*

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

### OBJETO Centro Náutico Guarapiranga (Reforma)

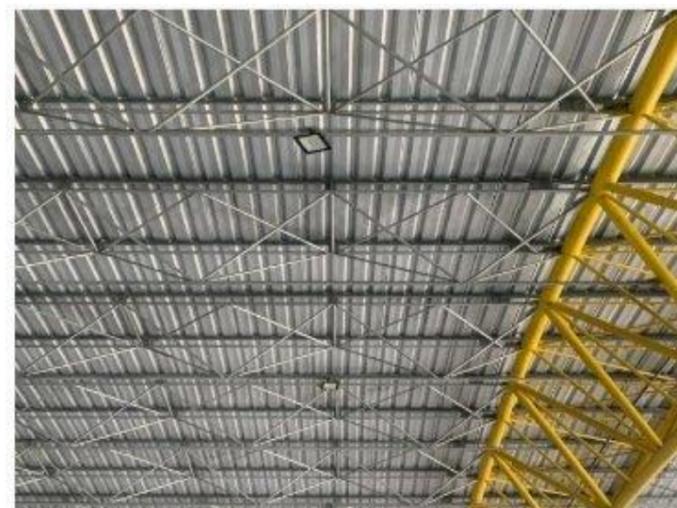


# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


### OBJETO Novo Centro Esportivo em Cidade Tiradentes

DESCRIÇÃO	
<b>Ação</b>	Elaboração de anteprojeto, projetos básico e executivo para novo centro esportivo
<b>Endereço/Distrito/Subprefeitura</b>	R. Umberto Barbaro S/N – Cidade Tiradentes
<b>Situação</b>	Projeto Básico entregue
<b>Processo Administrativo</b>	6019.2023/0003001-0
<b>Início da Obra</b>	Sem previsão
<b>Previsão de Término</b>	Sem previsão
<b>Unidade de Medida</b>	Usuários / metros quadrados construídos
<b>Possui mais de uma Fonte de Recurso</b>	Não

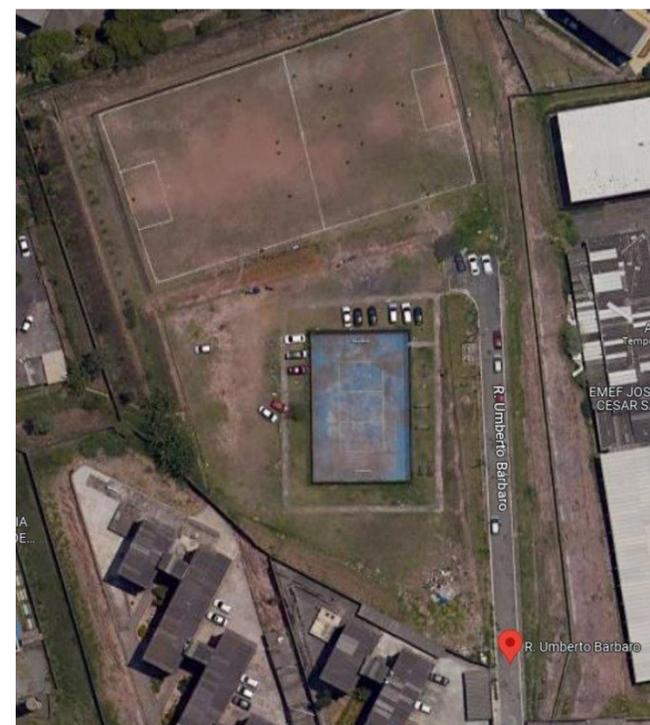

*Foto antes da Intervenção.  
Novembro/2023.*

INVESTIMENTO 2024		
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 407.380,74	Res. 013/2024
<b>Valor Empenhado</b>	180.379,87	44,28%
<b>Valor Pago</b>	180.361,86	44,27%


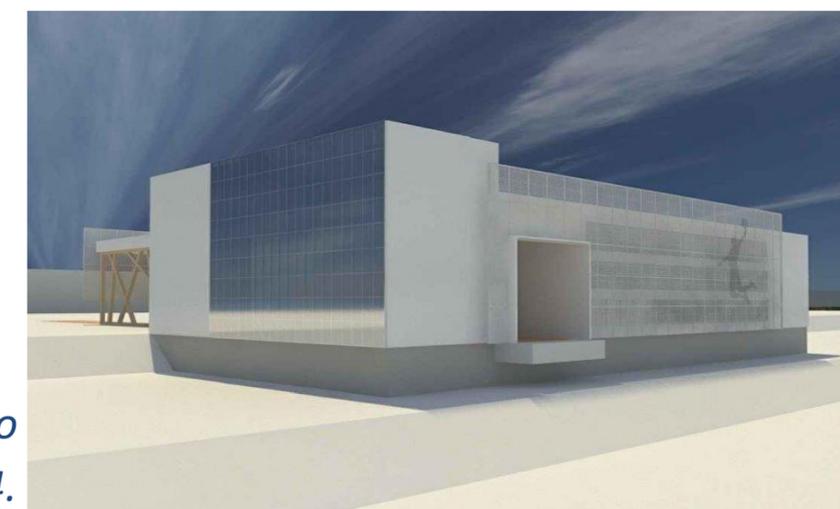


*Projeto  
Junho/2024.*

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

**OBJETO** Novo Centro Esportivo em Cidade Tiradentes

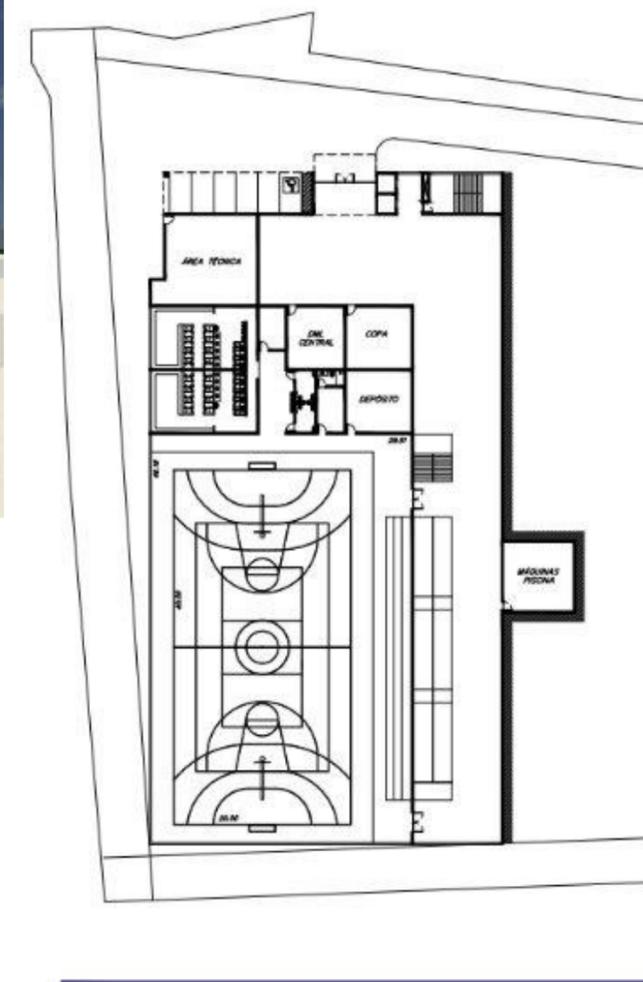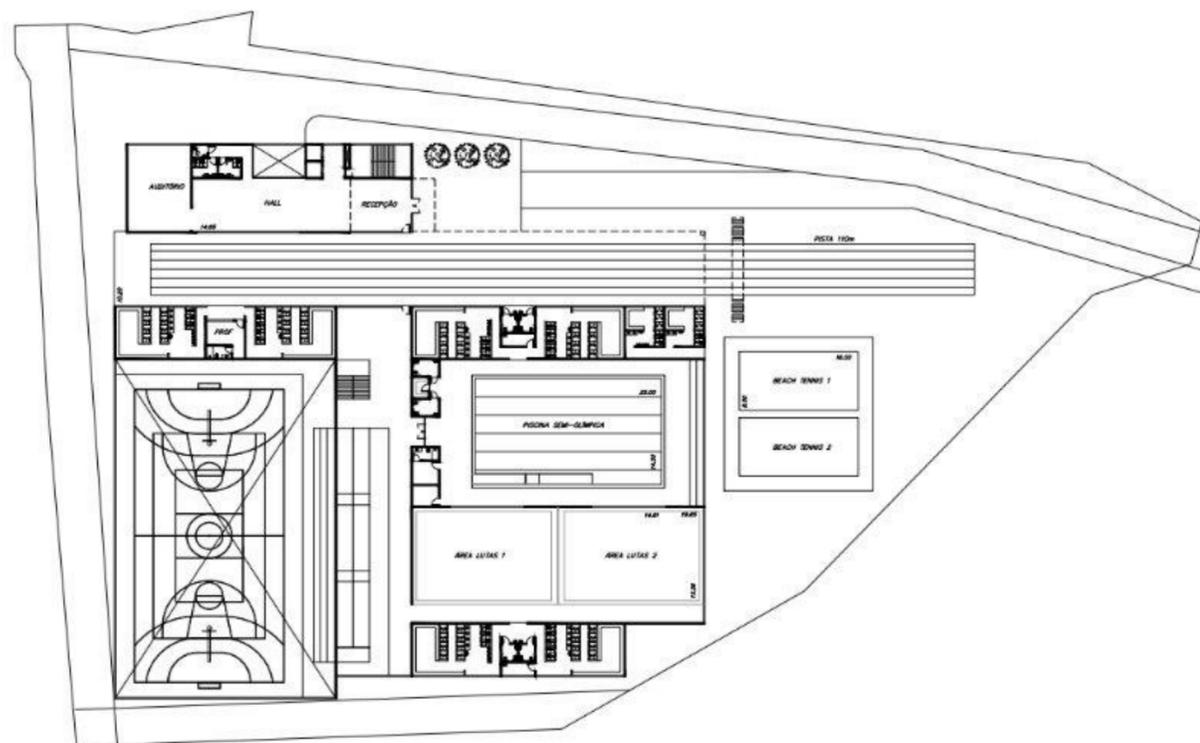


# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

### OBJETO Novo Centro Esportivo em Cidade Líder (Centro Esportivo e Ambiental Parque Savoy)

DESCRIÇÃO	
<b>Ação</b>	Elaboração de anteprojeto, projetos básico e executivo para novo centro esportivo / parque
<b>Endereço/Distrito/Subprefeitura</b>	Av. Alziro Zarur, no cruzamento com R. Júlio Pontes e Astrogildo Pereira
<b>Situação</b>	Em desenvolvimento do Projeto Executivo
<b>Processo Administrativo</b>	6019.2023/0003459-7
<b>Início da Obra</b>	06/2025
<b>Previsão de Término</b>	12/2028
<b>Unidade de Medida</b>	Usuários / metros quadrados construídos
<b>Possui mais de uma Fonte de Recurso</b>	Não

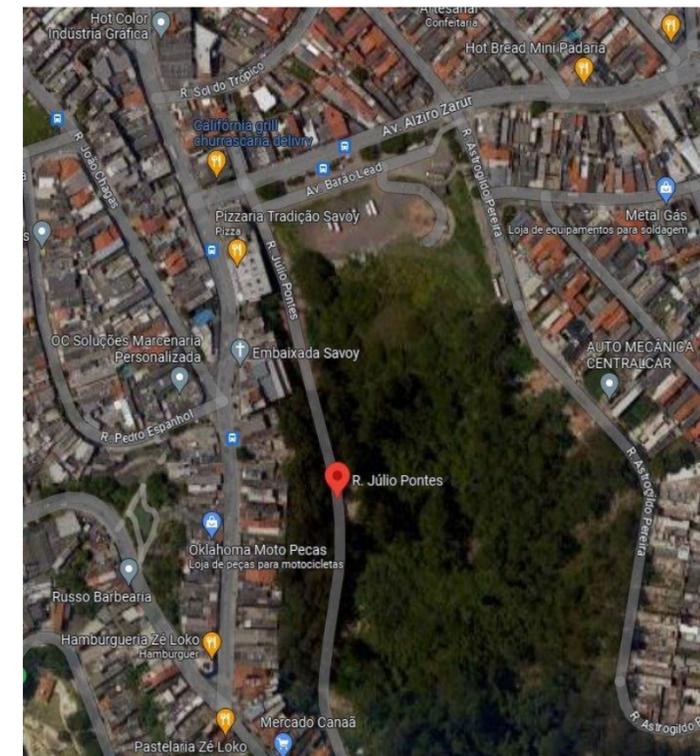

*Foto antes da Intervenção.  
Novembro/2023.*

INVESTIMENTO 2024		
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 1.685.550,39	Res. 013/2024
<b>Valor Empenhado</b>	1.054.631,07	62,56%
<b>Valor Pago</b>	549.778,84	32,59%





*Projeto  
Junho/2024.*

### OBJETO Novo Centro Esportivo em Cidade Líder (Centro Esportivo e Ambiental Parque Savoy)

TERREO



PLANTA TERREO

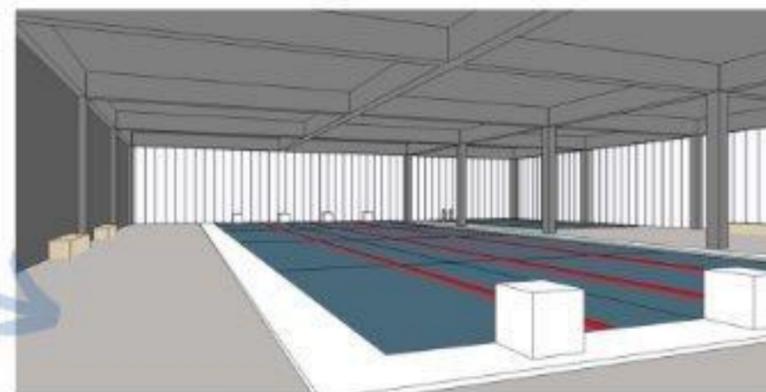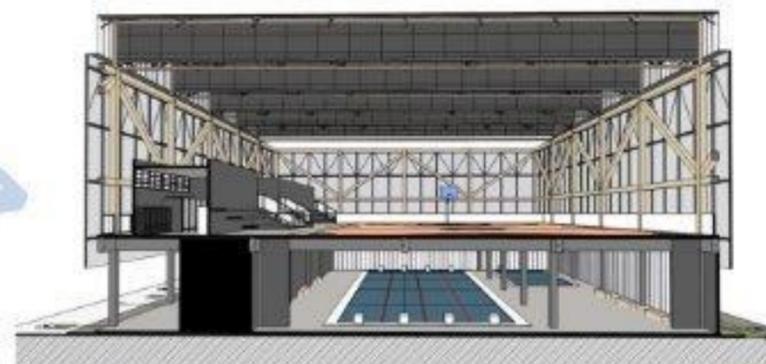

CE VILA SAVOI



# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

### OBJETO Novo Centro Esportivo em Cidade Ademar - Vila Missionária

DESCRIÇÃO	
<b>Ação</b>	Elaboração de anteprojeto, projetos básico e executivo para novo centro esportivo
<b>Endereço/Distrito/Subprefeitura</b>	R. Padre Luís Vilarés, 23
<b>Situação</b>	Entregue Projeto Básico
<b>Processo Administrativo</b>	6019.2023/0002928-3
<b>Início da Obra</b>	Sem previsão
<b>Previsão de Término</b>	Sem previsão
<b>Unidade de Medida</b>	Usuários / metros quadrados construídos
<b>Possui mais de uma Fonte de Recurso</b>	Não



*Foto antes da Intervenção.  
Novembro/2023.*

INVESTIMENTO 2024		
<b>Valor Aprovado</b>	R\$ 406.495,35	Res. 013/2024
<b>Valor Empenhado</b>	193.452,51	47,59%
<b>Valor Pago</b>	193.437,22	47,58%



*Projeto  
Junho/2024.*

# PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 Agosto

## DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

### OBJETO Novo Centro Esportivo em Cidade Ademar - Vila Missionária

