

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Novembro

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SEME

PROCESSO SEI: 6019.2023/0002929-1



**CIDADE DE
SÃO PAULO
ESPORTES E LAZER**

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 NOVEMBRO
RESOLUÇÃO SMUL.ATECC.FUNDURB/021/2024
Valores em [R\$]




OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Novo Centro Esportivo - sem nome - Cidade Tiradentes	180.379,87	180.379,87	180.361,86	180.361,86	99,99
Novo Centro Esportivo - Cidade Líder (Centro Esportivo e Ambiental Parque Savoy)	1.054.631,07	1.054.631,07	1.054.353,48	1.054.353,48	99,97
Novo Centro Esportivo - Cidade Ademar (Vila Missionária)	193.452,51	193.452,51	193.437,22	193.437,22	99,99
Novo Centro Esportivo Thomas Mazzoni (Transformação do Centro Esportivo em Núcleo Olímpico Regional)	6.749.228,18	6.747.228,18	5.847.449,12	4.609.676,58	68,29
Centro Esportivo Náutico Guarapiranga (Transformação do Centro Esportivo em Núcleo Olímpico Regional)	11.822.308,37	11.822.308,37	7.951.480,28	7.951.480,28	67,25
TOTAL	20.000.000,00	19.998.000,00	15.227.081,96	13.989.309,42	69,94

VALORES RELATIVOS AO SISTEMA SOF EM 05/11/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 NOVEMBRO

MAPA DAS INTERVENÇÕES

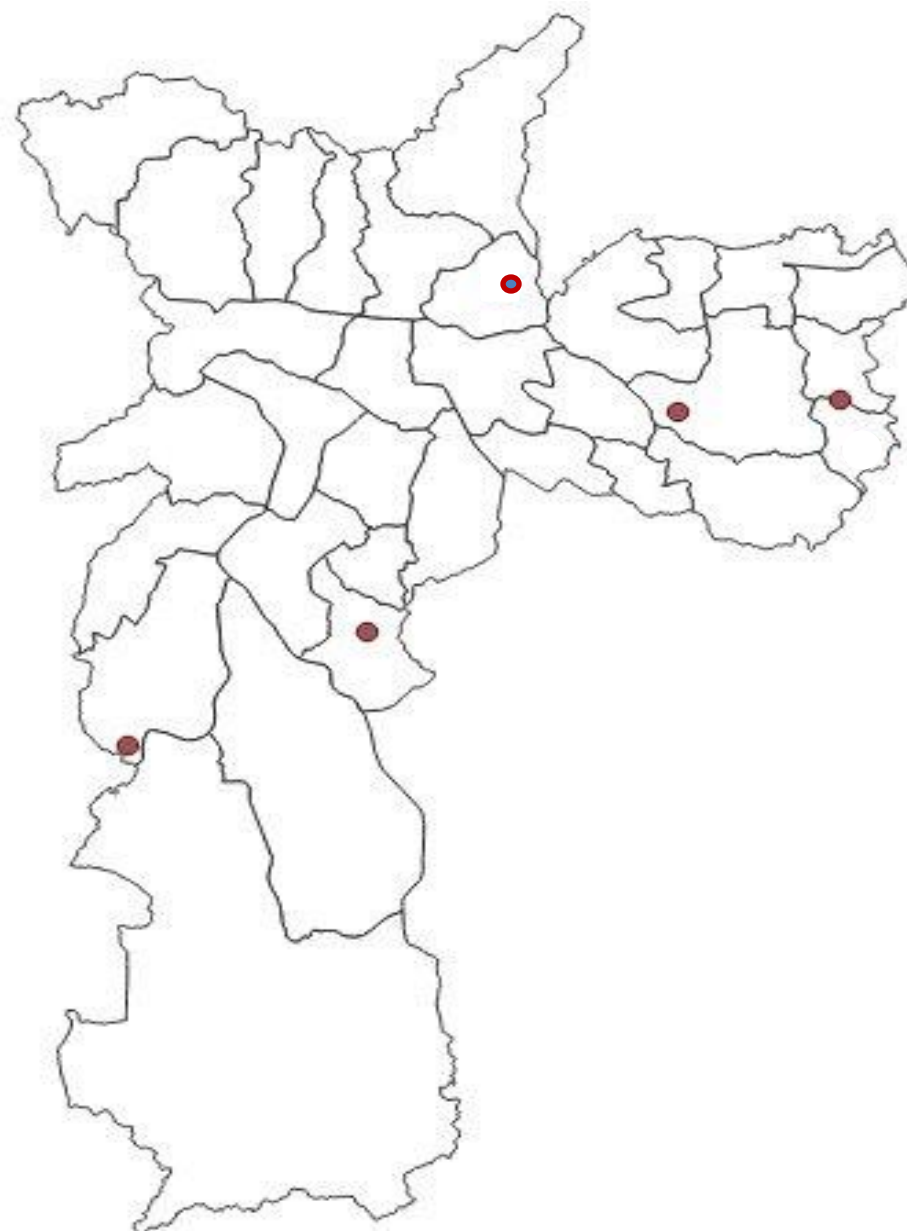


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 NOVEMBRO

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO Novo Centro Esportivo em Cidade Tiradentes


DESCRIÇÃO	
Ação	Elaboração de anteprojeto, projetos básico e executivo para novo centro esportivo
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Umberto Barbaro S/N – Cidade Tiradentes
Situação	Projeto Básico entregue
Processo Administrativo	6019.2023/0003001-0
Início da Obra	Sem previsão
Previsão de Término	Sem previsão
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não

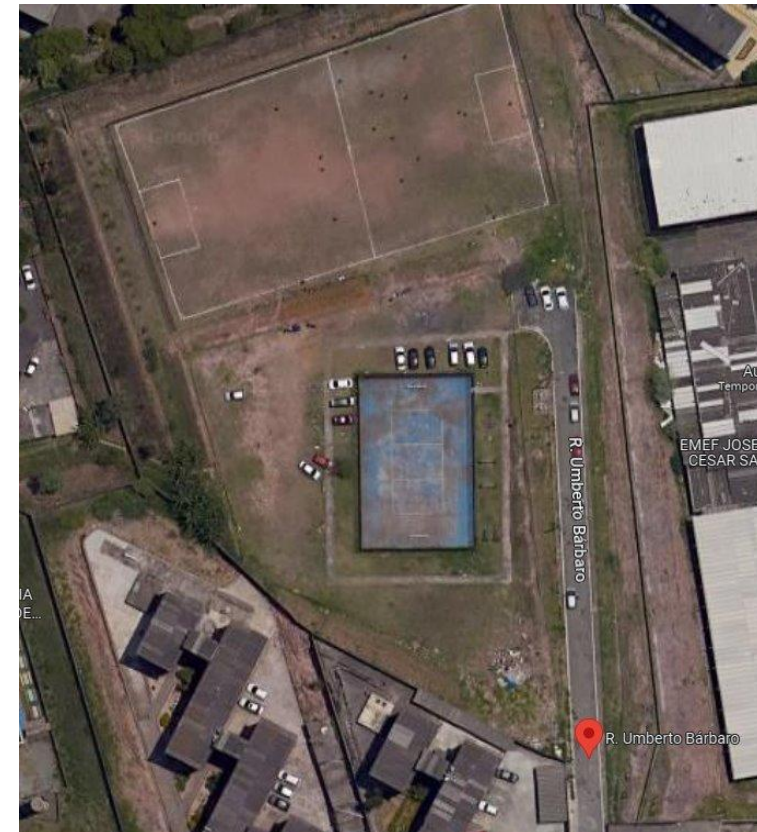

*Foto antes da Intervenção.
Novembro/2023.*



INVESTIMENTO 2024 R\$		
Valor Aprovado	180.379,87	Res. 021/2024
Valor Empenhado	180.379,87	100%
Valor Pago	180.361,86	99,99%

VALORES RELATIVOS AO SISTEMA SOF EM 05/11/2024

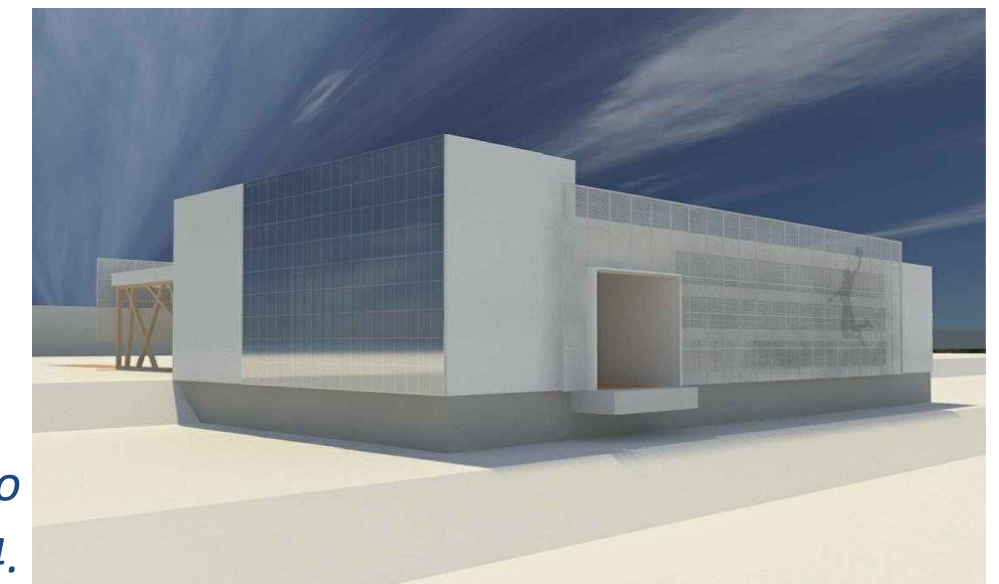

*Projeto
Junho/2024.*

OBJETO Novo Centro Esportivo em Cidade Tiradentes

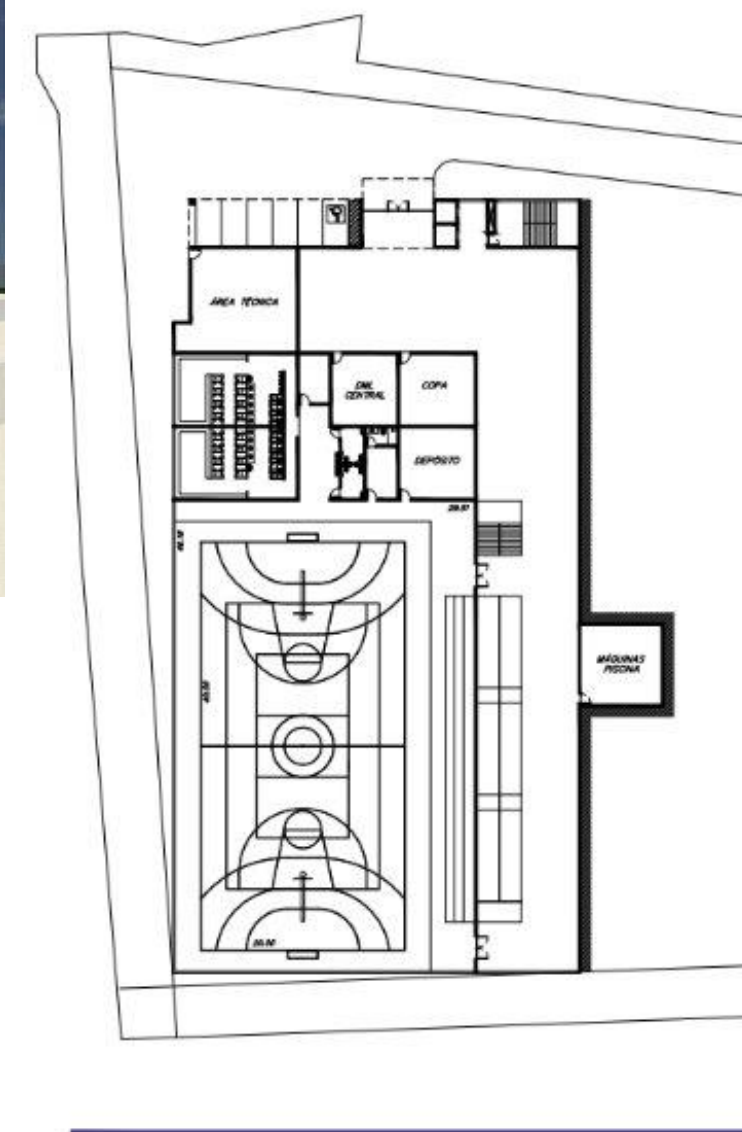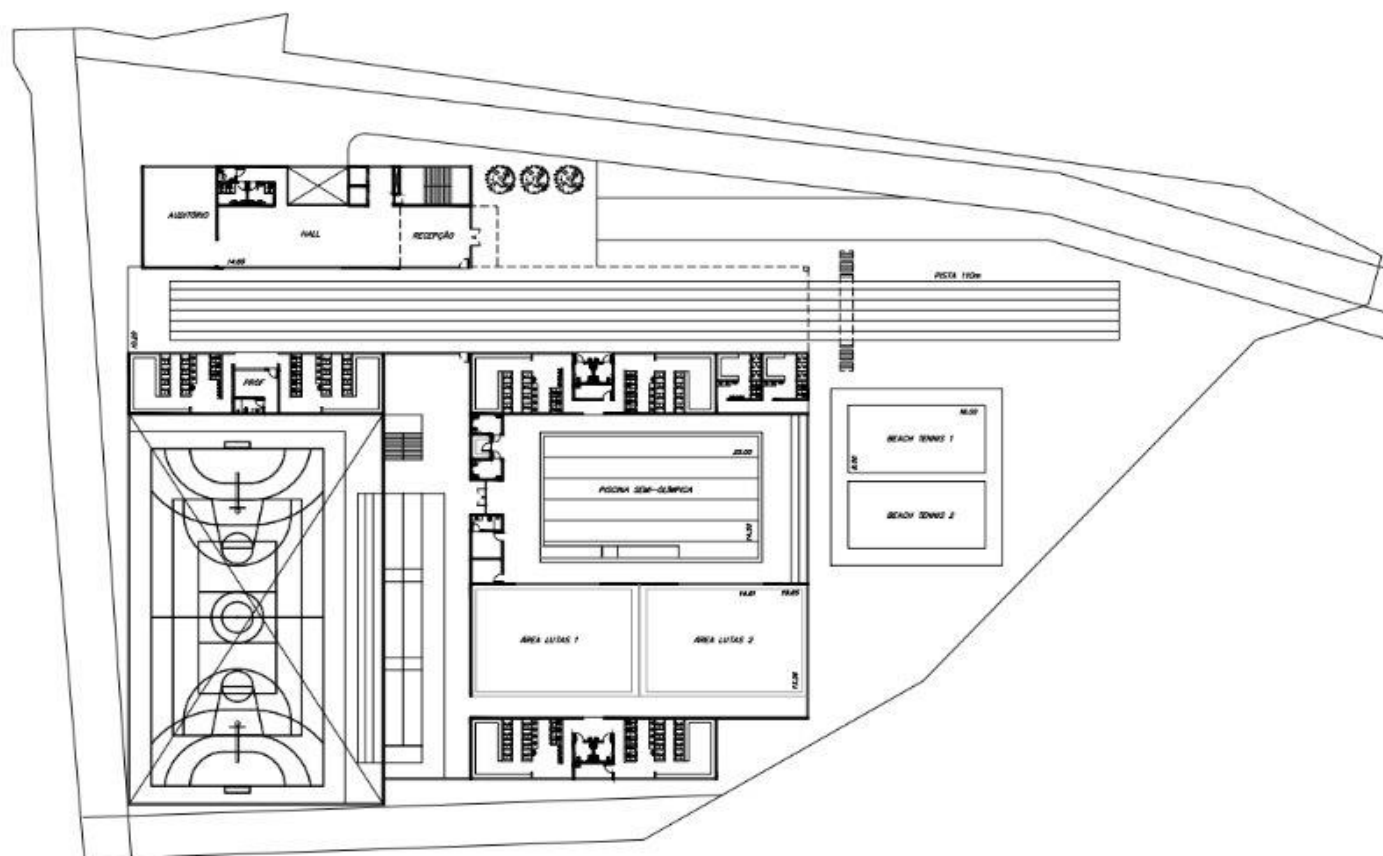


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 NOVEMBRO

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO Novo Centro Esportivo em Cidade Líder (Centro Esportivo e Ambiental Parque Savoy)

DESCRIÇÃO	
Ação	Elaboração de anteprojeto, projetos básico e executivo para novo centro esportivo / parque
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Alziro Zarur, no cruzamento com R. Júlio Pontes e Astrogildo Pereira
Situação	Entregue Projeto Executivo
Processo Administrativo	6019.2023/0003459-7
Início da Obra	06/2025
Previsão de Término	12/2028
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não

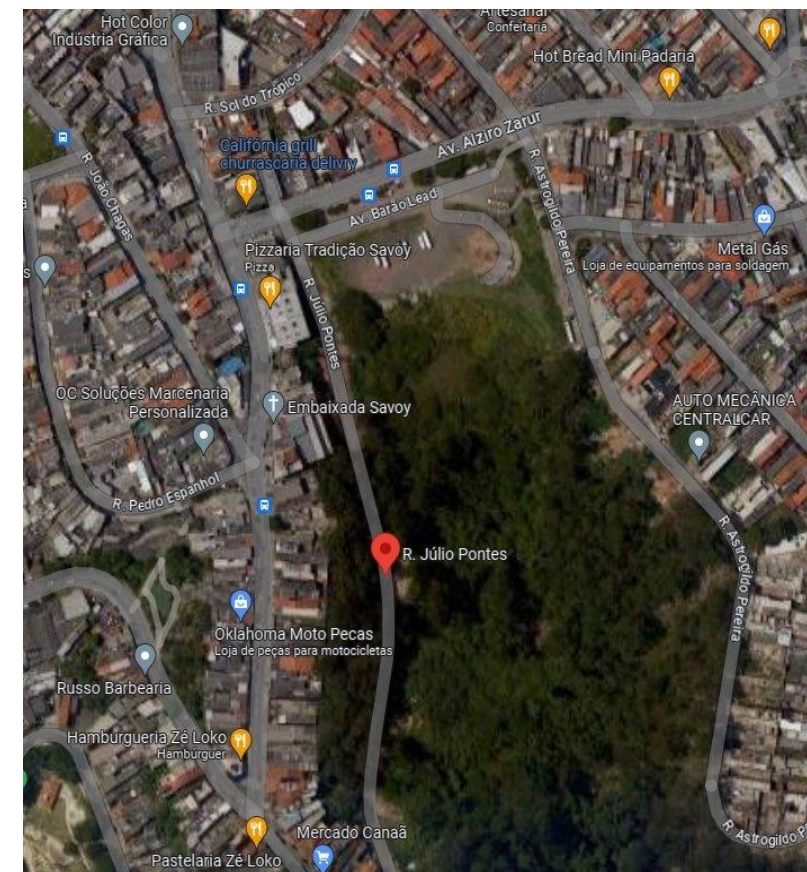

*Foto antes da Intervenção.
Novembro/2023.*


INVESTIMENTO 2024 R\$		
Valor Aprovado	1.054.631,07	Res. 021/2024
Valor Empenhado	1.054.631,07	100%
Valor Pago	1.054.353,48	99,97%





*Projeto
Junho/2024.*

OBJETO Novo Centro Esportivo em Cidade Líder (Centro Esportivo e Ambiental Parque Savoy)

TERREO

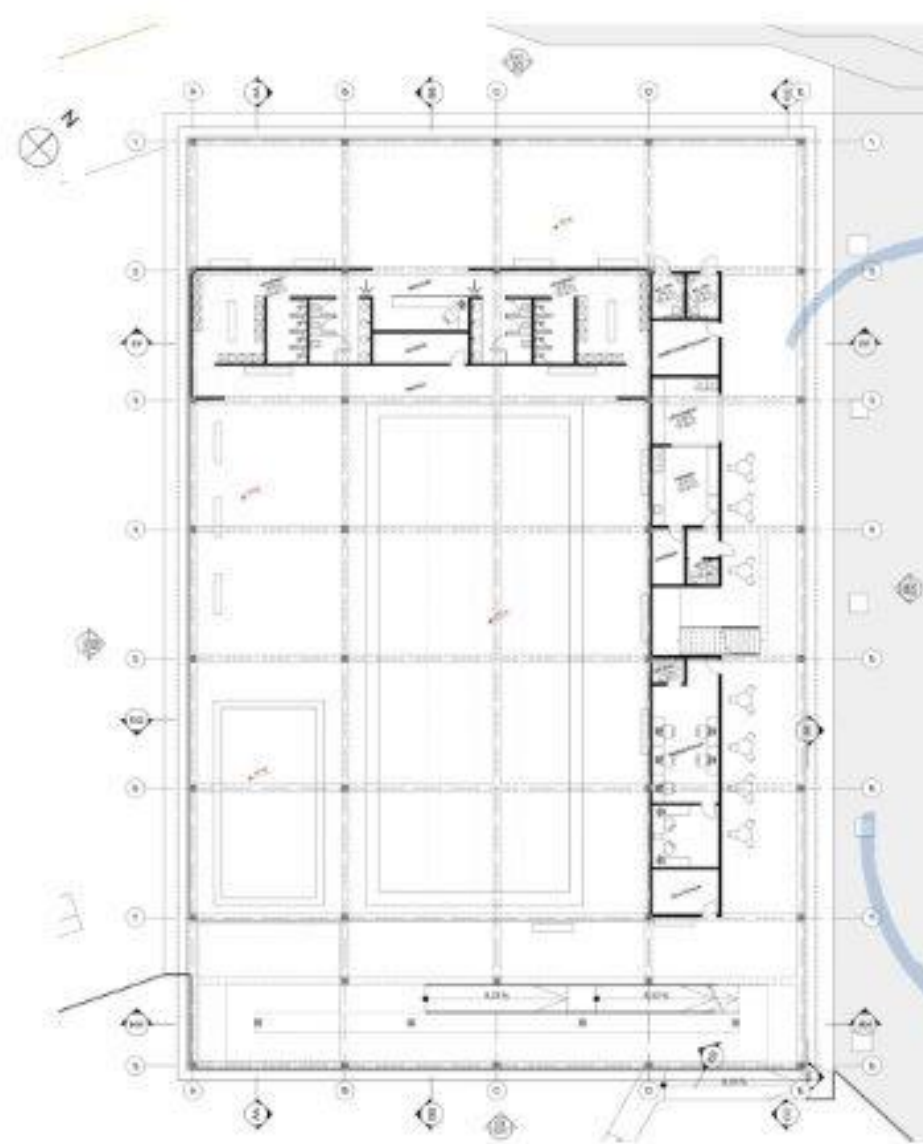

PLANTA TERREO

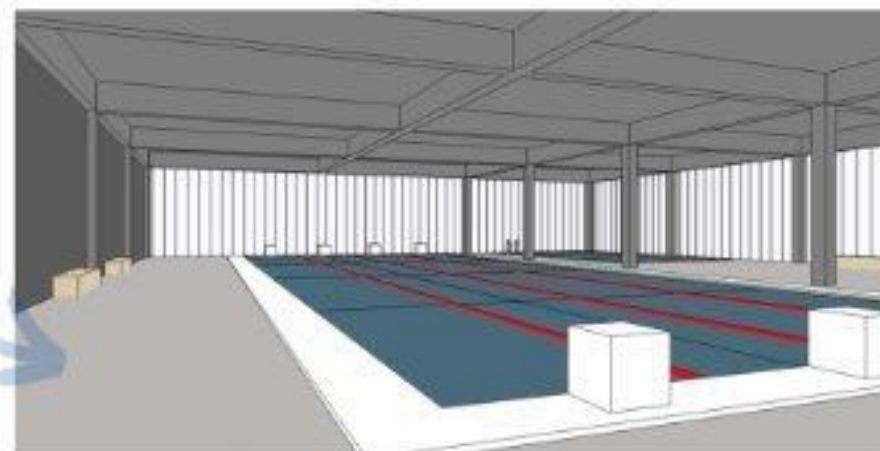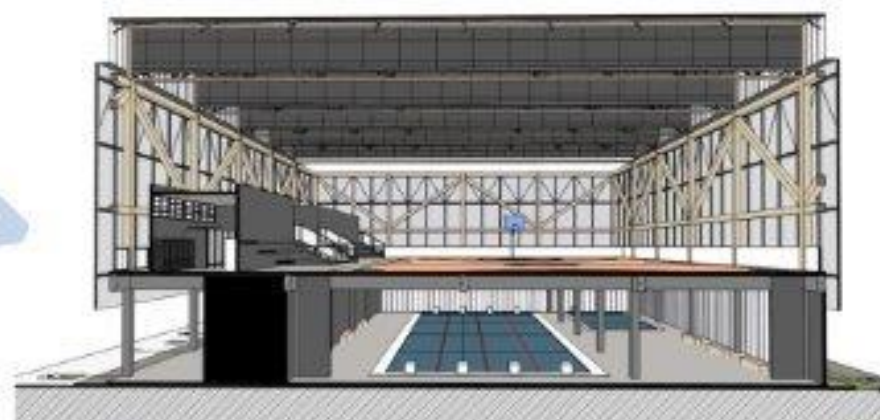

CE VILA SAVOI



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 NOVEMBRO

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO Novo Centro Esportivo em Cidade Ademar - Vila Missionária

DESCRIÇÃO	
Ação	Elaboração de anteprojeto, projetos básico e executivo para novo centro esportivo
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Padre Luís Vilares, 23
Situação	Entregue Projeto Básico
Processo Administrativo	6019.2023/0002928-3
Início da Obra	Sem previsão
Previsão de Término	Sem previsão
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não



*Foto antes da Intervenção.
Novembro/2023.*




INVESTIMENTO 2024 R\$		
Valor Aprovado	193.452,51	Res. 021/2024
Valor Empenhado	193.452,51	100%
Valor Pago	193.437,22	99,99%

VALORES RELATIVOS AO SISTEMA SOF EM 05/11/2024



*Projeto
Junho/2024.*

OBJETO Novo Centro Esportivo em Cidade Ademar - Vila Missionária

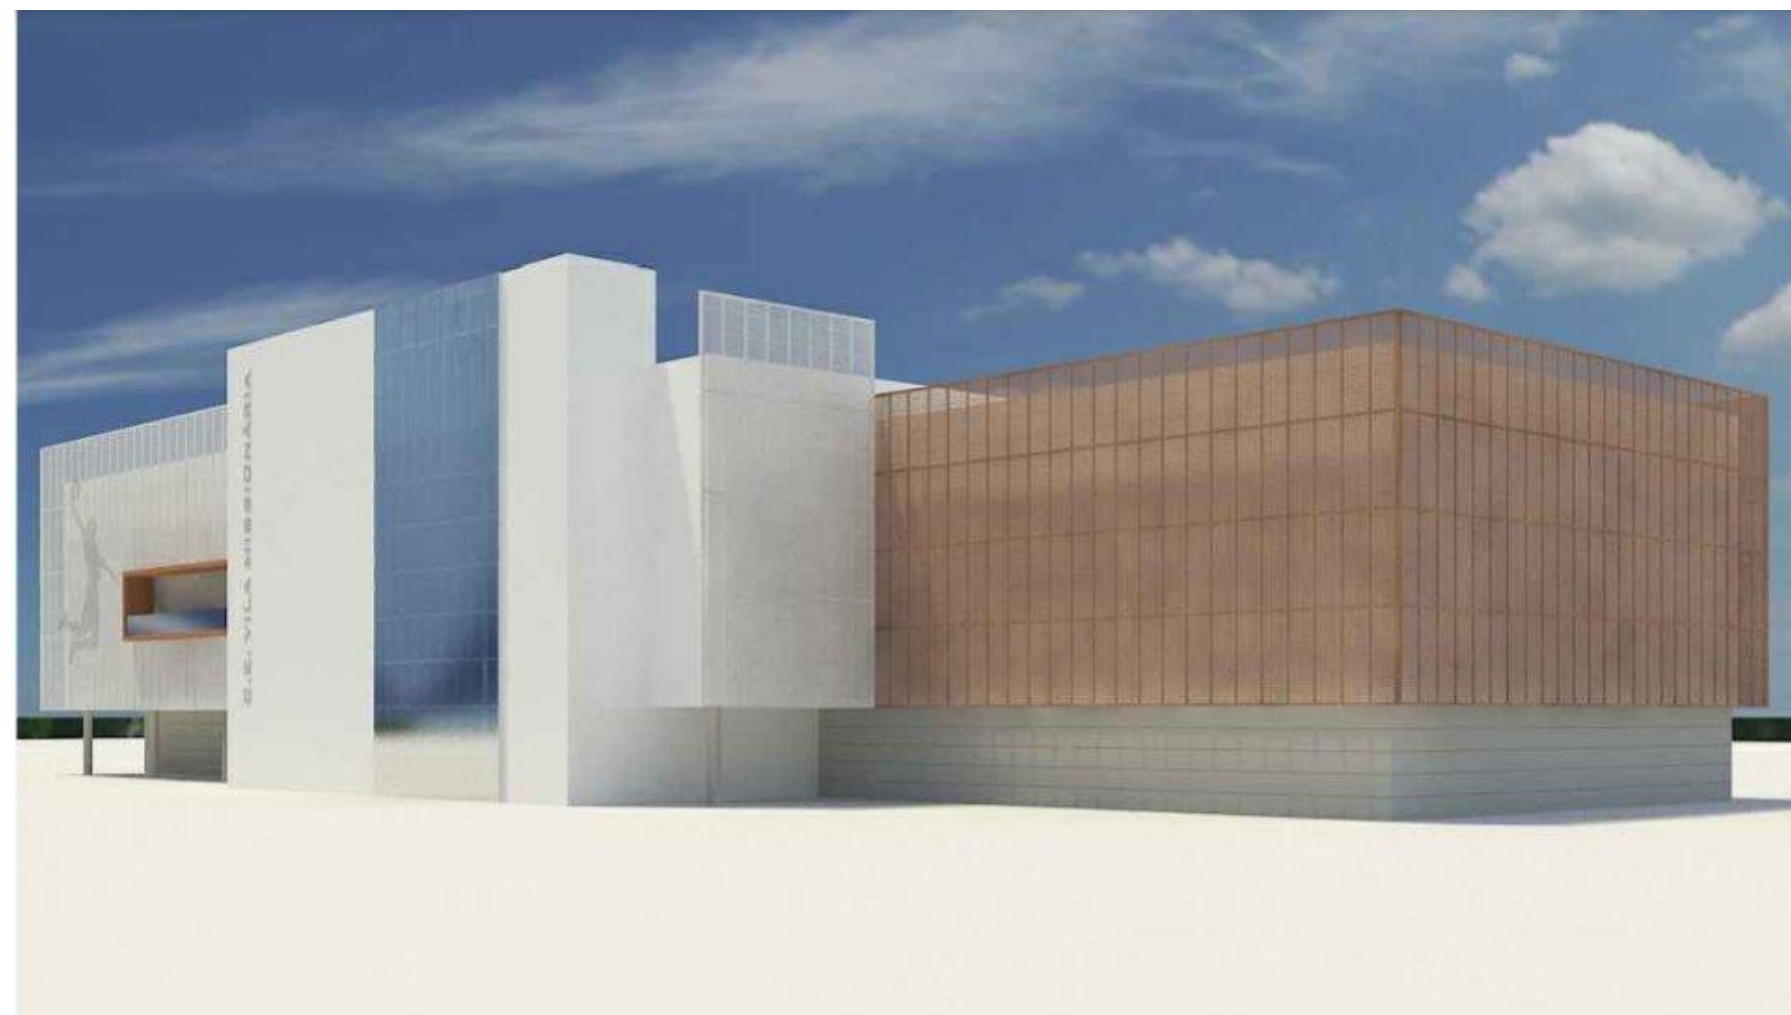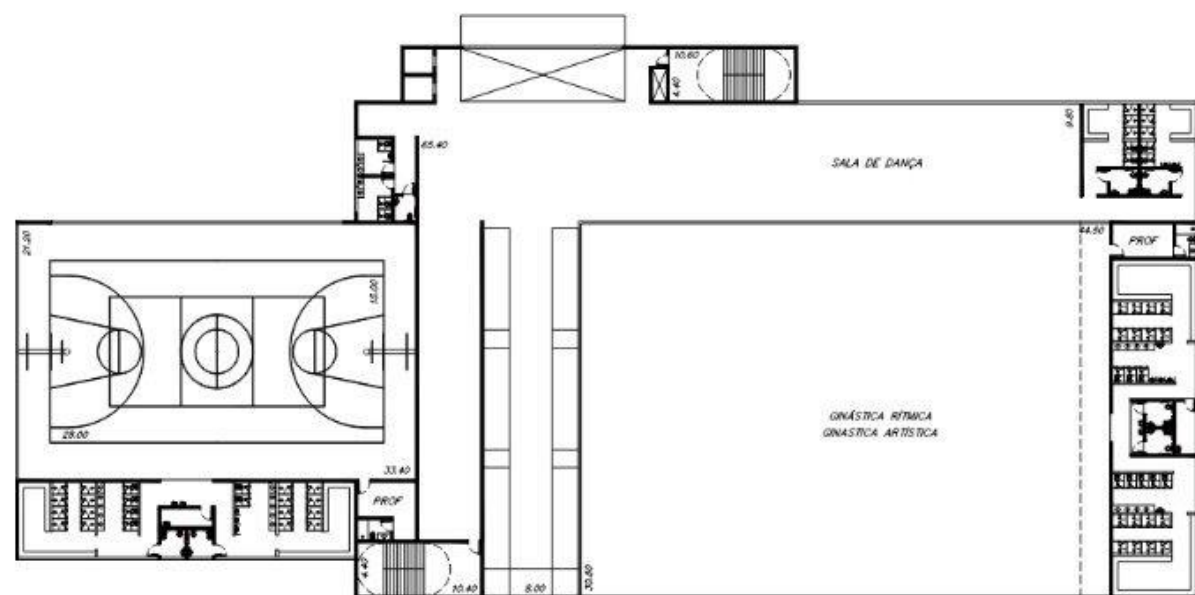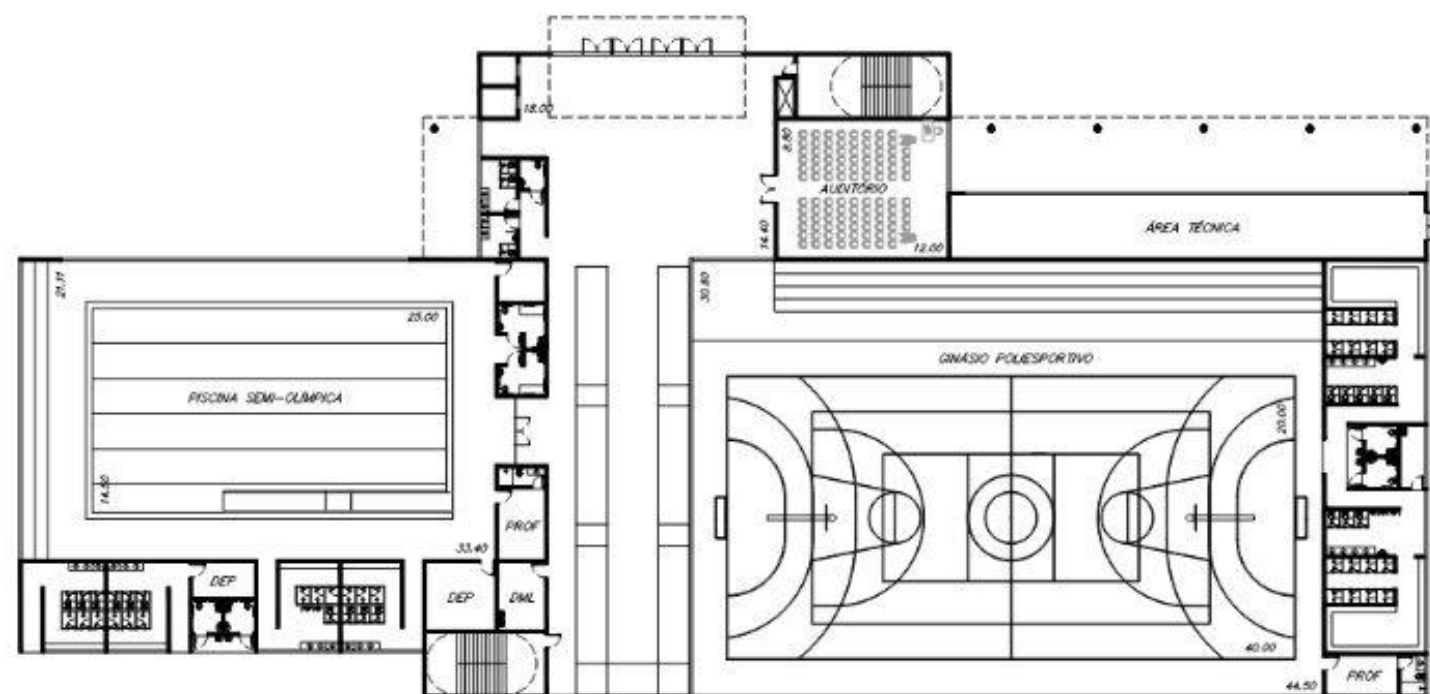

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 NOVEMBRO

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO Centro Esportivo Thomas Mazzoni

DESCRIÇÃO

Ação	Transformação (Reforma) do Centro Esportivo em Núcleo Olímpico Regional
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Praça Presidente Jânio da Silva Quadros 150
Situação	Reforma em andamento 85%
Processo Administrativo	6019.2022/0001881-6
Início da Obra	11/2022
Previsão de Término	05/2025
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim, Tesouro Municipal: R\$ 51.817.842,17

INVESTIMENTO 2024 R\$

Valor Aprovado	6.749.228,18	Res. 021/2024
Valor Empenhado	6.747.228,18	99,97%
Valor Pago	4.609.676,58	68,29%

VALORES RELATIVOS AO SISTEMA SOF EM 05/11/2024



PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 NOVEMBRO

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
ESPORTES E LAZER

OBJETO: Requalificação do Centro Esportivo Thomaz Mazzoni PERÍODO: 26/09/2024 à 29/10/2024



EXECUÇÃO DAS CANALETAS DE DRENAGEM DA PISTA DE ATLETISMO

OBJETO: Requalificação do Centro Esportivo Thomaz Mazzoni PERÍODO: 26/09/2024 à 29/10/2024



COMPACTAÇÃO DA SUBBASE DA PISTA DE ATLETISMO

OBJETO: Requalificação do Centro Esportivo Thomaz Mazzoni PERÍODO: 26/09/2024 à 29/10/2024



EXECUÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA (E PINTURA) DOS VESTIÁRIOS DOS GINÁSIOS DE HANDBALL E LUTAS

OBJETO: Requalificação do Centro Esportivo Thomaz Mazzoni PERÍODO: 26/09/2024 à 29/10/2024



CONCRETAGEM DA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO - VESTIÁRIO DAS QUADRAS EXTERNAS

OBJETO: Requalificação do Centro Esportivo Thomaz Mazzoni PERÍODO: 26/09/2024 à 29/10/2024



CONCRETAGEM DAS PAREDES DO BOWL - SKATEPARK

OBJETO: Requalificação do Centro Esportivo Thomaz Mazzoni PERÍODO: 26/09/2024 à 29/10/2024



EXECUÇÃO DE LAJE DE FUNDO DA PISCINA DO GINÁSIO AQUÁTICO

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 NOVEMBRO

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO Centro Esportivo Náutico Guarapiranga - Reforma

DESCRIÇÃO	
Ação	Transformação (Reforma) do Centro Esportivo em Núcleo Olímpico Regional
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. dos Funcionários Públicos, 2501 - Jardim Horizonte Azul
Situação	Em andamento – 50%
Processo Administrativo	6019.2023/0002964-0
Início da Obra	Nov/2023
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Usuários / metros quadrados construídos
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Não



INVESTIMENTO 2024 R\$		
Valor Aprovado	11.822.308,37	Res. 021/2024
Valor Empenhado	11.822.308,37	100%
Valor Pago	7.951.480,28	67,25%




VALORES RELATIVOS AO SISTEMA SOF EM 05/11/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024 NOVEMBRO

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZANTE NAS PISCINAS

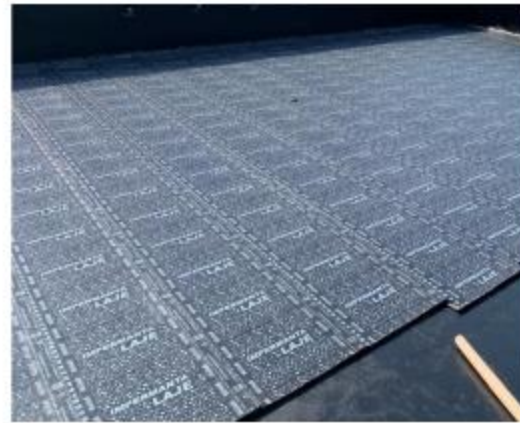

REPAROS EM PISCINA SEMI OLÍMPICA E PISCINAS DE RECREAÇÃO



CAMPO DE FUTEBOL



QUIOSQUE



REPAROS EM PISCINA SEMI OLÍMPICA E PISCINAS DE RECREAÇÃO



MURO DO QUIOSQUE

