

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FUNDURB

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

PROCESSO SEI: 6020.2023/0065744-1



CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Projeto São Miguel Paulista - obras	3.000.000,00	4.271.702,21	441.248,50	441.248,50	14,7%
Contratação de obras de segurança viária: (1) Via Segura - Estado	256.591,22	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: (2) Via Segura - Imperador	256.591,22	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: (3) Área Calma Centro - República	256.591,22	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: (4) Rua Completa Cidade Tiradentes	256.591,22	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: (5) Rua Completa Metalúrgicos	256.591,22	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: (6) Rua Completa Brasilândia / Casa Verde.	256.591,22	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: (1) Área Calma Centro Sé	549.481,81	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: (2) Rota Escolar Segura Itaquera	549.481,79	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obra de segurança viária: (3) Rota Escolar Segura São Rafael	549.481,79	0	0	0	0
Contratação de obra de segurança viária: (4) Rota Escolar Segura Pari	549.481,79	0	0	0	0
Contratação de obra de segurança viária: (5) Via Segura Belmira Marin	549.481,79	0	0	0	0
Contratação de obra de segurança viária: (6) Via Segura Estrada de Itapecerica	549.481,79	0	0	0	0
Contratação de obra de segurança viária: (7) Via Segura Marechal Tito	549.481,79	0	0	0	0
Contratação de obra de segurança viária: (8) Via Segura Teotônio Vilela	549.481,79	0	0	0	0
Contratação de obra de segurança viária: (9) Via Segura Raimundo Pereira de Magalhães	549.481,79	0	0	0	0
Contratação de obra Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência:(1) Barra Funda	1.039.205,51	0	0	0	0
Contratação de obra Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência:(2) Ipiranga	1.039.205,51	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obra Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência:(3) Marechal Deodoro	1.039.205,51	0	0	0	0
Contratação de obra Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência:(4) Vila Mariana / entorno da Linha Azul do Metrô	1.039.205,51	0	0	0	0
Contratação de obra Travessia Segura - 200 projetos de avanços de calçadas ou construção de ilhas de refúgios	1.039.205,51	0	0	0	0
Contratação de Projeto de segurança viária: (1) Via Segura - Estado	24.278,69	0	0	0	0
Contratação de Projeto de segurança viária: (2) Via Segura - Imperador	24.278,66	0	0	0	0
Contratação de Projeto de segurança viária: (3) Área Calma Centro - República	24.278,66	0	0	0	0
Contratação de Projeto de segurança viária: (4) Rua Completa Cidade Tiradentes	24.278,66	0	0	0	0
Contratação de Projeto de segurança viária: (5) Rua Completa Metalúrgicos	24.278,66	0	0	0	0
Contratação de Projeto de segurança viária: (6) Rua Completa Brasilândia / Casa Verde.	24.278,66	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de Projeto de segurança viária: (1) Área Calma Centro Sé	304.968,77	2.744.718,97	0,00	0,00	0
Contratação de Projeto de segurança viária: (2) Rota Escolar Segura Itaquera	304.968,77				0
Contratação de Projeto de segurança viária: (3) Rota Escolar Segura São Rafael	304.968,77				0
Contratação de Projeto de segurança viária: (4) Rota Escolar Segura Pari	304.968,77				0
Contratação de Projeto de segurança viária: (5) Via Segura Belmira Marin – Rodrigo Dias Paes Landim 11201722040 – AV. Orlando Malagoli	304.968,77				0
Contratação de Projeto de segurança viária: (6) Via Segura Estrada de Itapecerica	304.968,77				0
Contratação de Projeto de segurança viária: (7) Via Segura Marechal Tito	304.968,77				0
Contratação de Projeto de segurança viária: (8) Via Segura Teotônio Vilela	304.968,77				0
Contratação de Projeto de segurança viária: (9) Via Segura Raimundo Pereira de Magalhães	304.968,77				0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de Projeto Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência:(1) Barra Funda	1.110.821,86	5.554.109,30	3.256.937,83	3.256.937,83	58%
Contratação de Projeto Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência:(2) Ipiranga	1.110.821,86				
Contratação de Projeto Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência:(3) Marechal Deodoro	1.110.821,86				
Contratação de Projeto Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência:(4) Vila Mariana / entorno da Linha Azul do Metrô	1.110.821,86				
Contratação de Projeto Travessia Segura - 200 projetos de avanços de calçadas ou construção de ilhas de refúgios	1.110.821,86				
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Nova dos Portugueses	100.547,77	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Diogo Cabrera	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Eng. Caetano Alves	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dep. Emílio Carlos	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dep. Emílio Carlos 2	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dep. Emilio Carlos 3	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Av. Gaspar Vaz	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Maria Amália	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Rua dos Mártires	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Jardim Japão	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa E.R. João Ventura	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Gastão Madeira	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa E.R. São Quirino	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Caspitrano de Abreu	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Barão de Limeira	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dr. Arnaldo	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Guaipá	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Guaianases – Rodrigo Dias Paes Landim 11201722040	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Cajaíba	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Caiubi	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dep. Cantidio Sampaio	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dep. Cantidio Sampaio 2	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Otaviano Alves	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Encruzilhada do Sul	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Sete Barras	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Willian Speers	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Agenor Couto	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Paula Ferreira	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Caludio Sbrighi	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Euclides da Cunha	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Canhoba	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Mogeiro	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Barreira Grande	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Trocari	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Jose Zappi	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Costa Barros	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Morais Costa	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Paulo Colombo	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Monte Serrat	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dr. Almeida Lima	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Satellite	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Forte do Leme	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Acurui	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Cel. João de O. Mello	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Itamambuca	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Centenário	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Augustin Luberti	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Vilanova Artigas	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Franciso Falconi	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Av Zelina	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Guilherme Giorgi	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Acurui 2	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Gautapará	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Morais Costa	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Bosque da Saúde	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Vd Saioá	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Nelson Fernandes	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Mesquita	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Av. do Café	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Leonardo Da Vinci	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Jequitibás	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Pref. Fabio Prado	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Diederichsen	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Eduardo Amaro	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Leo de Moraes	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Ourives	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa N. Sra. Das Mercês	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dr. Nicolau de Sousa Queiros	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Pedro Alves Cabral	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Sena Madureira	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Senador Casimiro da Rocha	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dr. Altino Arantes	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Luis Gois	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Pitangueiras Japós	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Azevedo de Macedo	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Humberto I	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Iv Centenário	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Iv Centenário 2	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Alvaro Alvim	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Eng. George Corbisier	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Av. Santa Catarina	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Av. Dr. Lino de Moraes Leme	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Interlagos	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Nyara	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Prof. Adib Casseb	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Interlagos 2	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Interlagos 3	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Sergio Miliet	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Av. Sen Teotônio Vilela	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Giovani Bonancini	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Estr.Eng. Marsilac	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Rua da Paz	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Americo Brasiliense	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Portugal	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Joaquim Nabuco	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Clementine Brenne	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dep. João Sussumu Hirata	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dep. João Sussumu Hirata 2	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dr. Fritz Martin	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Colégio Pio XII	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa João Carlos da Silva Borges	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Barão de Campos Gerais	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Verbo Divino	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Coronel Luis Barroso	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Rugero Fazano	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Duquesa de Goias	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Comendador Elias Zarzur	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Conde de Itu	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Alexandre Dumas	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa São Benedito	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Cancioneiro Popular	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Visconde de Porto Seguro	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Jose dos Santos Junior	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Guilherme Asbahr Neto	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Joaquim Candido de Azevedo Marques	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Rodrigues Paes	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Barão de Melgaço	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Clarindo	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Antonio das Chagas	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Albert Eistein	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Prom. Gabriel Netuze Peres	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Sansão Alves dos Santos	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Itapaiuna	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Itapaiuna 2	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Inácio de Araújo	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Pça Jaguamitanga	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dr. Edgard Garcia Vieira	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Av. dos Metalurgicos	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Bahia	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa João Guimarães Rosa	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa João Guimarães Rosa 2	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Gravataí	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Caio Prado	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Conselheiro Brotero	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Jaguaribe	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Imaculada Conceição	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa São Vicente de Paula	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Higienópolis	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Itambé	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Frei Caneca	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Cesário Motta Jr	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Jaguaribe 2	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Bela Cintra	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Pedroso de Moraes	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Pedroso de Moraes 2	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa João Moura	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Al. Jaú	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Dr Eneas Carvalho de Aguiar	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Angelina Maffei Vita	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Rebouças	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Pe. João Manuel	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Antônio Mariani	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Candido Fontoura	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Eng Bianor	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Carlos Lacerda	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Cantos do Amanhecer	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Prudêncio do Amaral	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Valter Airosa Flaquer	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Jorge João Saad	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Prof. Arruda Botelho	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Frederico Herman Jr.	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Pedroso de Moraes 3	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Pça Benedito Calixto	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Gilberto Sabino	100.547,49	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Lombofaixa Gilberto Sabino 2	100.547,49	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Eleonora Cintra	129.159,83	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Pe. Lebret	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Eng. Heitor Antônio Eiras Garcia	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado José Ramon Urtiza	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Dom Rodrigo Sanche	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Luiz Magliano	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Sen. Teotônio Vilela	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Grande São Paulo	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Dona Belmira Marin	129.159,62	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Isabel de Siqueira Barros	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Cupecê	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Nascer do Sol	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Caiçara do Rio do Vento	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado São Feliciano	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Hipólito de Camargo	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Saioá	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Gonçalves Ledo	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Silva Teles	129.159,62	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Américo Salvador Novelli	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Maria Luiza Americano	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Nelson Fernandes	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Cel. Sezefredo Fagundes	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Monte Alegre	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Rua Cenno Sbrighi	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Inácio Dias da Silva	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Tuiuti	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Tuiuti 2	129.159,62	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Estr. Eco Turística de Parelheiros	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Comendador Cantinho	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Pe. Manuel Campello	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado FerSim Dias	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Pedroso de Moraes	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Pedro de Moraes 2	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Paulistania	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Pinheiros	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Av. Benedito Andrade	129.159,62	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Castro Maia	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Barão do Rio Branco	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Adolfo Pinheiro	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Sapopemba	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Mal.Tito	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Sapopemba 2	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Vitorino Carmilho	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Boracéa	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Cantareira	129.159,62	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Cesário Mota	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Dona Veridiana	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Dr. Albuquerque Lins	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Itambé	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Dona Veridiana 2	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Dona Veridiana 3	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Bela Cintra	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Dona Veridiana 4	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Dr. Albuquerque Lins 2	129.159,62	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Canuto do Val	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Dr. Veiga Filho	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Dr Veiga Filho 2	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Maranhão	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Itambé 2	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Pça Pereira Coutinho	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Curuçá	129.159,62	0	0	0	0
Contratação de obras de segurança viária: Cruzamento elevado Cap. Pacheco e Chaves	129.159,62	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Aclimação	174.136,32	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Atlântica/ Olívia Guedes Penteado	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Av. Atlântica	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Av. Teotônio Vilela	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Bosque Da Saúde (Praça Da Árvore)	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Carlos Pinto Alves	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Interlagos Trecho 2	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Emérico Richter - Mar Paulista	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Estado De Israel	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Estr. Ecoturística De Parelheiros	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Estr. Engenheiro Marsilac	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Estrada Do Cipo	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Fagundes Filho	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Frederico Rene De Jaegher	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Independência	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Jaceguava	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias João De Luca-cupecê	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias José Queiroz Aranha	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Lavapés	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Leandro Dupret	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ligação Gonçalo Soares - Teotônio Vilela	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Lino De Moraes	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Lins De Vasconcelos	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Lourenço Cabreira - Manuel Alves Soares	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Major Maragliano - Cel Lisboa	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Muniz De Souza-francisco Justino De Azevedo	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Piratinins/Aratas	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Quarto Centenário	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias R Ipiranga	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias República Do Líbano/Manoel Da Nóbrega	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias São Paulo Expo - Terminal Jabaquara	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Tamoios	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Topázio	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Turmalina	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Abel Ferreira (Entre Prof Sérgio Buarque De Hollanda E Montemagno)	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Al. 1º SARG. Basílio Nogueira Da Costa	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Americo Brasiliense	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Amparo - Pindamonhangaba - Francisco Mesquita	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Antonio Alves Barril	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Antônio De Macedo Soares / Al. Maracatins / Imarés	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Araguari	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Aratãs – Anapurus	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Augustin Luberti	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Av Ipiranga	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Brasil	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Butantã-teodoro Sampaio	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Camargo	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Cancioneiro - Bela Vista - Est Borba Gato	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Cantareira	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Cap Mor Pero De Gois-av. Egídio Martins-Av. Francisco Vieira Bueno	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Circular Do Bosque	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclovias Cruzeiro Do Sul	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclovias Darzan	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclovias Estado - Trecho II	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Eugênio De Medeiros	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Fazenda Do Carmo	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Fco Mesquita/São Raimundo	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Francisco Vieira Bueno / Pça. Frei Leandro Do Sacramento	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Haroldo Veloso - Henrique Chamma	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Itaquera – Lider	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa João Moura	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa João Teodoro	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Ligação Consolação - Rebouças	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Ligação Reboucinhas-faria Lima	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Manifesto/ Tabor	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Natingui-Corujas-Rosalvo-Nazaré Paulista	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Padre Marchetti	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Patriarca	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Piauí	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Presidente Wilson	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa R. Capote Valente	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa R. Do Horto (Até Pq. Horto)	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Romão Gomes	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa São Quirino	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclovias Sen. Queiroz	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Silva Bueno	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Vicente Rao	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclovias Abraão Ribeiro Vd. Pacaembu-av. Pacaembu	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Águia De Haia	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Anastácio	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Arnolfo Azevedo	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
CConstrução de Ciclovias Ciclofaixa Av Dos Metalurgicos	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Av. Dr. Sylvio De Campos	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Av. Pompeia-americo Jacomino- estação Vila Madalena Do Metro	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Campanella	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclovias Cardeal Mota	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Carlos Vicari-r. Guaicurus-melvin Jones	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Carlos Weber	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclovias Comendador Feiz Zarzur	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Curtume	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Diogo Ortiz – Mercedes	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Eduardo Prado	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclovias Eduardo Sabino	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Esperantina	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclovias Estrada De Perus	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Gago Coutinho/D. João V/John Harrison/R. Dronsfield/Martim Tenório/Cincinato Pamponet	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa João José De Queiroz-severo-aricá Mirim	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa João Tibiriçá - Barão De Itaúna – Belmonte	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Joaquim Oliveira Freitas	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Leopoldina	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Maciel Monteiro	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Major Otaviano - Cajuru - Herval - Rey Cajado – Catiguá	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa N. Sra. Do Ó	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Novo Oriente Do Piauí	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Olavo Egídio De Souza Aranha	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Pacheco E Silva	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Padre Aníbal De Francia- Ademar Martins De Freitas	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Raimundo Pereira De Magalhaes	174.135,89	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Rio Branco	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Salomão Vasconcelos	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Santa Rita	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Sumaré-Paulo VI (Alteração De Tipologia)	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Turiassu	174.135,89	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ciclofaixa Viaduto Itinguçu - Julio Sayago	266.666,67	633.735,74	0	0	9,52%
Construção de Ciclovias Ciclovias Nagib Farah Maluf	266.666,67				
Construção de Ciclovias Ciclovias João Batista Conti	266.666,67				
Construção de Ciclovias Ciclovias Jacu Pêssego 2 (Laranja Da China)	266.666,67				

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Raimundo Pereira De Magalhães - Miguel De Castro - Cabo Adão Pereira - Manuel Barbosa	266.666,67	1.192.590,37	380.870,83	380.870,83	9,52%
Construção de Ciclovias Ponte Jaguaré	266.666,67				
Construção de Ciclovias Praça Campo De Bagatelle	266.666,67				
Construção de Ciclovias Abraão Ribeiro	266.666,67				
Construção de Ciclovias Ponte Da Freguesia Do Ó - Comendador Martineli	266.666,67				
Construção de Ciclovias Alvarenga	266.666,67				
Construção de Ciclovias Mutinga	266.666,67				
Construção de Ciclovias Ordem E Progresso - Pte Do Limão	266.666,67				
Construção de Ciclovias Armando Arruda Pereira	266.666,67				

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Carlos Caldeira	266.666,67	1.048.848,94	0	0	9,52%
Construção de Ciclovias Radial Leste	266.666,67				
Construção de Ciclovias Cipriano Barata	1.226.180,68	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Antonio Carlos Da Fonseca	5.271.384,45	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Dom Macario	3.918.887,25	0	0	0	0
Construção de Ciclovias José dos Reis	1.512.991,47	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Viaduto Gd São Paulo	3.711.168,11	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Salvador Simões	1.786.948,37	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Manifesto	1.171.718,83	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Cisplatina	1.858.760,31	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Nossa Sra. Da Saúde	569.040,56	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Amparo	1.058.745,21	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Bandeirantes	19.346.143,94	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Abraão de Moraes	5.959.220,82	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Astarte	511.982,02	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Carlos de Campos	759.555,11	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Apucarana	1.594.026,24	0	0	0	0
Construção de Ciclovias João Boemer	2.374.346,03	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Airton Pretini	2.403.789,31	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Aricanduva	2.313.338,95	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Adhemar Pereira de Barros	2.045.304,56	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Capitão Pacheco Chaves	3.883.418,03	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Pte. Tatuapé	2.569.665,43	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Ribeiro de Lima	1.331.462,47	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Estado	6.605.737,66	0	0	0	0
Construção de Ciclovias A. Salim F. Maluf	11.853.226,22	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Maria Cândida	2.031.694,18	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias José Maria Fernandes	3.551.421,75	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Av. Guilherme	1.116.974,84	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Alberto Byington	4.249.844,83	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Amaro F. da Silveira	4.462.699,80	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Jardim Japão	1.751.232,24	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Gueixas	1.228.116,90	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Maria José B. Fernandes	4.170.422,09	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Conceição	1.898.920,11	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Roland Garros	2.130.643,85	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Rua Camargo	1.199.977,30	0	0	0	0
Construção de Ciclovias R.Gal.Asdrúbal da Cunha	441.954,19	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Rua Adherbal Stresser	292.923,67	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Sapetuba	1.604.791,95	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Rua Waldemar Roberto	671.063,73	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Santa Marina	894.699,17	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Queiroz Filho	3.941.501,50	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Imperatriz Leopoldina	224.348,39	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Major Paladino	809.806,53	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Gastão Vidigal – Mergenthaler	598.347,67	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Potsdam	1.378.979,34	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Viaduto da Lapa	2.780.007,21	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Dronsfield	2.410.038,22	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Guaipá	2.212.529,19	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Duarte de Azevedo	383.711,85	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Manuel Gaya	188.639,13	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Antonio Cesar Neto	1.991.217,00	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Benjamin Pereira	3.453.120,10	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

Valores em [R\$]




**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SECRETARIA

OBJETO	APROVADO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	PAGO/ APROVADO (%)
Construção de Ciclovias Virgília Rodrigues Alves C. Pinto	2.795.319,84	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Santa Inês	3.865.056,36	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Av. Capitão José Parada Gonçalves	1.855.053,65	0	0	0	0
Construção de Ciclovias Maria Amália Lopes de Azevedo	10.875.243,50	0	0	0	0

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

MAPA DAS INTERVENÇÕES

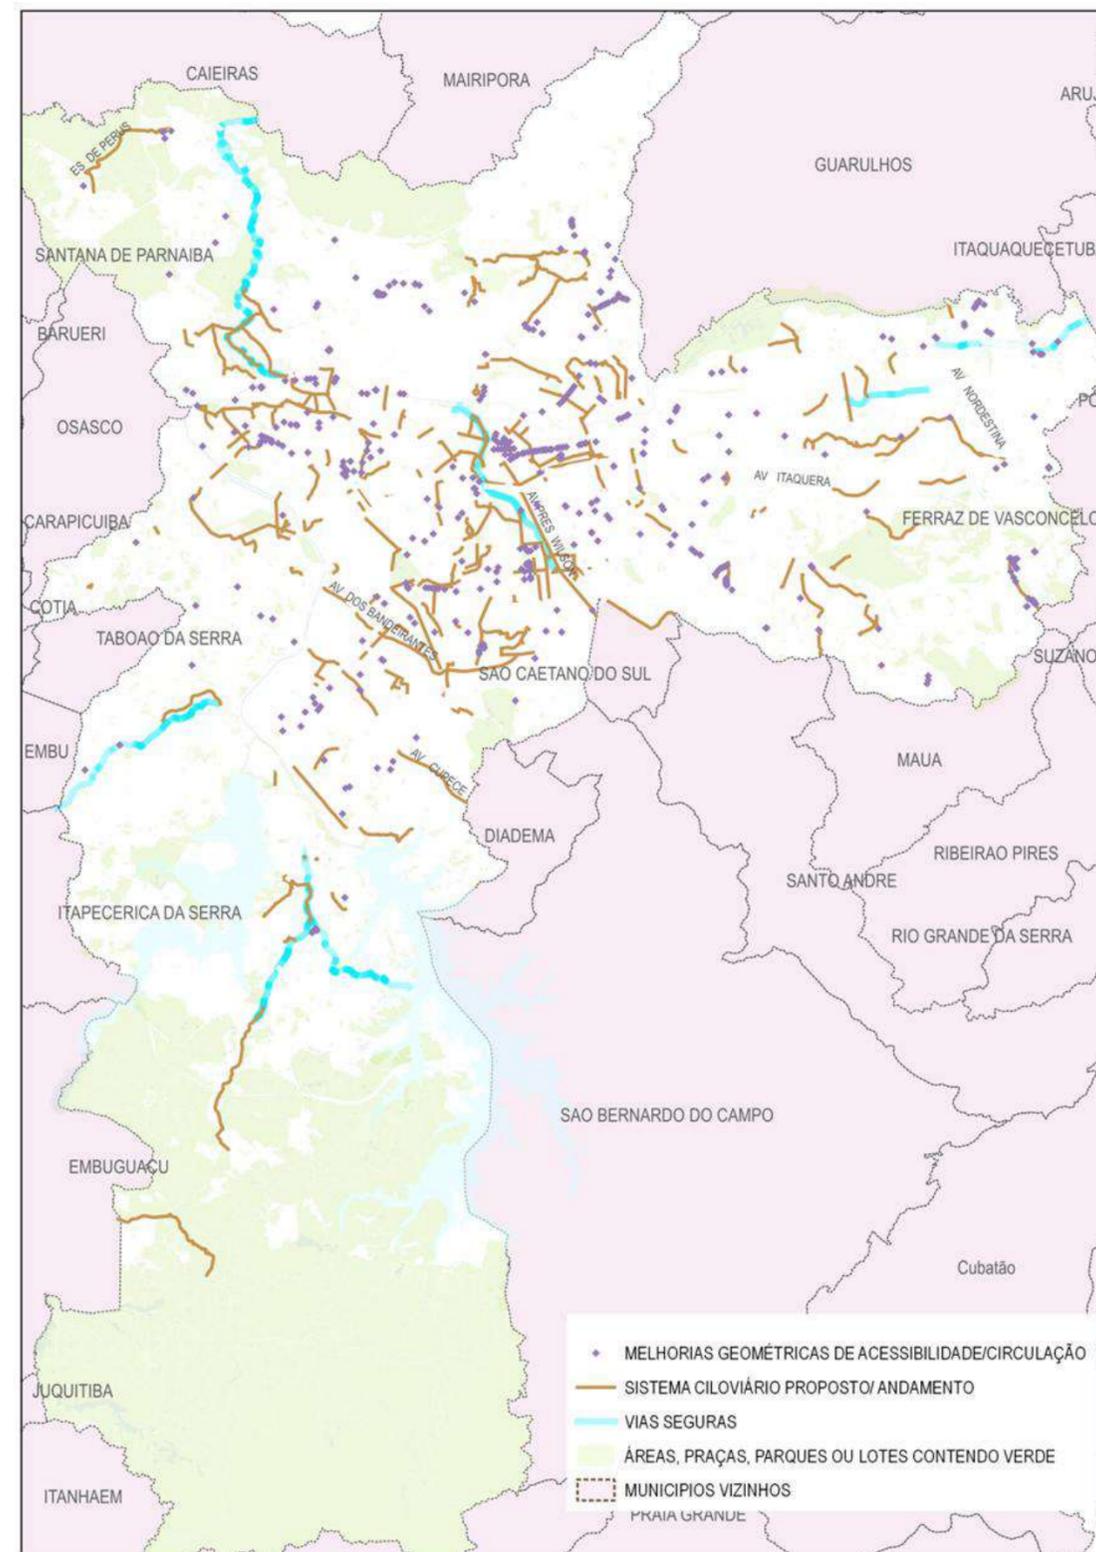

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Obras Área Calma de São Miguel (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Obras de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Praça Padre Aleixo Monteiro Mafra; Av. Nordeste; Av. Guilherme Eiras; Av. Marechal Tito; R. Arlindo Colaço; Rua Salvador de Medeiros/ São Miguel Paulista
Situação	Em andamento - 40% concluído
Processo Administrativo	6020.2020/0006536-0
Início da Obra	Mar/2023
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Ago/2022*

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 3.000.000,00	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ R\$ 4.271.702,21	
Valor Pago	R\$ 441.248,50	



*Foto em Execução
Jan/2024.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Obras Área Calma de São Miguel (**MOB**)



*Local Av. Marechal Tito
Foto em Execução
Jan/2024.*



*Local . José P. de Carvalho
Foto em Execução
Mar/2022.*



*Local Av. Marechal Tito,256
Foto em Execução
Mar/2022.*



*Local Av. Nordestina, 185
Foto em Execução
Mar/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: (1) Via Segura - Estado (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. do Estado/ Sé, Mooca e Ipiranga
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021.0046437-2
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Dez/2023
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



Foto antes da Intervenção.
Ago/2022

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 24.278,69	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0	0
Valor Pago	R\$0	0


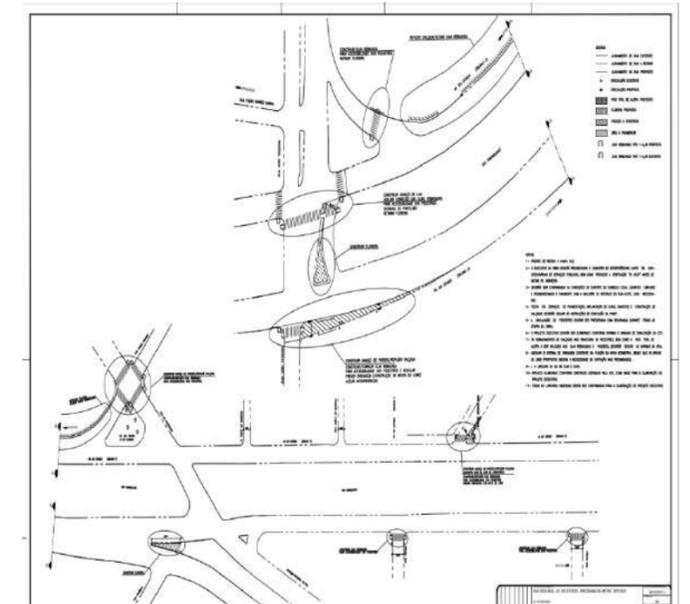


Foto Projeto Funcional
Jun/2021.


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Via Segura – Estado (MOB)

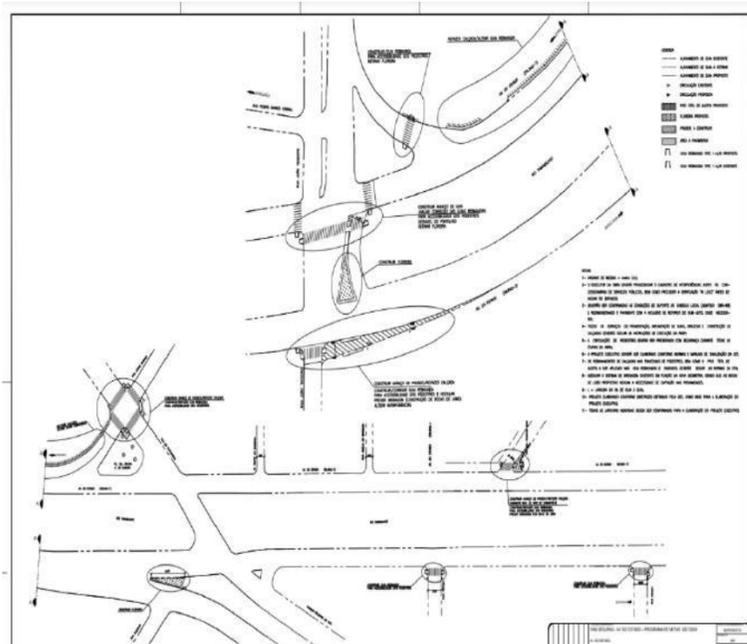


Local Av.do Estado
Foto Projeto Funcional
Jun/2021

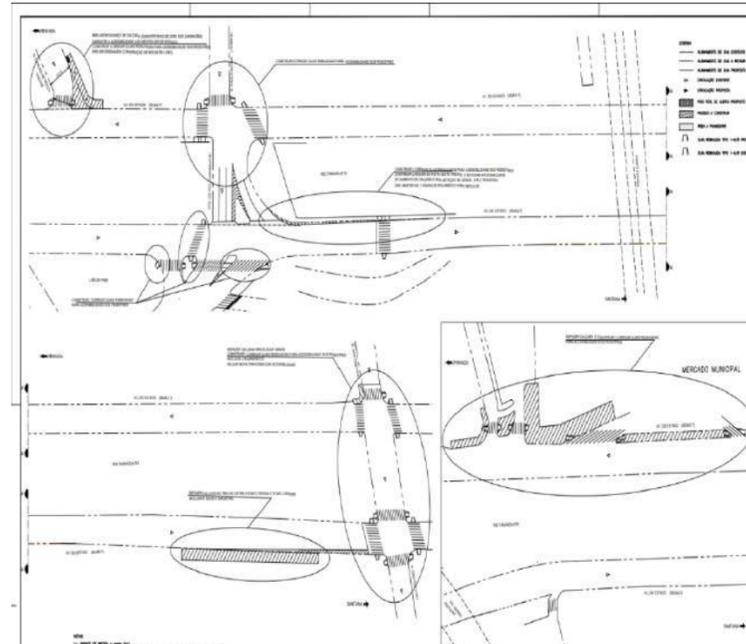

Local Av. do Estado
Foto Projeto Funcional
Jun/2021

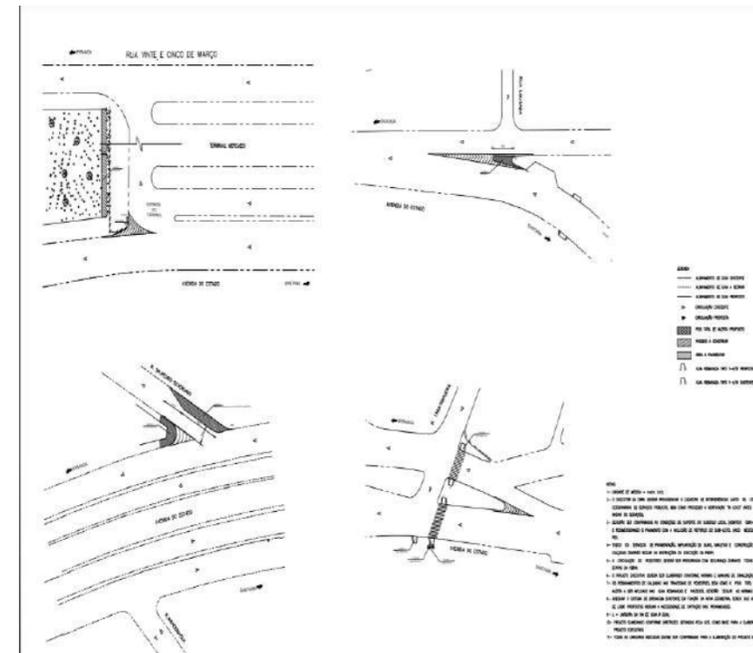

Local Av.do Estado
Foto Projeto Funcional
Jun/2021.

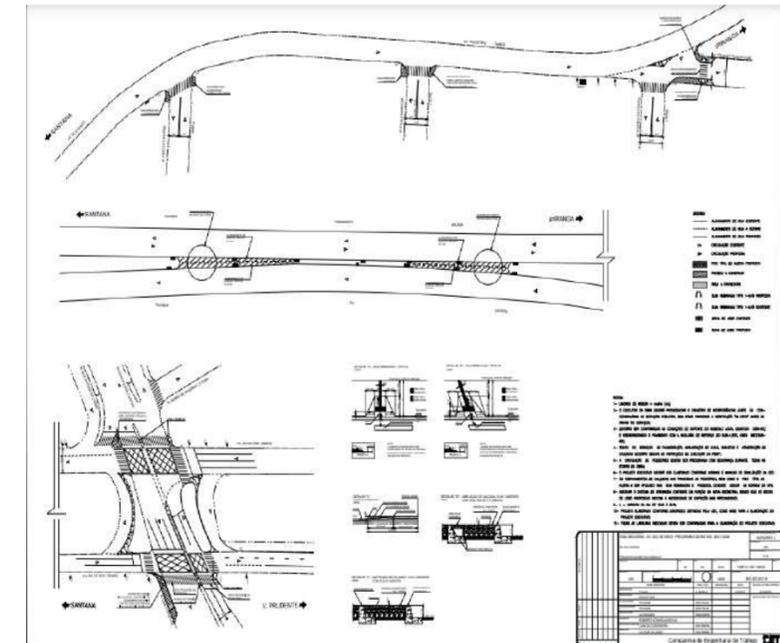

Local Av. do Estado
Foto Projeto Funcional
Jun/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Via Segura - Imperador (**MOB**)


DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. do Imperador/ São Miguel e Itaquera
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021.0046437-2
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Dez/2023
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Abr/2024*


INVESTIMENTO 2024

Valor Aprovado	R\$ 24.278,69	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0	0
Valor Pago	R\$0	0

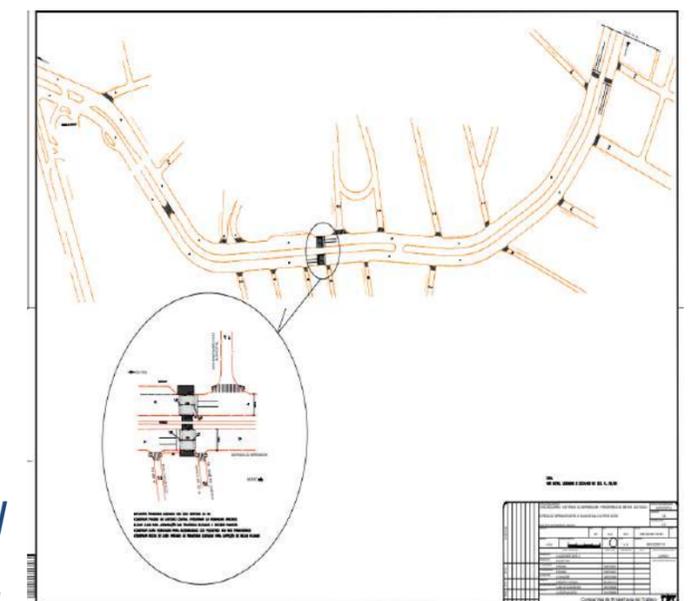


*Foto Projeto Funcional
Jun/2021.*


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Via Segura – Imperador (**MOB**)

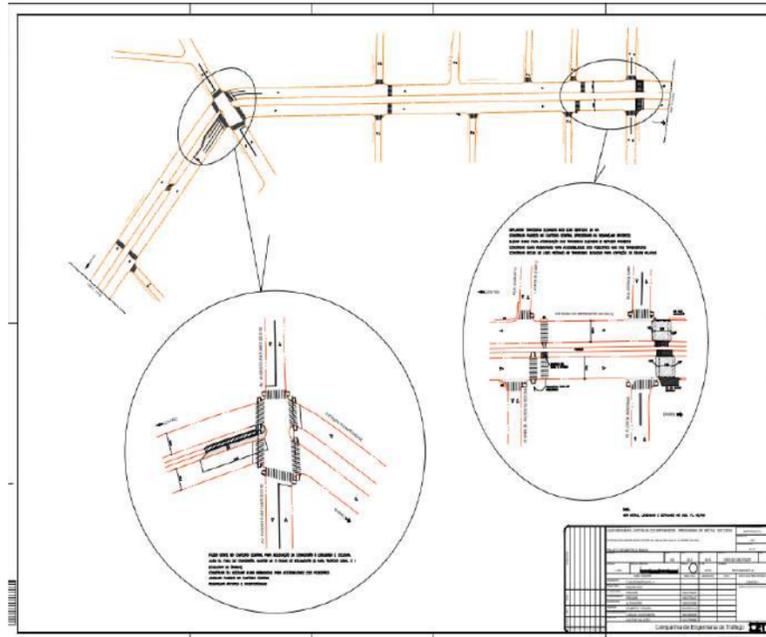


Local Av .Imperador
Foto Projeto Funcional
Jun/2021

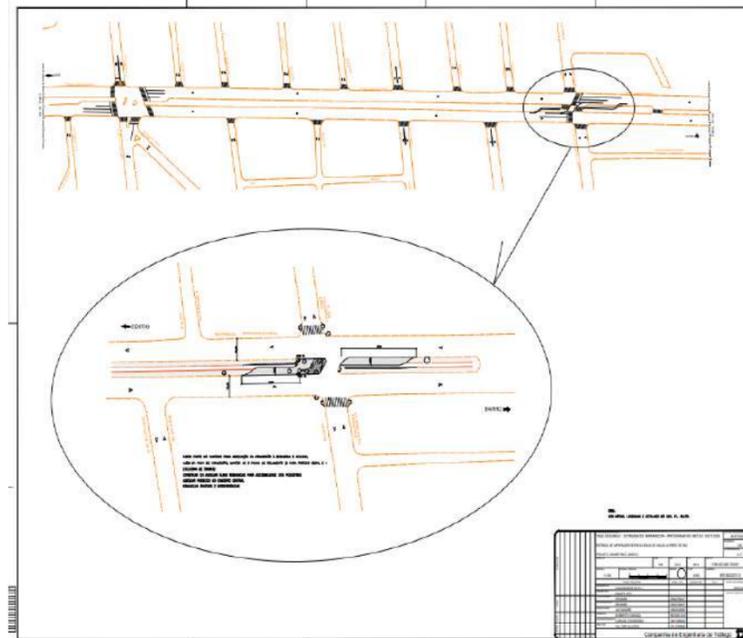

Local . Av. Imperador
Foto Projeto Funcional
Jun/2021.

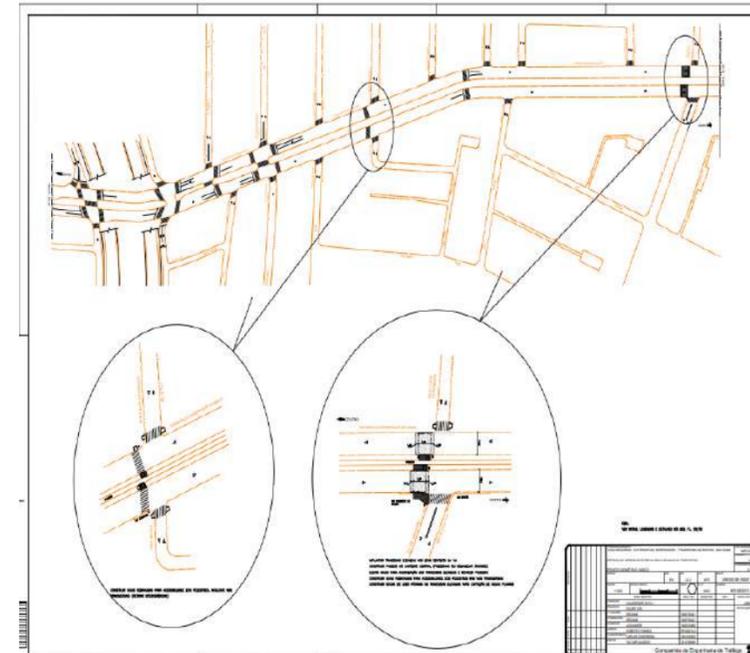

Local Av.Imperador
Foto Projeto Funcional
Jun/2021.

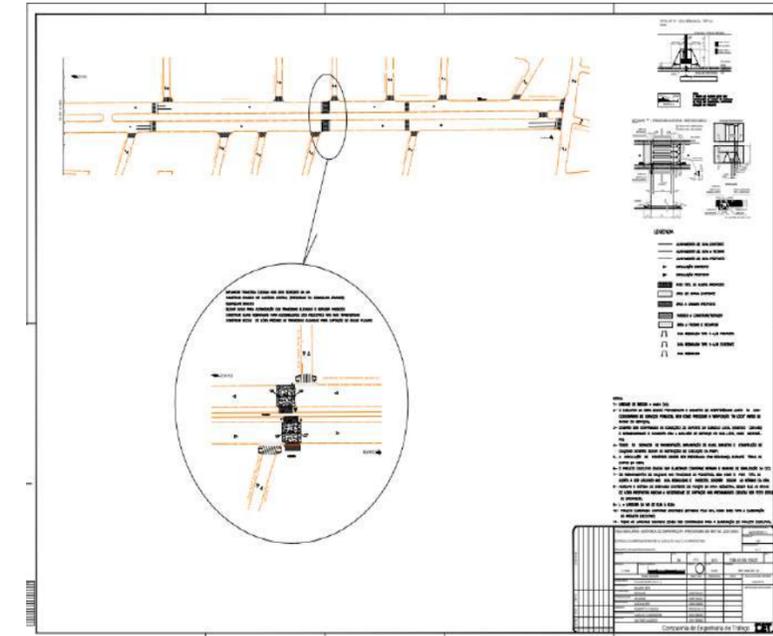

Local Av. Imperador
Foto Projeto Funcional
Jun2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Área Calma Centro - República (MOB)


DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Ipiranga, R.da Consolação, Av. Senador Queiroz, Vd. Dona Paulina e o vale do Anahngabaú/Sé
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021.0046437-2
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Dez/2023
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Jan/2024*

INVESTIMENTO 2024

Valor Aprovado	R\$ 24.278,69	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0	0
Valor Pago	R\$0	0

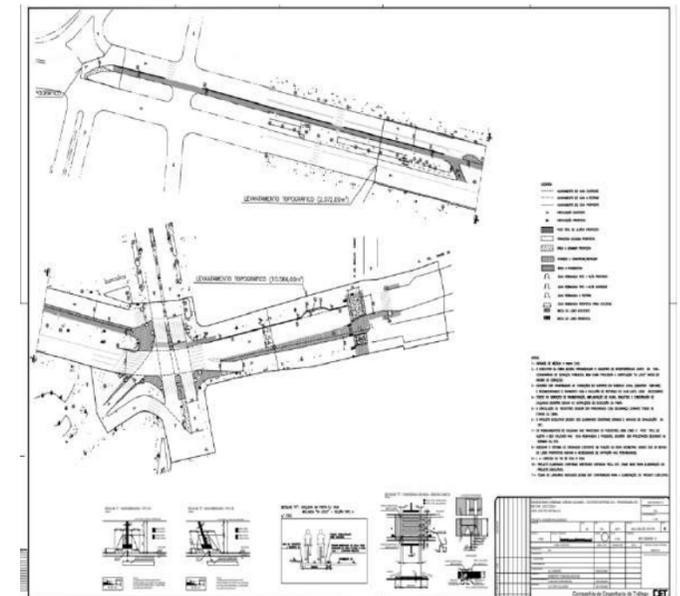


*Foto Projeto Funcional
Jun/2021.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Via Segura – República (**MOB**)

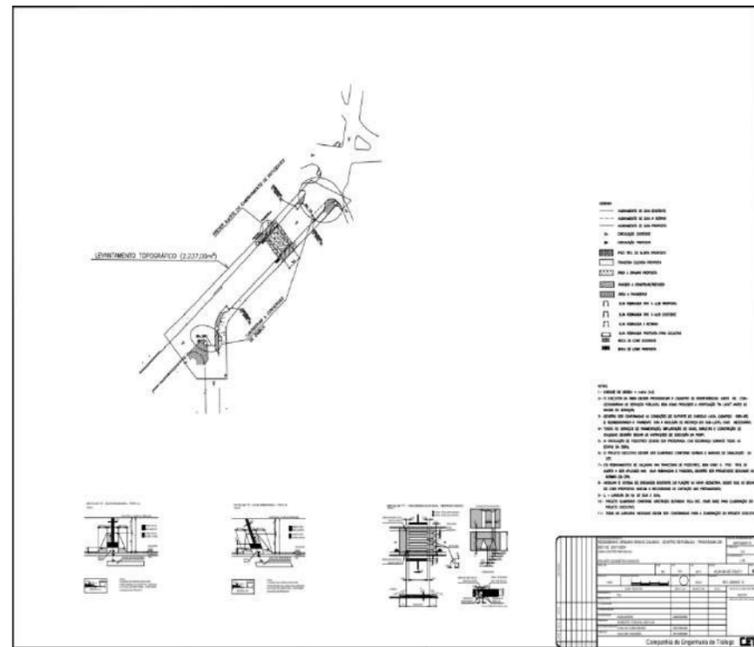


Local Rua Santo Amaro
Foto Projeto Funcional
Jun/2021

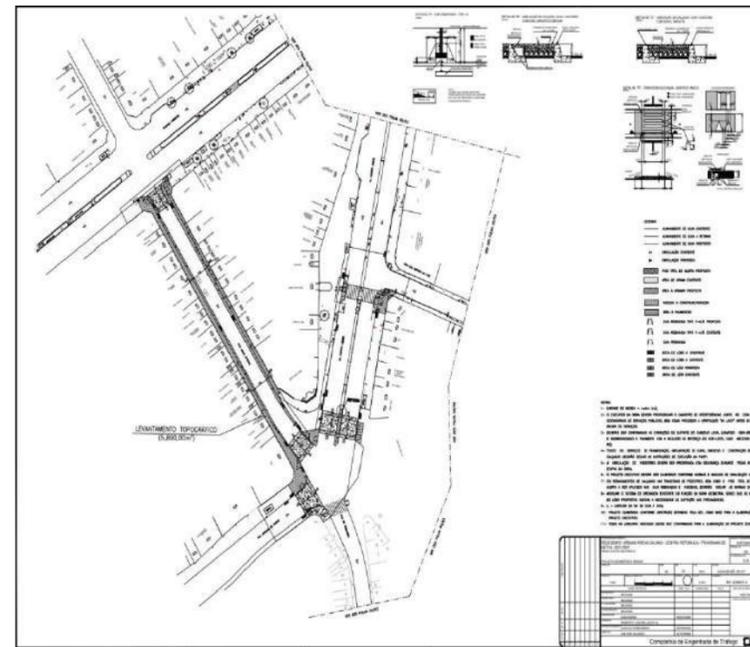

Local . Rua Santa Ifigênia
Foto Projeto Funcional
Jun/2021.

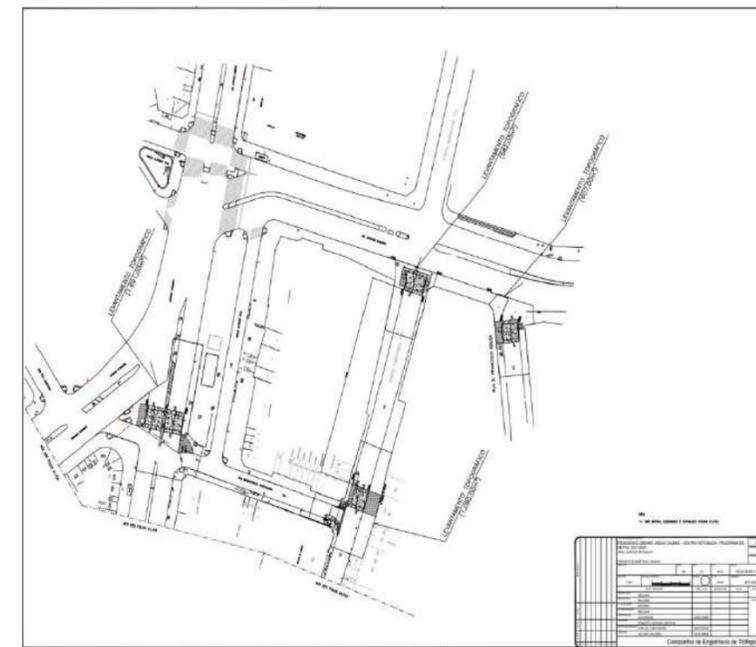

Local Av. Senador Queiroz
Foto Projeto Funcional
Jul/2021.

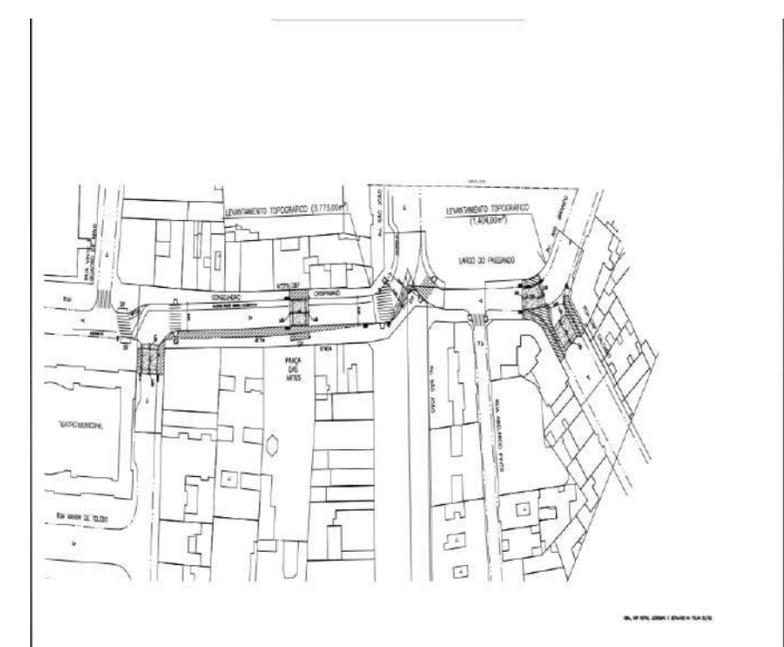

Local Av. São João
Foto Projeto Funcional
Jul/2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rua Completa Cidade Tiradentes (**MOB**)


DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Souza Ramos, Av. Naylor de Oliveira, Rua Milagre dos Peixes, Rua Arroio Arapongas, Rua Barão Dinis de Samuel, Rua Cavaleiro de Jorge e Rua Sara Kubitschek/ Cidade Tiradentes
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021.0046437-2
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Dez/2023
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Out/2022*

INVESTIMENTO 2024

Valor Aprovado	R\$ 24.278,69	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0	0
Valor Pago	R\$0	0

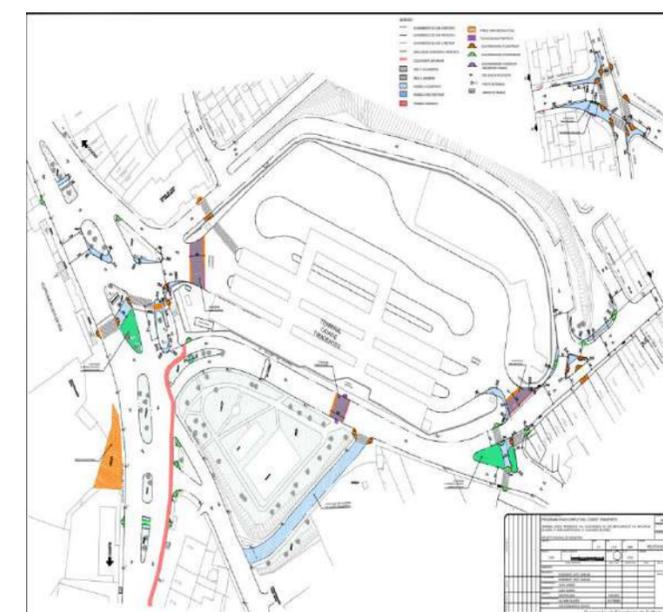


*Foto Projeto Funcional
Ago/2021.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rua Completa Cidade Tiradentes (MOB)

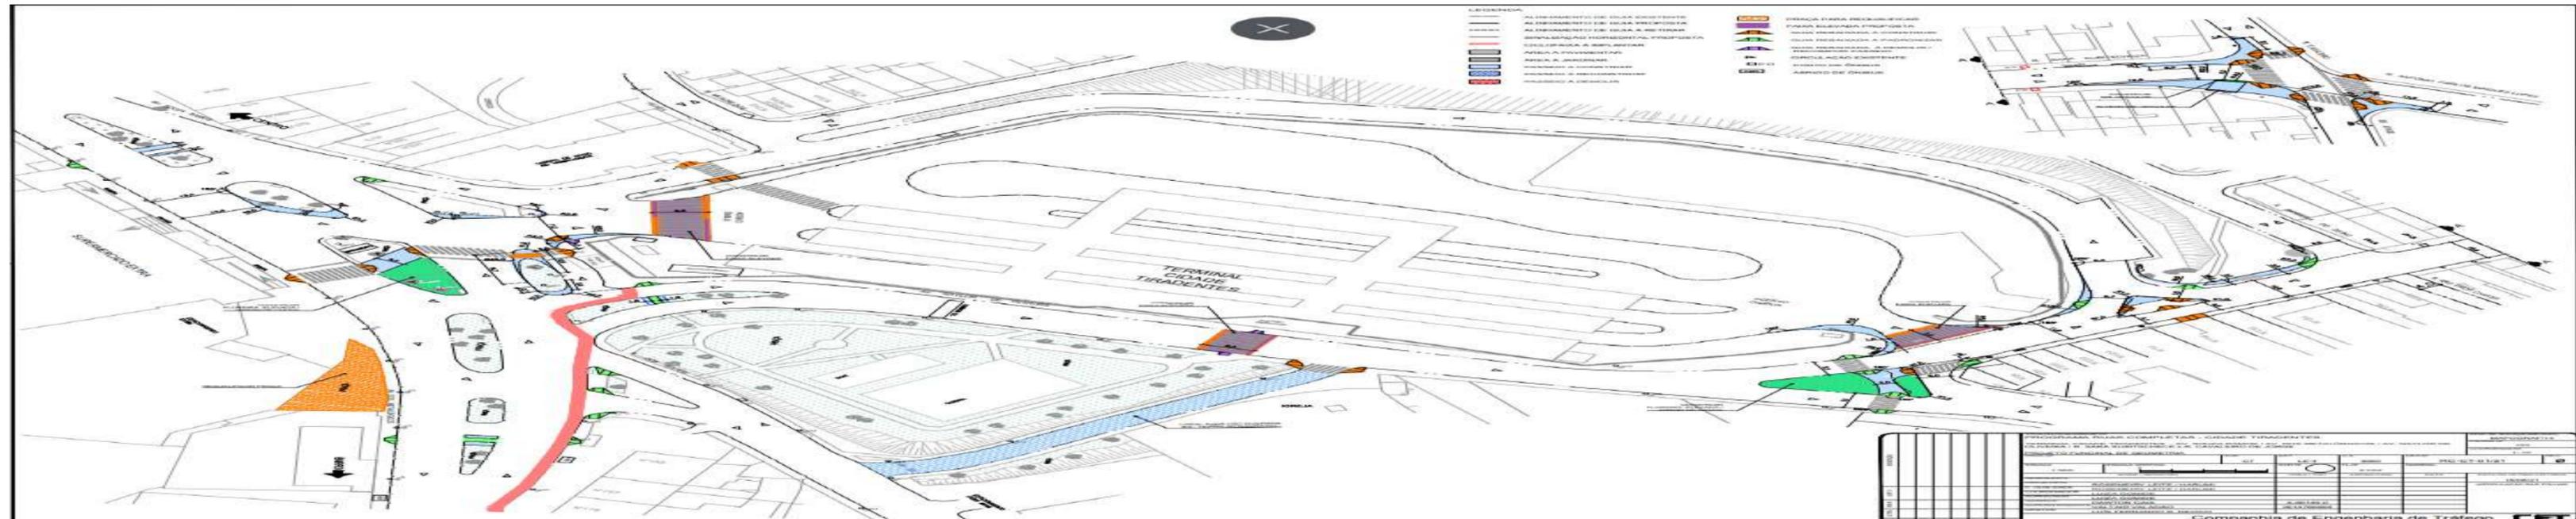

*Local Terminal Cidade
Tiradentes
Foto Projeto Funcional
Ago/2021.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rua Completa Metalúrgicos (**MOB**)


DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Metalúrgicos, Av. Leandro, Rua Luís Jorge da Costa, Rua Rei Davi, Rua dos Pedreiros e Rua Francisco José Viana./ Cidade Tiradentes
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021.0046437-2
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Dez/2023
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Mai/2022*

INVESTIMENTO 2024

Valor Aprovado	R\$ 24.278,69	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0	0
Valor Pago	R\$ 0	0

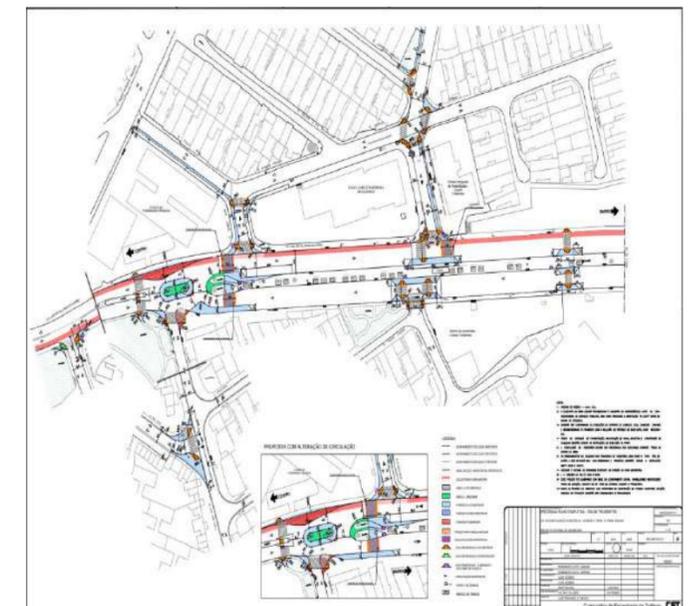


*Foto Projeto Funcional
Ago/2021.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL/FINAL 20XX

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rua Completa Metalúrgicos (**MOB**)

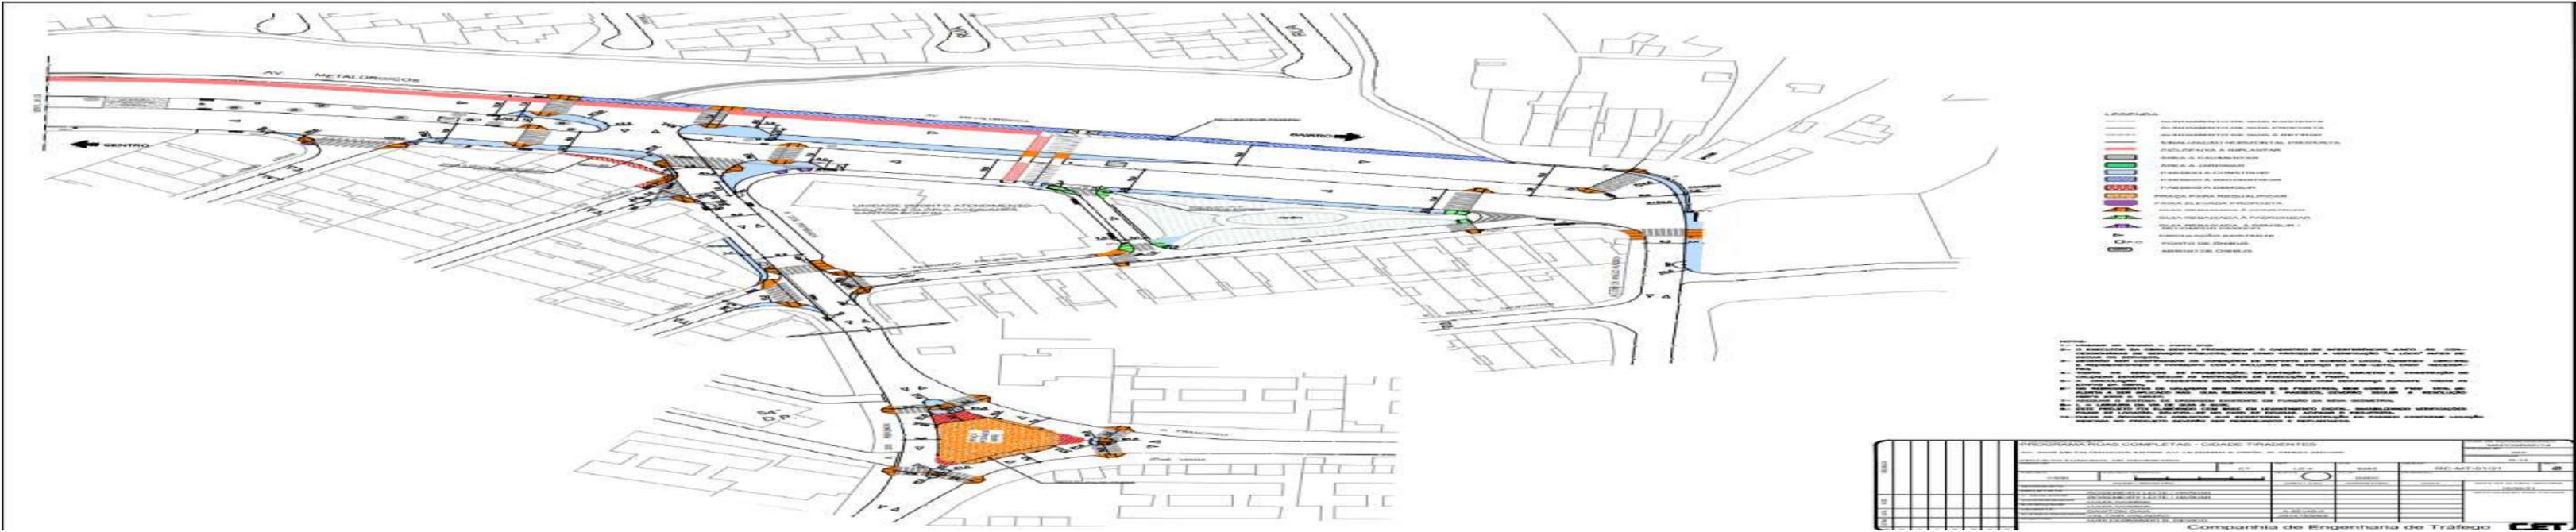


Local Av. dos Metalurgicos
Foto Projeto Funcional
Ago/2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rua Completa Brasilândia/Casa Verde (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Itaberaba, Praça Manoel da Costa Negreiros (Largo do Japonês), Rua Marina Lemos de Abreu, Av. Deputado Cantídio Sampaio, Av. Inajar de Souza, Rua Francisco Calado, Rua Adolfo Kurt Boehm, Rua Julião Ferreira e Rua Félix Alves Pereira/ Freguesia-Brasilândia
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021.0046437-2
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Dez/2023
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

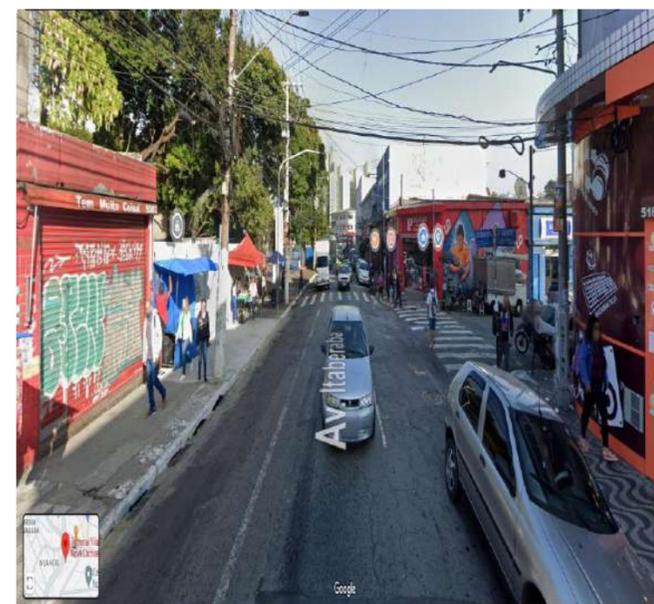

*Foto antes da Intervenção.
Jun/2023*

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 24.278,69	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0	0
Valor Pago	R\$0	0

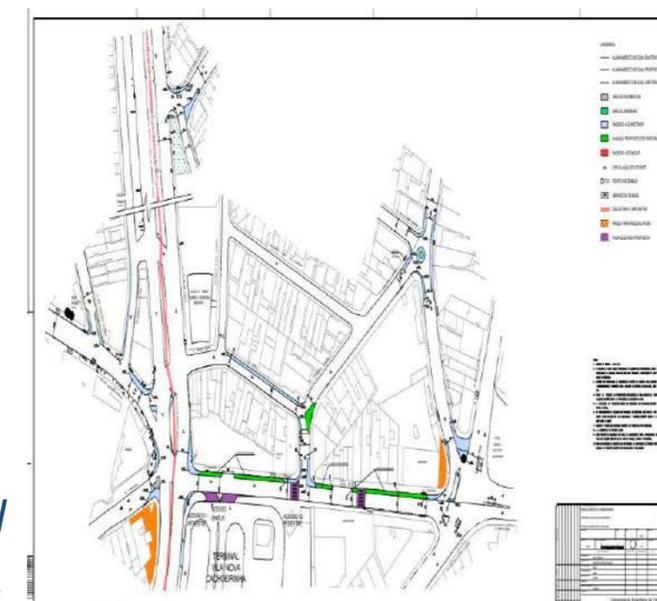


*Foto Projeto Funcional
Out/2021.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rua Completa Brasilândia/Casa Verde (MOB)

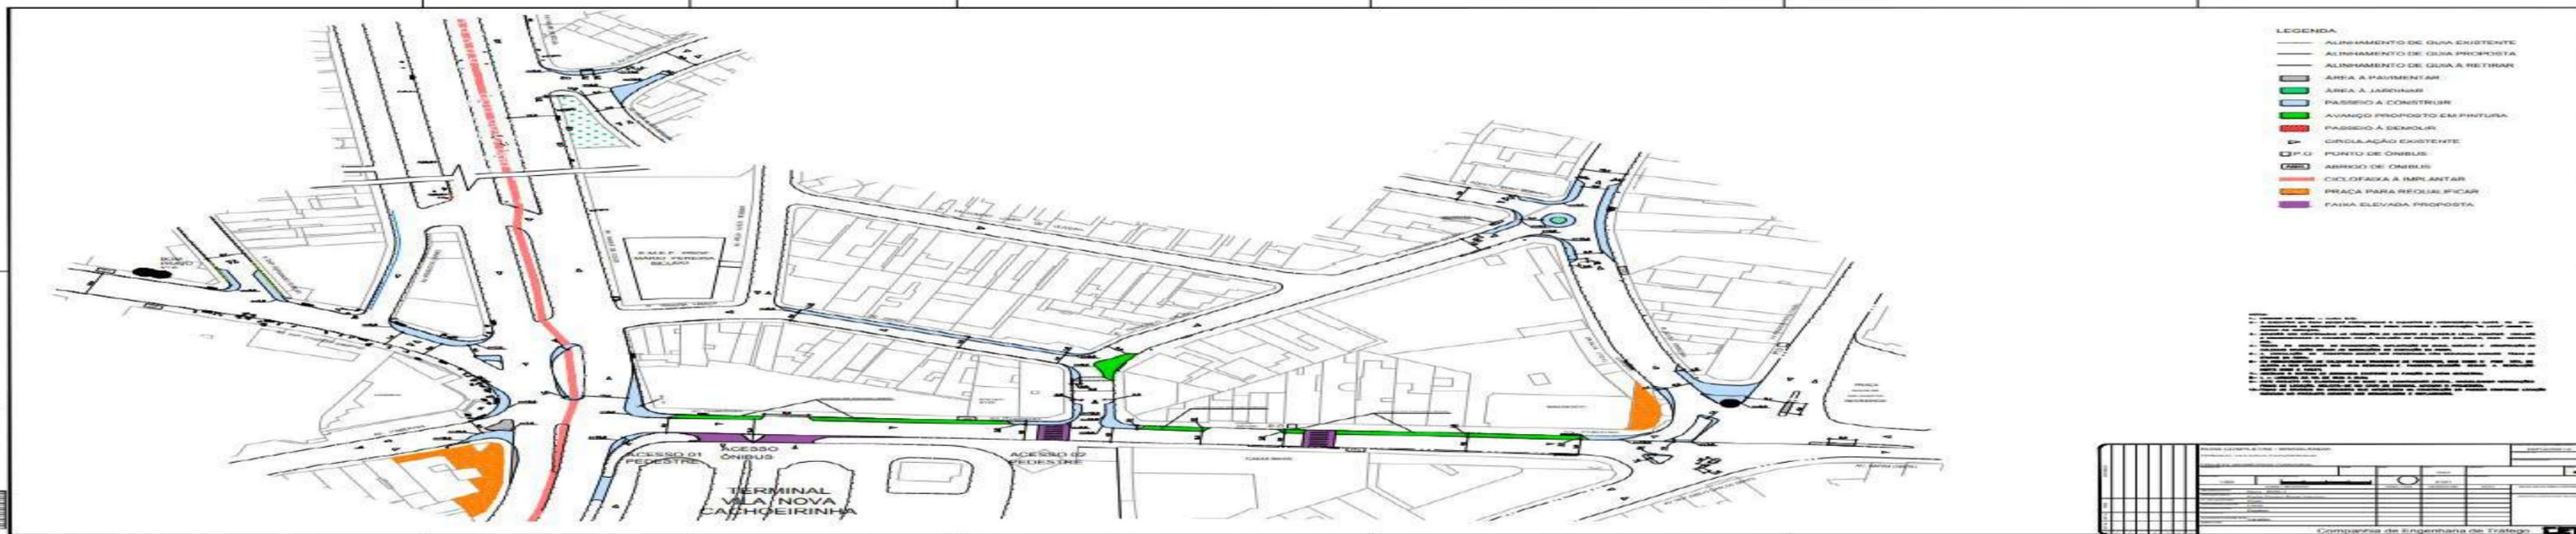

*Local Av. Itaberaba
Foto Projeto Funcional
Out/2021.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Área Calma Centro Sé (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Boa Vista, Líbero Badaró, Benjamin Constant, incluindo também Rua 25 de Março, Rua Comen. Afonso Kherlakian, Rua da Cantareira, Rua Cav. Basílio Jafet, Ladeira General Carneiro e Parque Dom Pedro II, Florêncio de Abreu, Avenida Senador Queirós, Rua Carlos de Souza Nazareth, Rua Eurípedes Simões de Paula, Av. Mercúrio, Rua da Cantareira, Rua Cavalheiro Basílio Jafet, Ladeira Porto Geral, Rua Varnhagen/ Sé
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021/0011800-8
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mar/2022
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



Foto antes da Intervenção.
Jan/2024

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 304.968,77	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.744.718,97	
Valor Pago	R\$ 0,00	


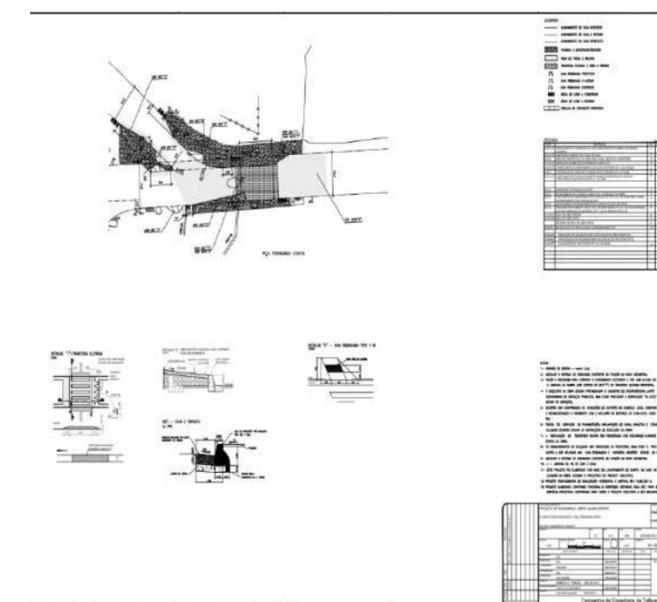


Foto Projeto Funcional
Mar/2021.


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Área Calma Centro Sé (MOB)

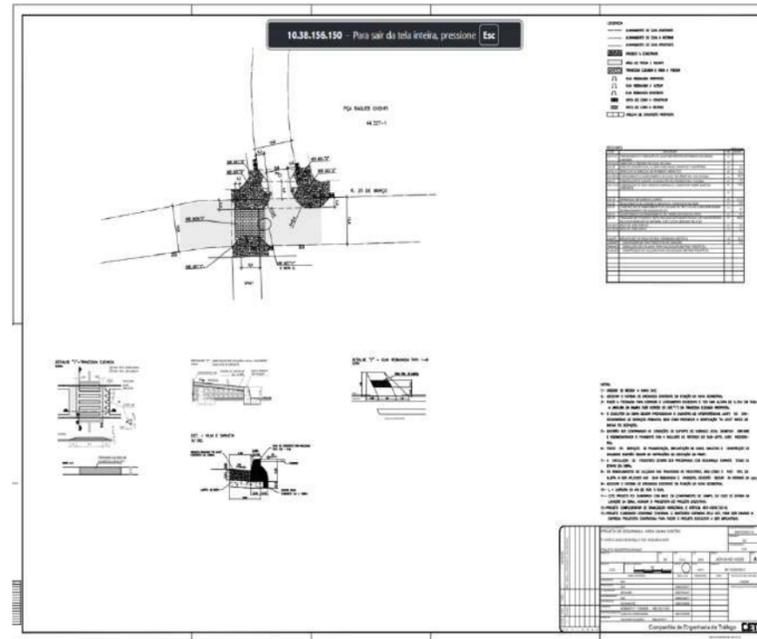


Local Pça Ragueb Chohfi
Foto Projeto Funcional
Mar/2021.

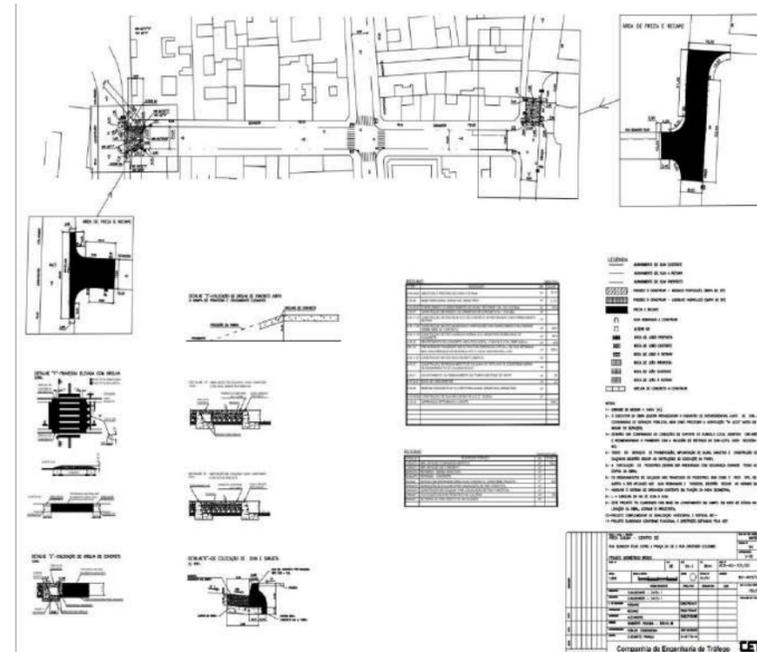

Local Rua Sem. Feijó
Foto Projeto Funcional
Mar/2021

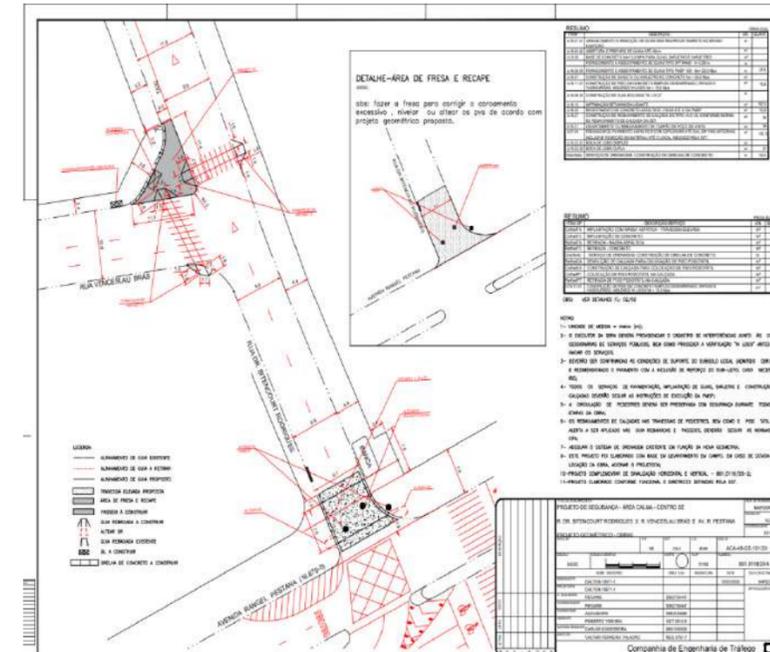

Local Rua Dr. Bitencourt
Rodrigues
Foto Projeto Funcional
Mar/2020

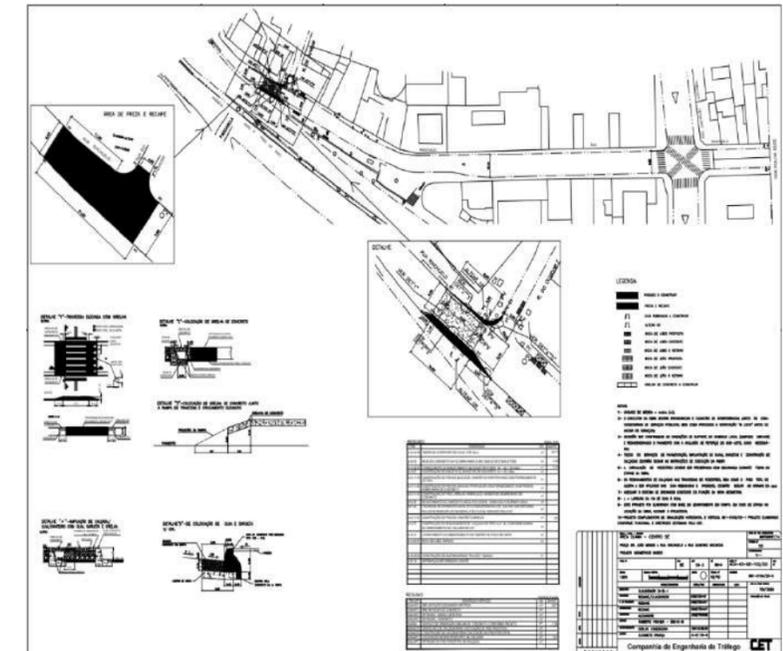

Local Av. 23 de Maio
Foto Projeto Funcional
Fev/2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Itaquera (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Luis Mateus, R. Jardim Tamoio, Av. Nagib Farah Maluf até próximo à R. Agrimensor Sugay/ Itaquera
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021/0011800-8
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mar/2022
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

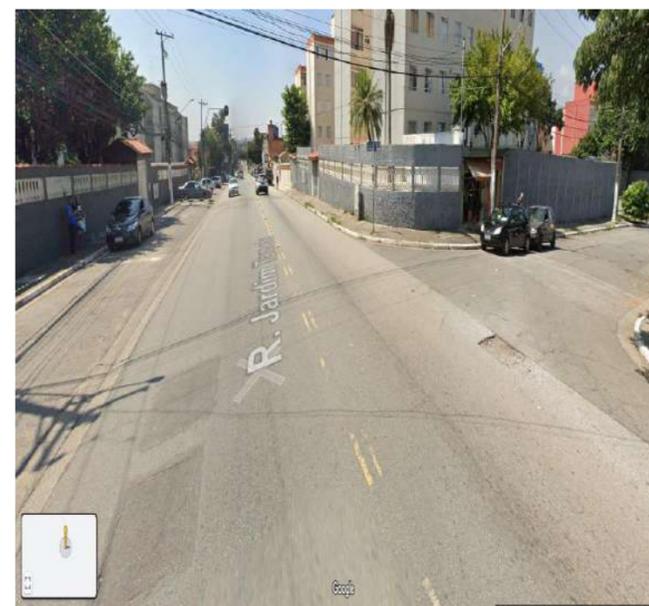


Foto antes da Intervenção.
Abr/2024

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 304.968,77	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.744.718,97	
Valor Pago	R\$ 0,00	


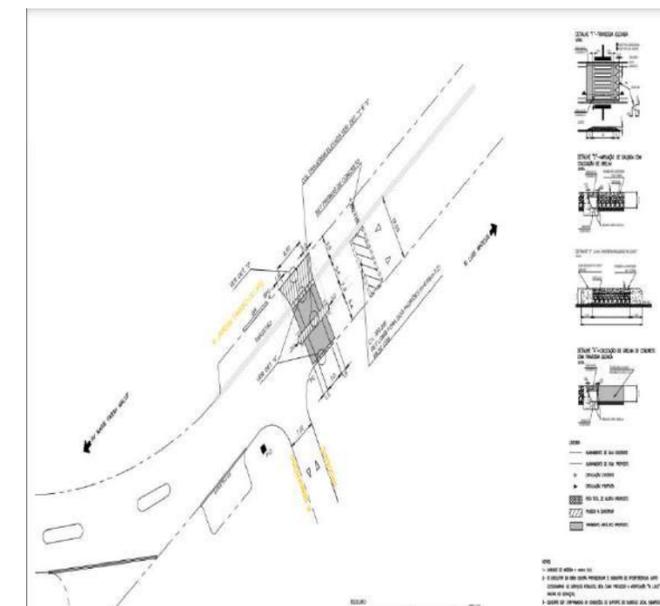


Foto Projeto Funcional
Mai/2018.


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Itaquera (**MOB**)

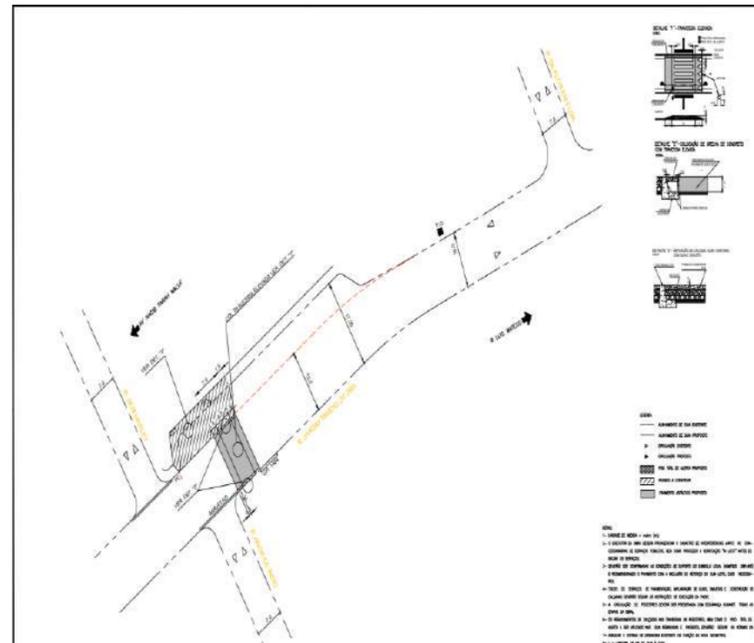


Local Av. Nagib F. Maluf
Foto Projeto Funcional
Mai/2018.

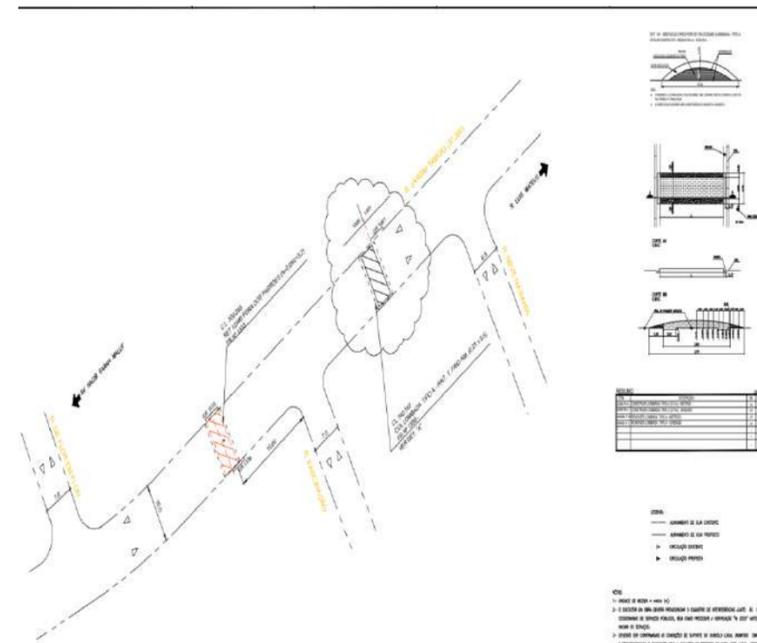

Local . Rua Jardim Tamoio
Foto Projeto Funcional
Maio/2018

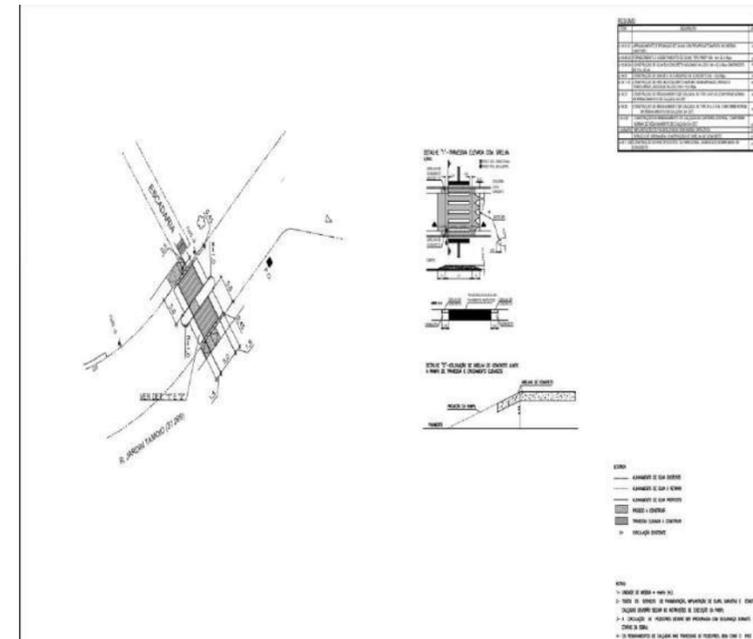

Local Rua Jardim Tamoio
Foto Projeto Funcional
Mai/2018.

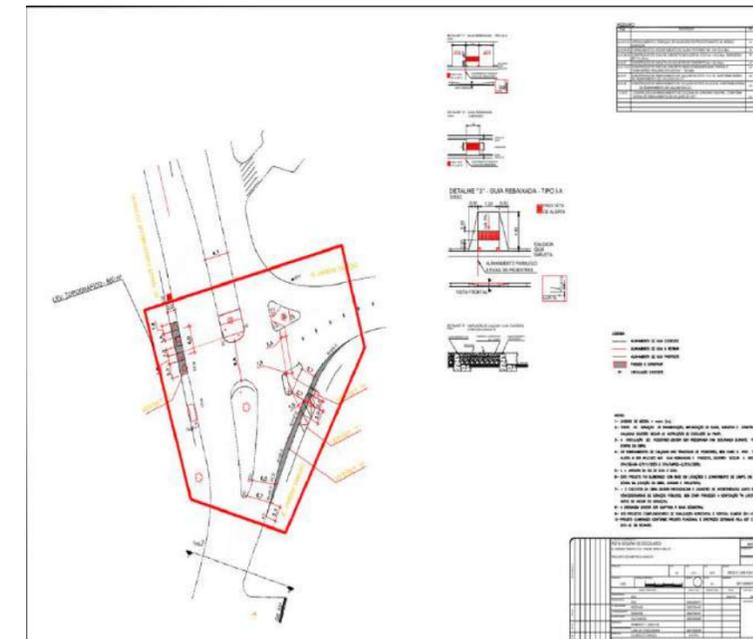

Local Av. Nagib F. Maluf
Foto em Execução
Mai/2018.


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura São Rafael (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Miguel Ferreira de Melo e Av. dos Sertanistas/São Mateus
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021/0011800-8
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mar/2022
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 304.968,77	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

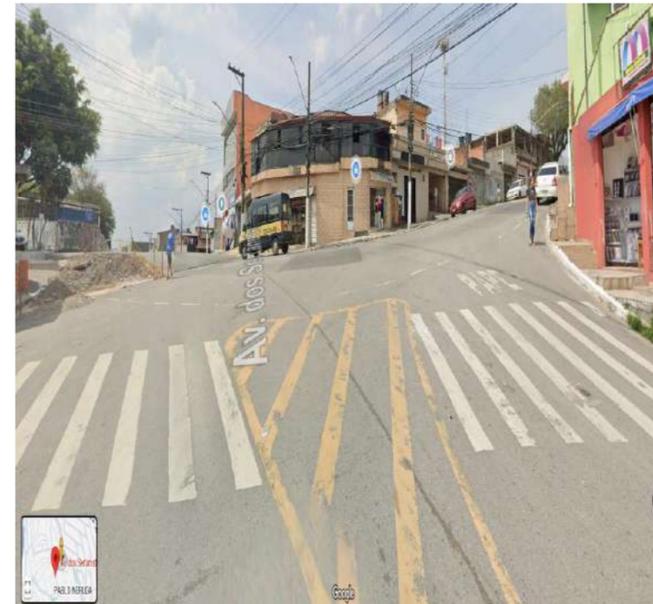


*Foto antes da Intervenção.
Out/2022*

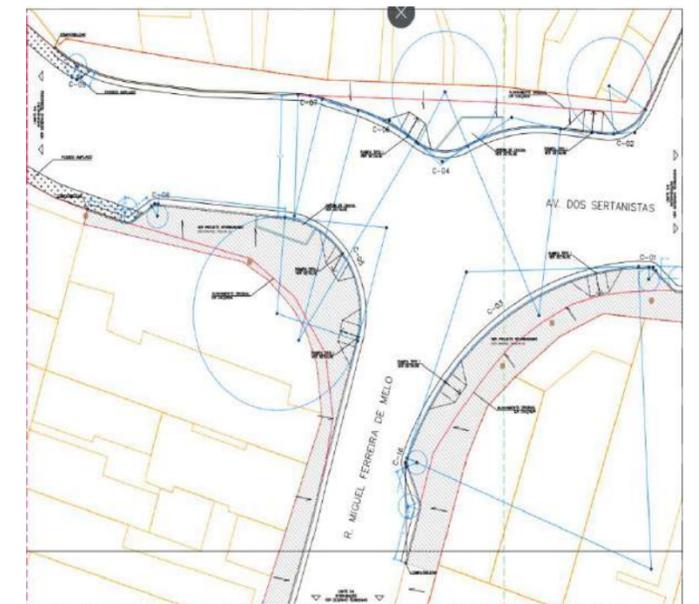


*Foto Projeto Funcional
Nov/2020.*

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura São Rafael (**MOB**)

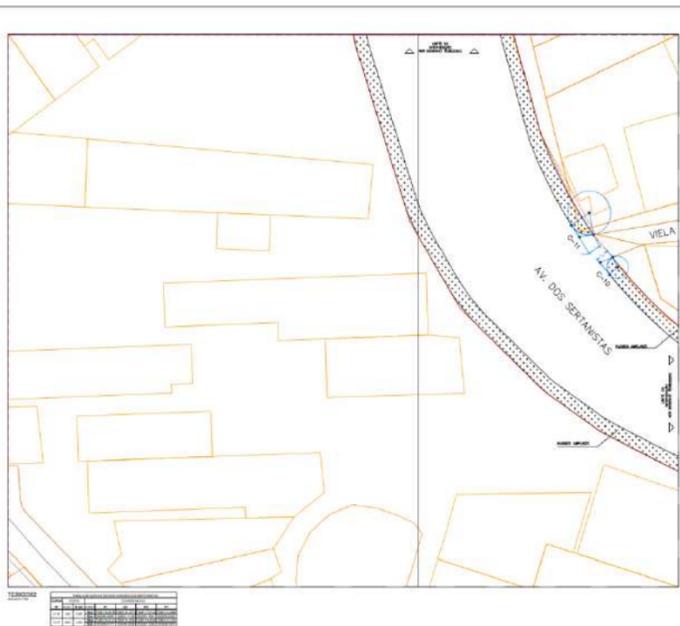


Local Av.dos Seranistas
Foto Projeto Funcional
Nov/2020

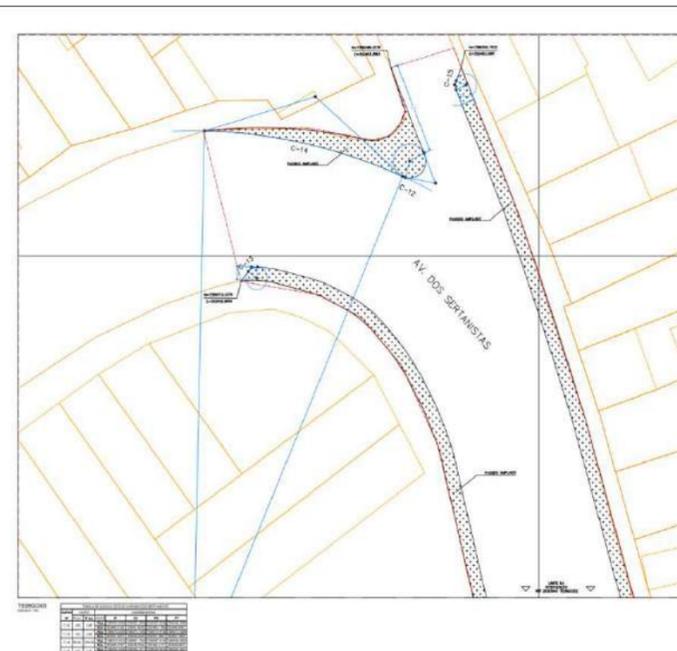

Local . Av dos Sertanistas
Foto Projeto Funcional
Nov/2020



Local Rua Miguel Ferreira de
Melo
Foto Projeto Funcional
Nov/2020.

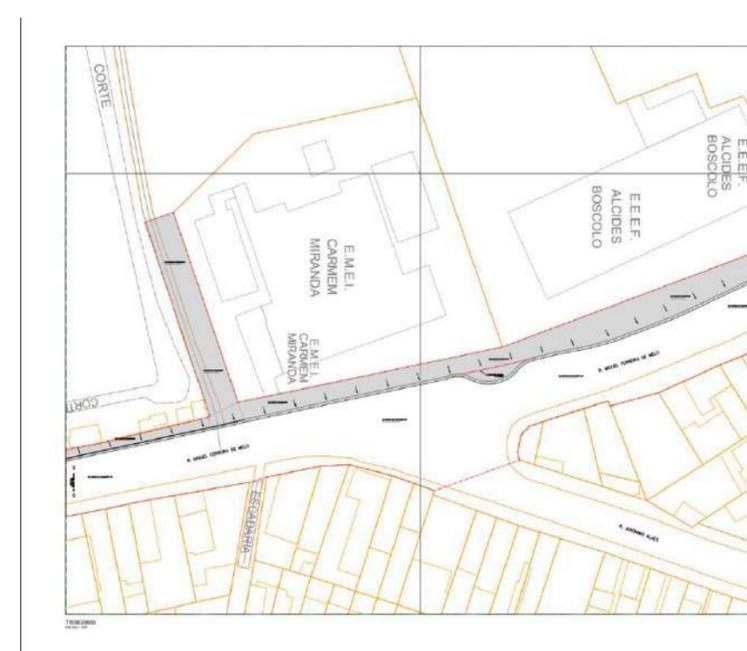

Local Rua Miguel Ferreira de
Melo
Foto Projeto Funcional
Nov/2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Pari(MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Carlos de Campos, Pça Ilo Ottani, Ponte da Vila Guilherme. Av. Bom Jardim, R. Cachoeira, Av. Pedroso da Silveira, Av. Bom Jardim, R. Silva Teles, R. Joaquim Carlos, R. Cel. Emídio Piedade e R. Santa Rita/Mooça
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021/0011800-8
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mar/2022
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Mar/2023*

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 304.968,77	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

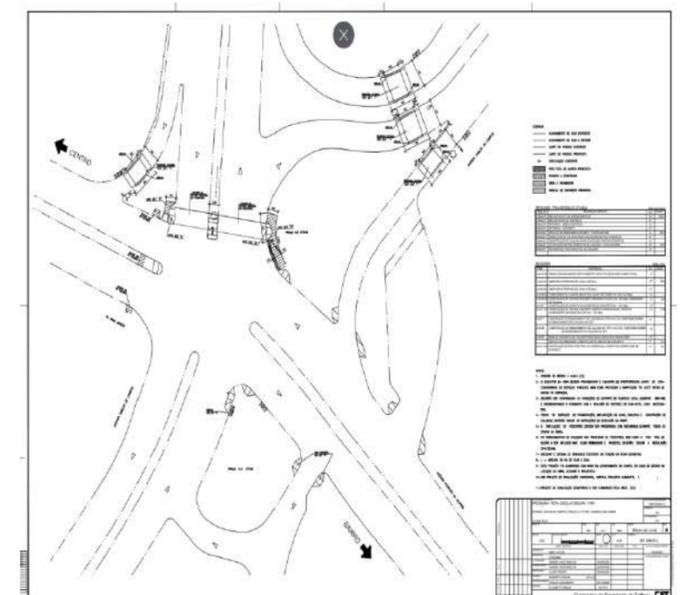


*Foto em Execução
Mar/2020*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Pari (**MOB**)

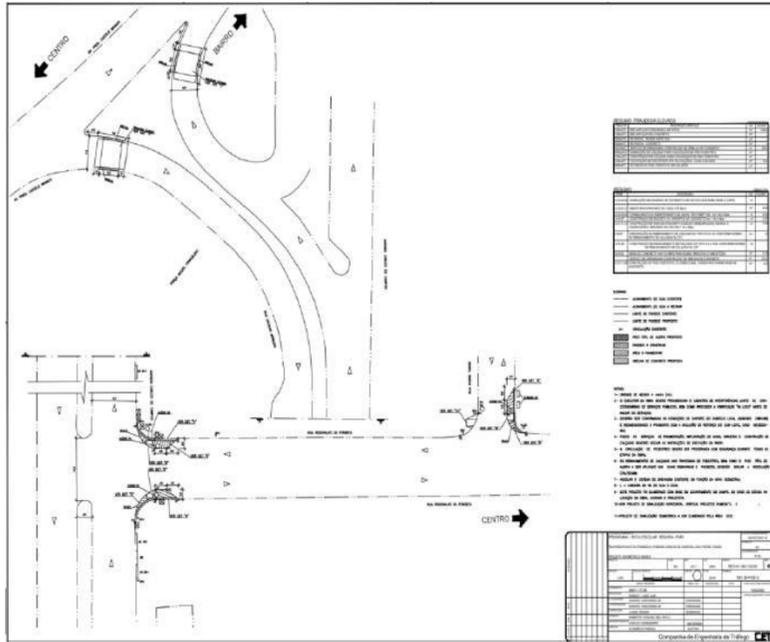


Local Av. Carlos de Campos
Foto Projeto Funcional
Mar/2020

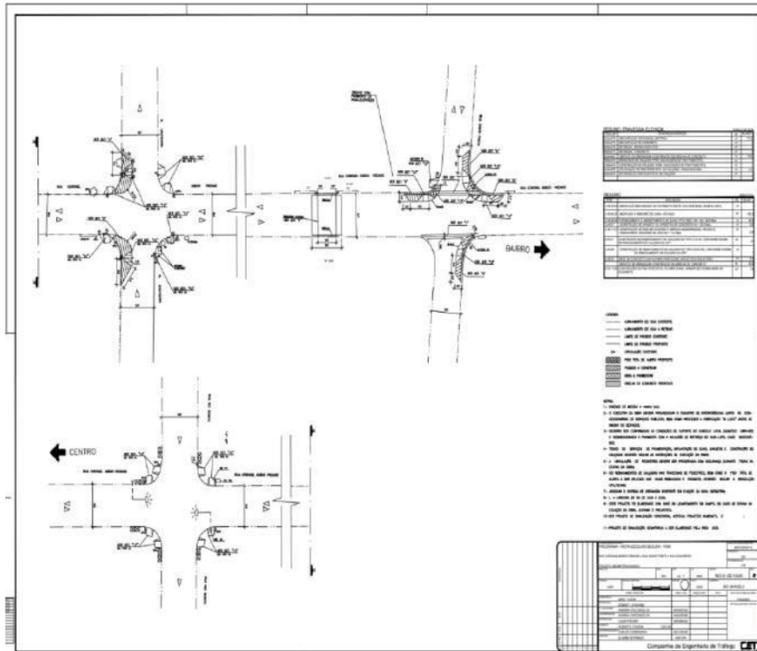

Local . Rua Coronel Emídio
Piedade
Foto Projeto Funcional
Mar/2020.

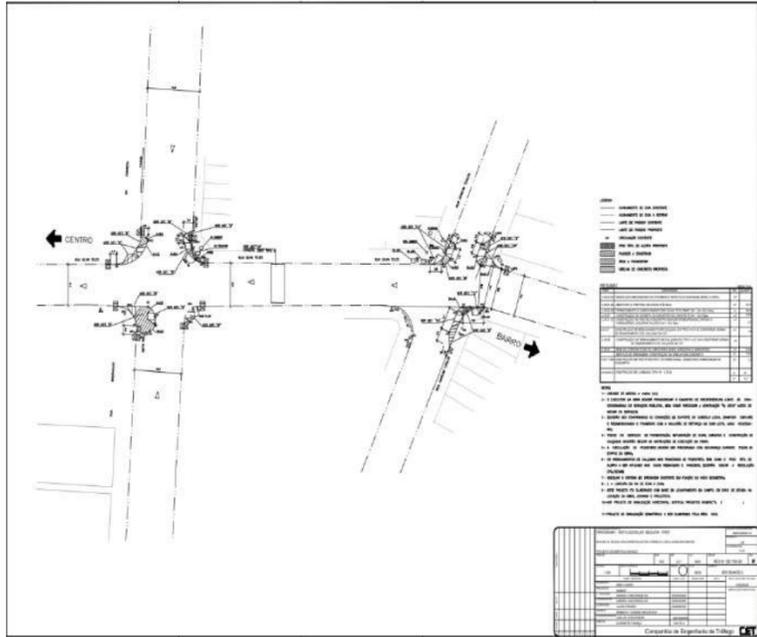

Local Av. Rua Silva Teles
Foto Projeto Funcional
Mar/2020

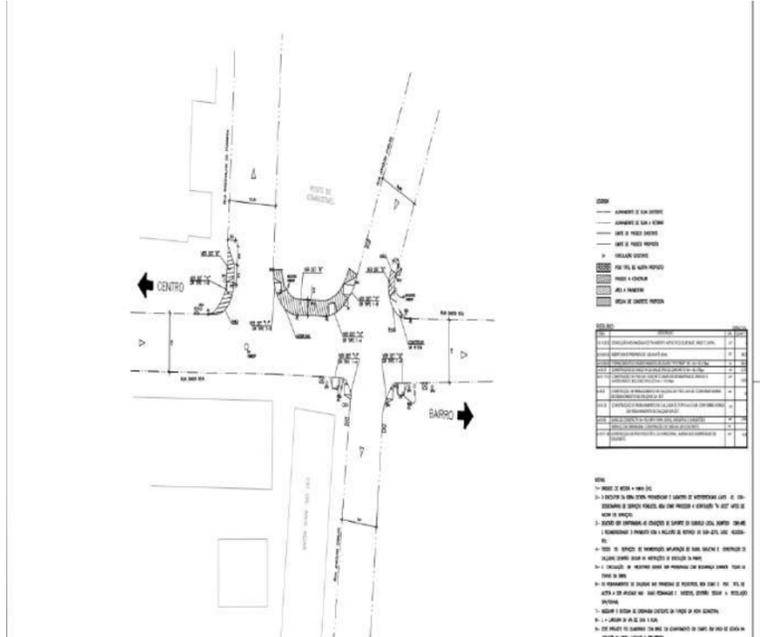


Local Rua Santa Rita
Foto Projeto Funcional
Mar/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Belmira Marin (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Dona Belmira Marin/Capela do Socorro
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021/0011800-8
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mar/2022
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

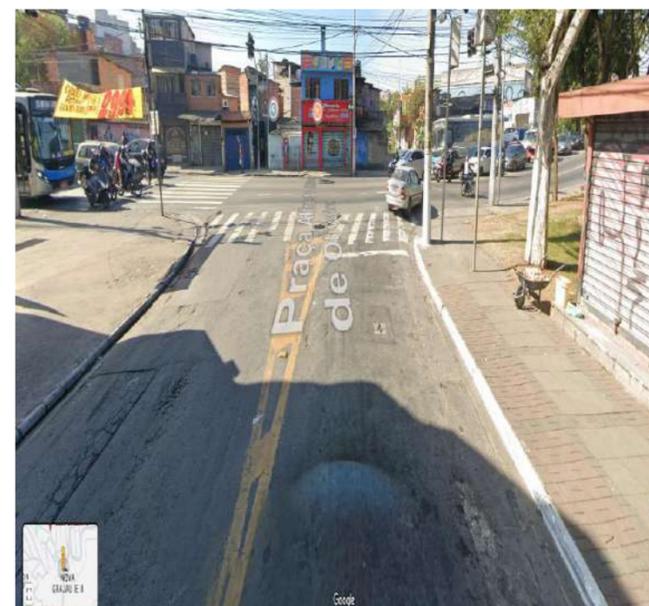

*Foto antes da Intervenção.
Mai/2022*

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 304.968,77	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.744.718,97	
Valor Pago	R\$ 0,00	

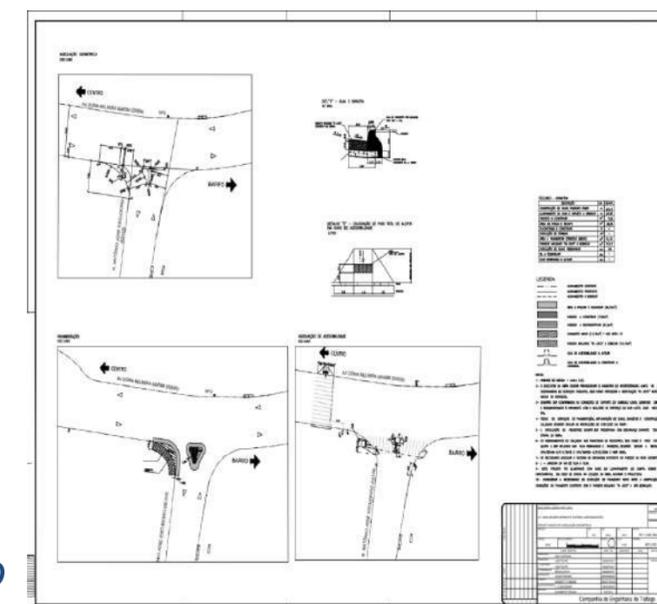


*Foto em Execução
Fev/2021.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Belmira Marin (MOB)

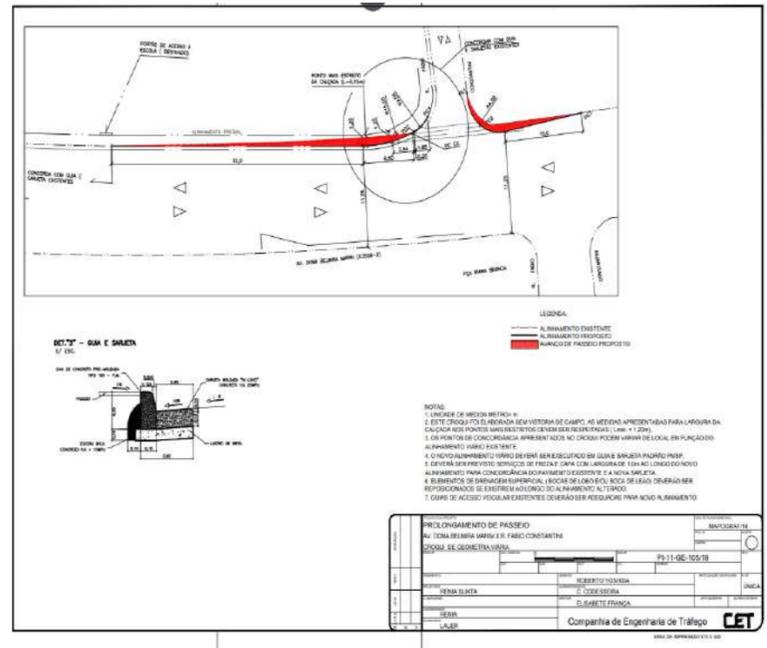


Local Av. Belmira Marin
Foto Projeto Funcional
Fev/2021.

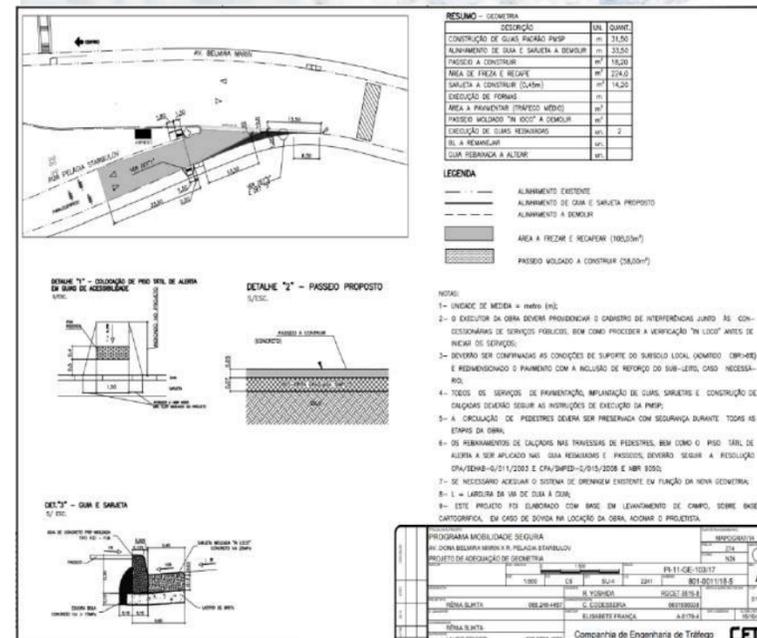

Local Av. Belmira Marin
Foto Projeto Funcional
Fev/2021.

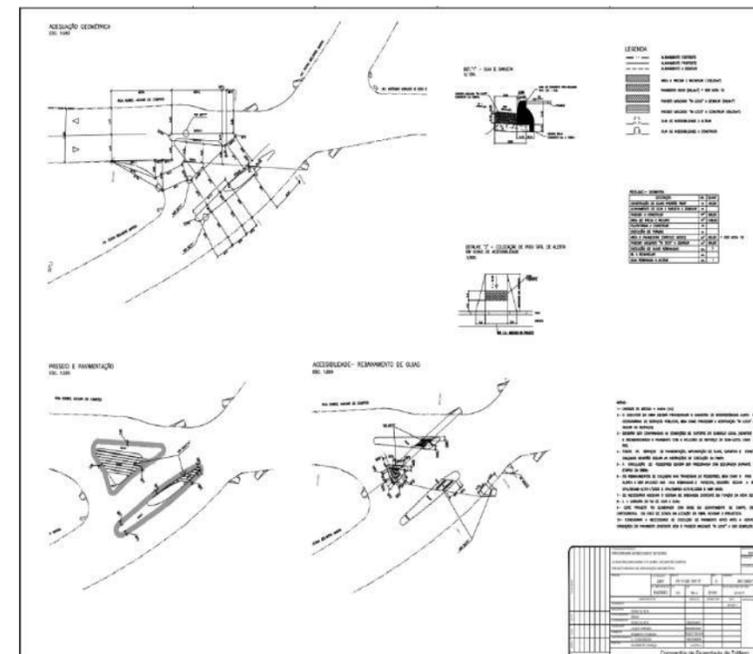

Local Av. Belmira Marin
Foto Projeto Funcional
Fev/2021.

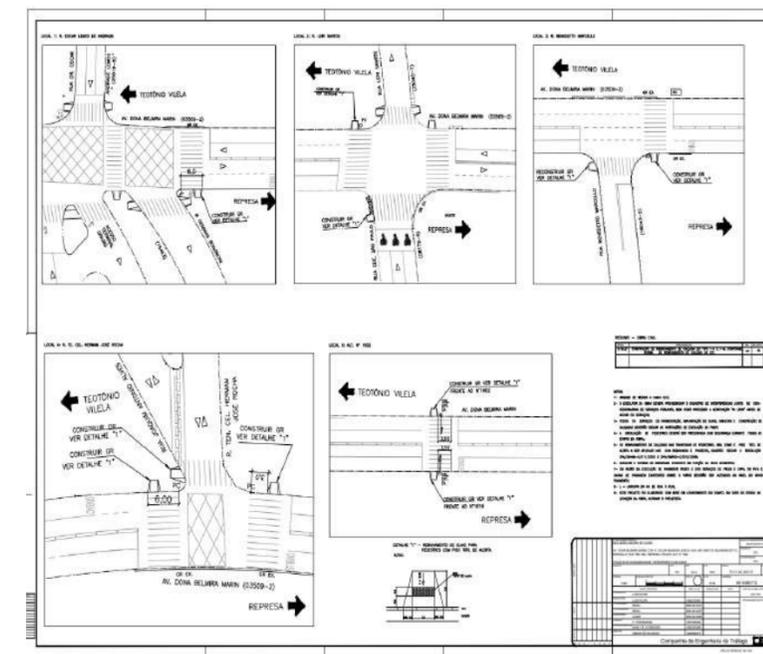

Local Av. Belmira Marin
Foto Projeto Funcional
Fev/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Estr. Itapecerica (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Estrada de Itapecerica/Campo Limpo
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021/0011800-8
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mar/2022
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 304.968,77	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.744.718,97	
Valor Pago	R\$ 0,00	



*Foto antes da Intervenção.
Jul/2023*

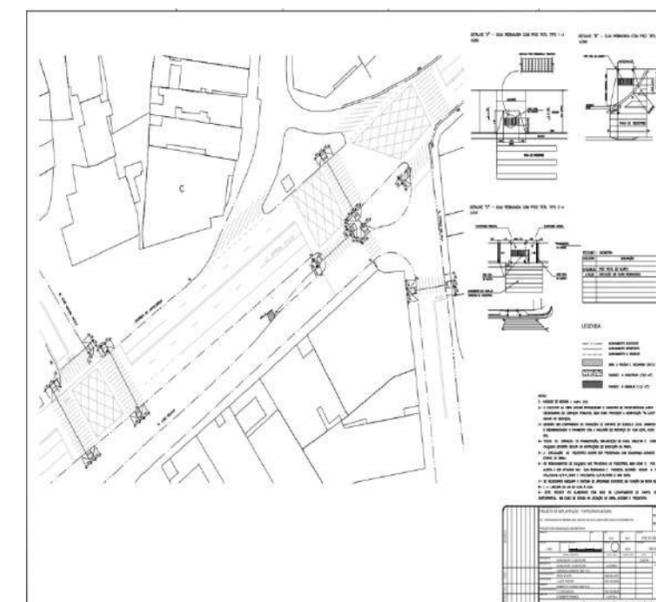


*Foto em Execução
Fev/2019.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Estr. Itapecerica (MOB)

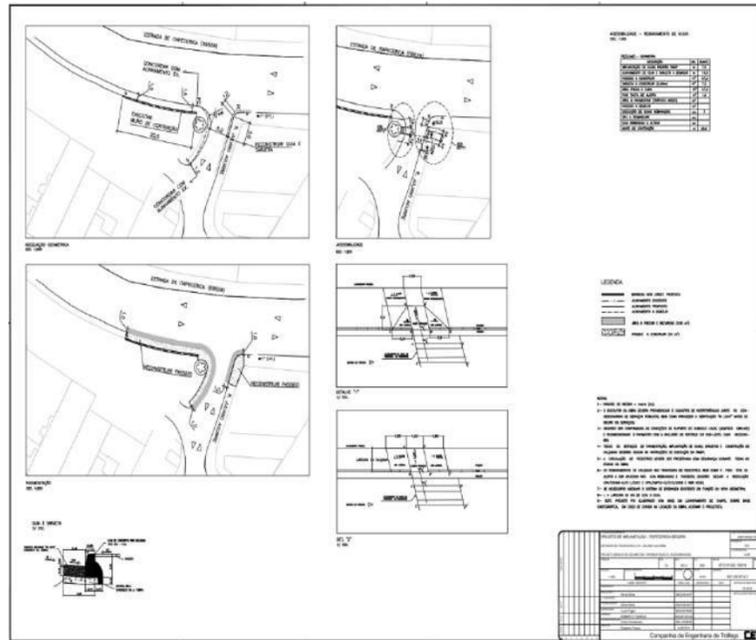


Local Estr. de Itapecerica
Foto Projeto Funcional
Jan/2018

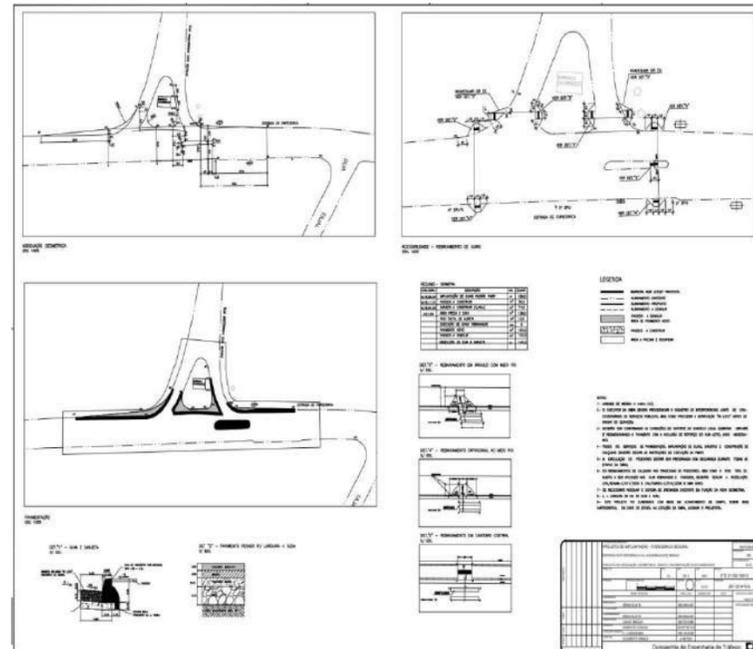

Local . Estr de Itapecerica
Foto Projeto Funcional
Jan/2019.

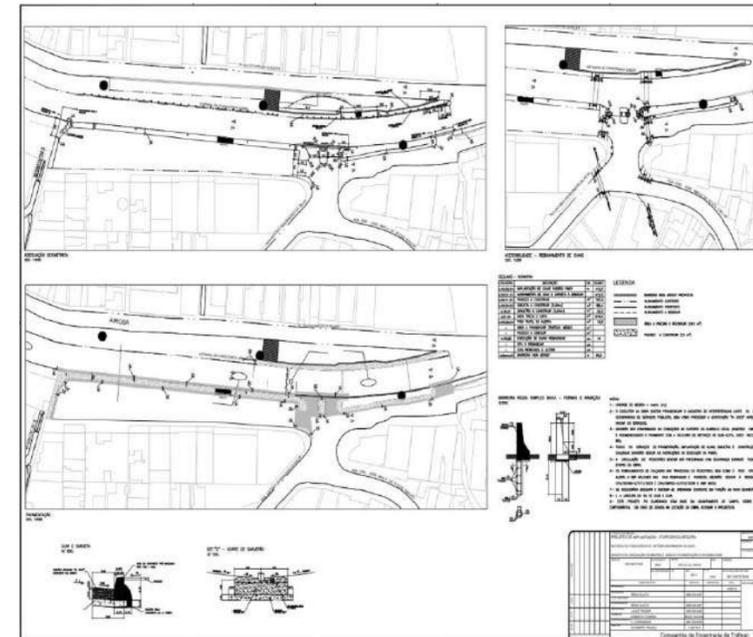

Local Estr de Itapecerica
Foto Projeto Funcional
Ago/2018.

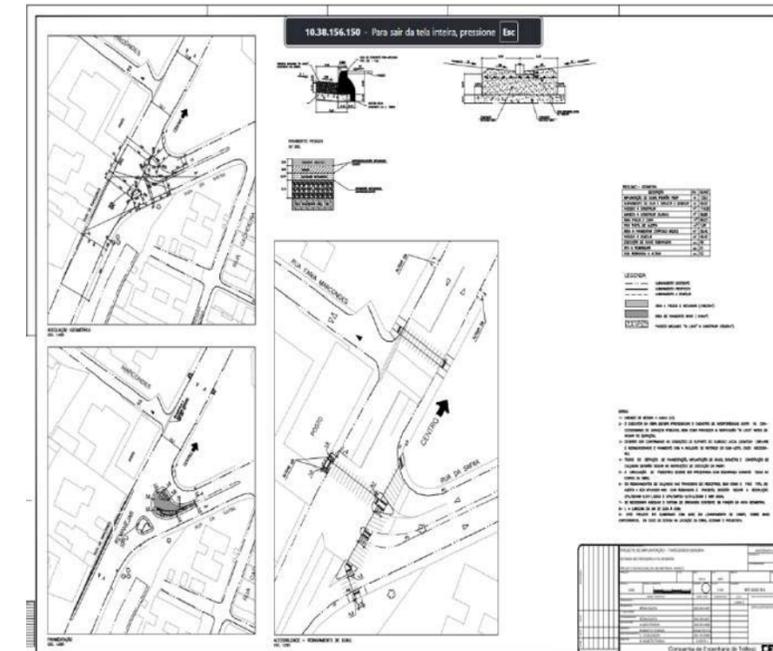

Local Estr de Itapecerica
Foto Projeto Funcional
Ago/2018.


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Marechal Tito (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Marechal Tito/São Mateus e Itaim Paulista
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021/0011800-8
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mar/2022
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 304.968,77	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.744.718,97	
Valor Pago	R\$ 0,00	

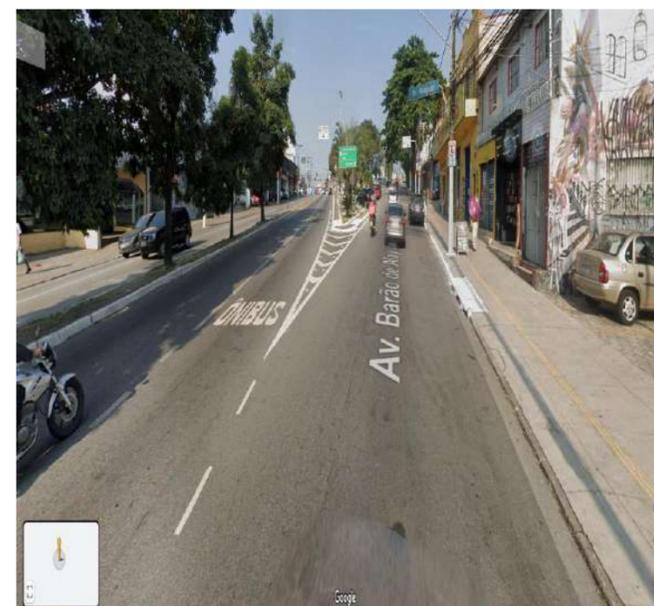


*Foto antes da Intervenção.
Mar/2023*

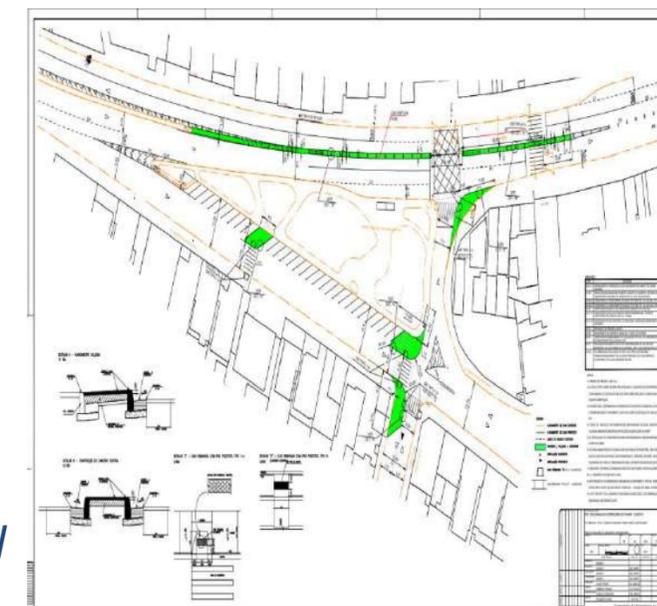


*Foto Projeto Funcional
Mar/2020.*


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Marechal Tito (MOB)

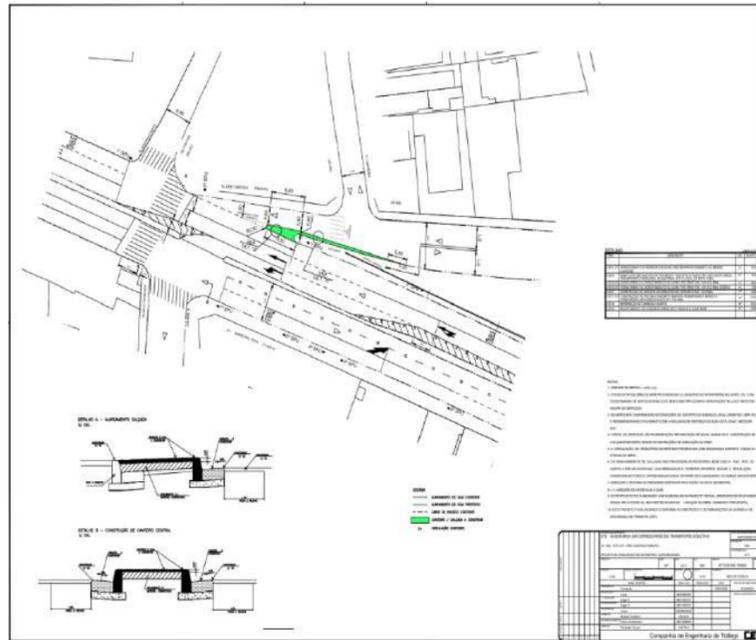


Local Av. Marechal Tito
Foto Projeto Funcional
Fev/2020.

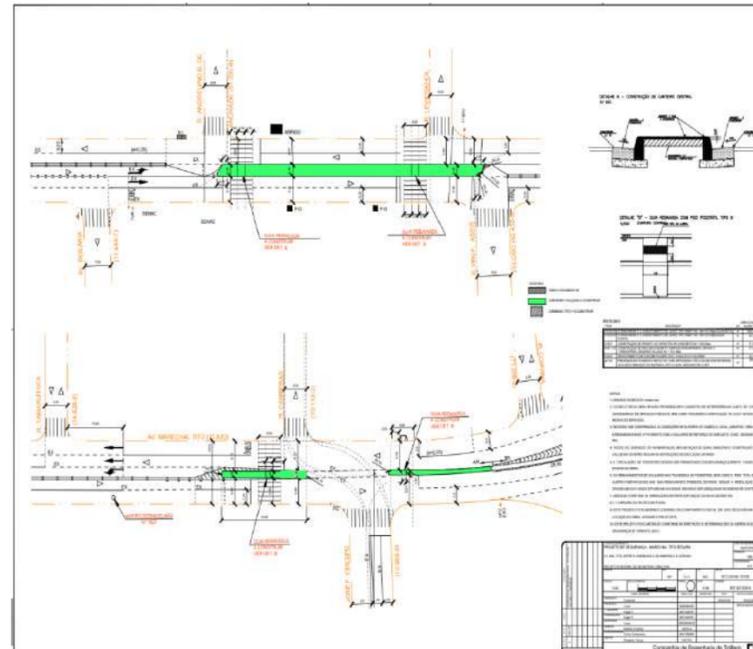

Local Av Marechal Tito
Foto Projeto Funcional
Fev/2020.

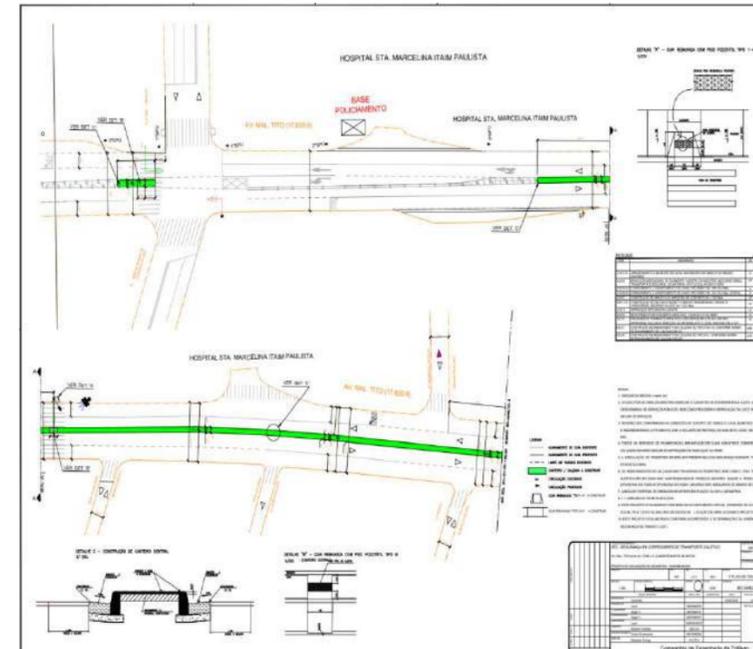

Local Av. Marechal Tito
Foto Projeto Funcional
Fev/2020.

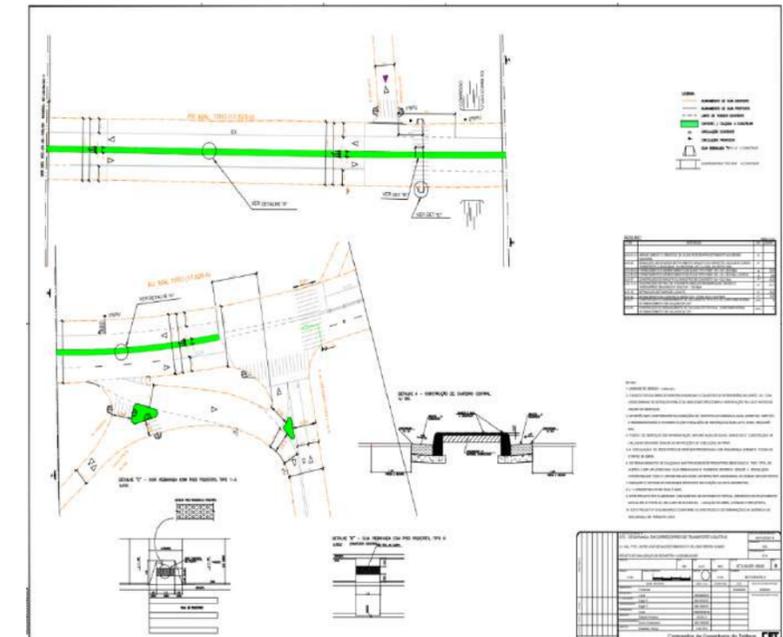

Local Av. Marechal Tito
Foto Projeto Funcional
Jun/2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Teotônio Vilela (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av Senador Teotônio Vilela/Capela do Socorro
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021/0011800-8
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mar/2022
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 304.968,77	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.744.718,97	
Valor Pago	R\$ 0,00	




*Foto antes da Intervenção.
Mai/2024*

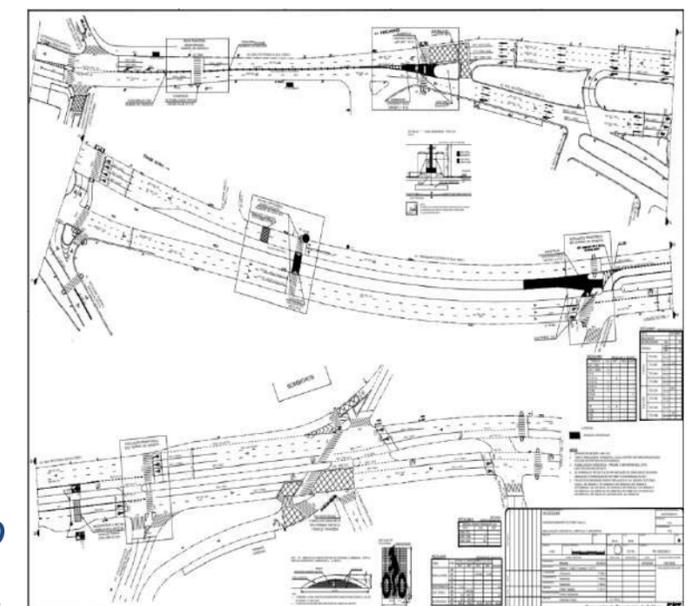


*Foto em Execução
Jan/2024.*


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Teotônio Vilela (**MOB**)

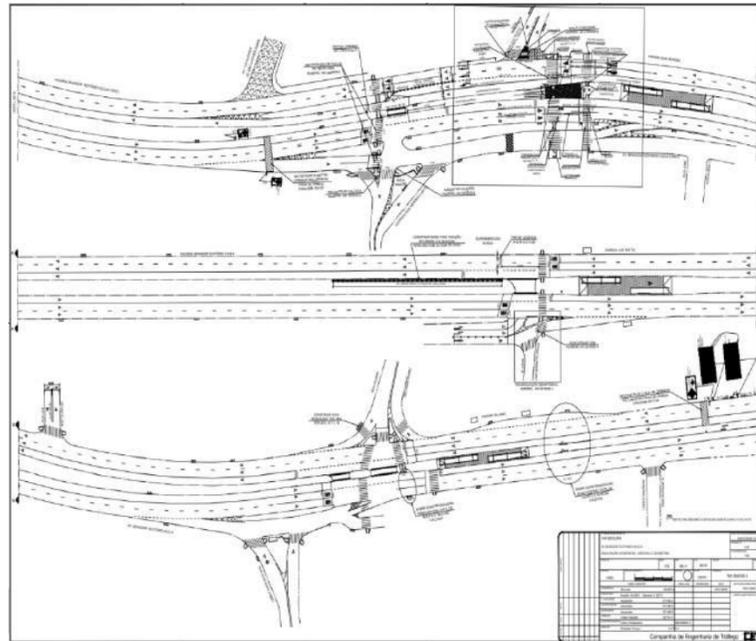


Local Av.Sen. Teotônio Vilela
Foto Projeto Funcional
Jan/2020.

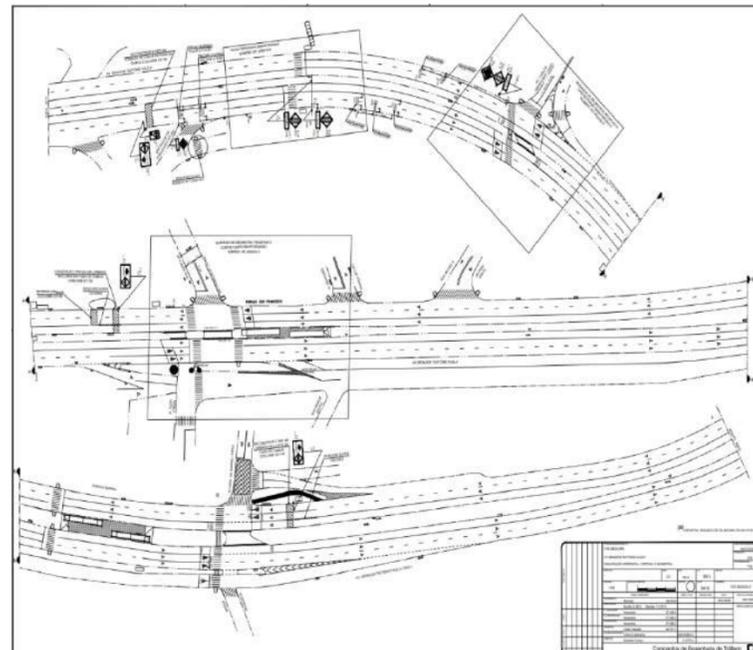

Local . Av. Sen. Teotônio Vilela
Foto Projeto Funcional
Jan/2020.

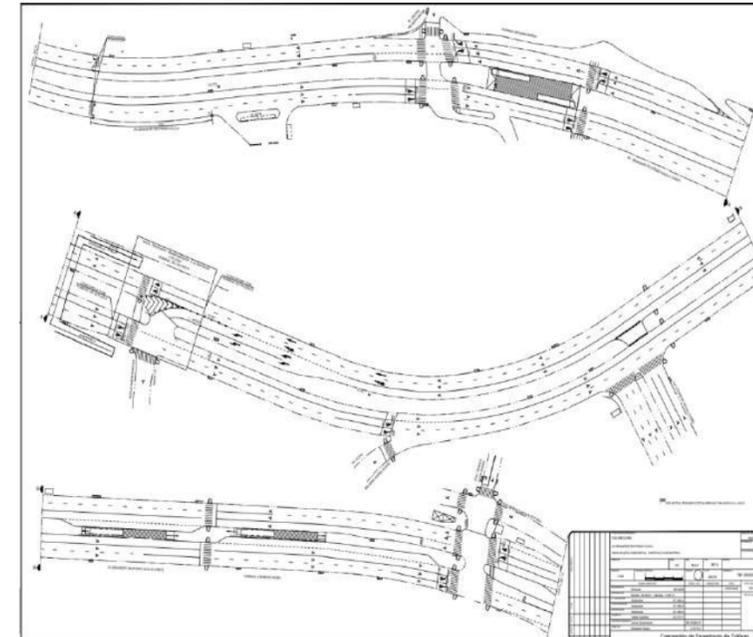

Local Av.Sen. Teotônio Vilela
Foto Projeto Funcional
Jan/2020.

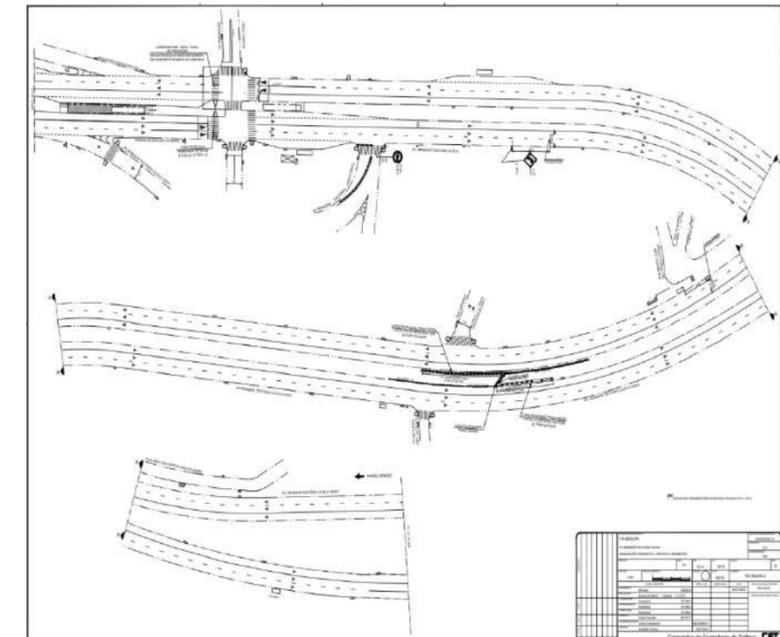


Local Av. Sem. Teotônio Vilela
Foto Projeto Funcional
Jan/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Raimundo P. Magalhães(MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Raimundo Pereira de Magalhães/Pirituba e Perus
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021/0011800-8
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mar/2022
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

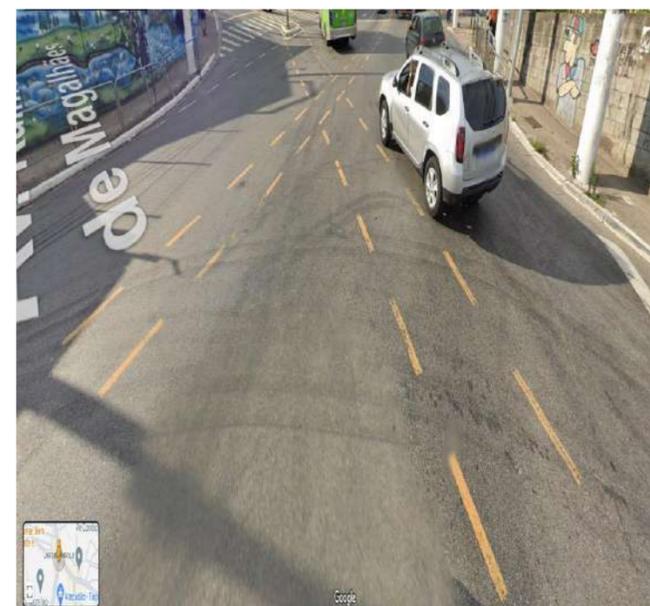

*Foto antes da Intervenção.
Mar/2022*

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 304.968,77	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 2.744.718,97	
Valor Pago	R\$ 0,00	

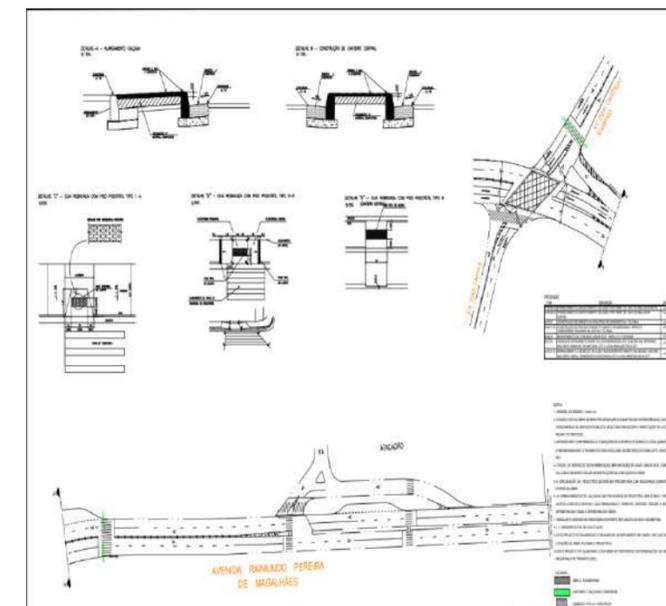


*Foto Projeto Funcional
Jan/2020.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rota Escolar Segura Raimundo P. Magalhães (MOB)

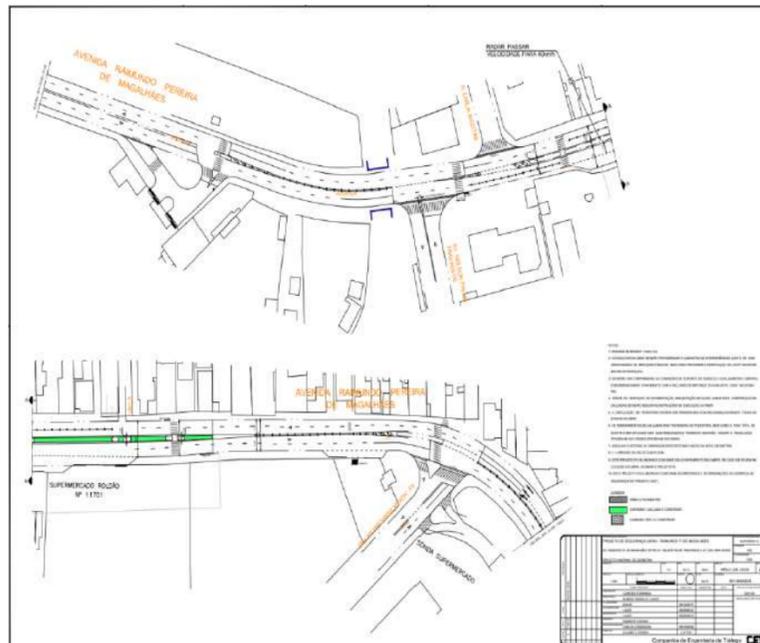


Local Av. Raimundo P. de Magalhães
Foto Projeto Funcional
Jan/2020

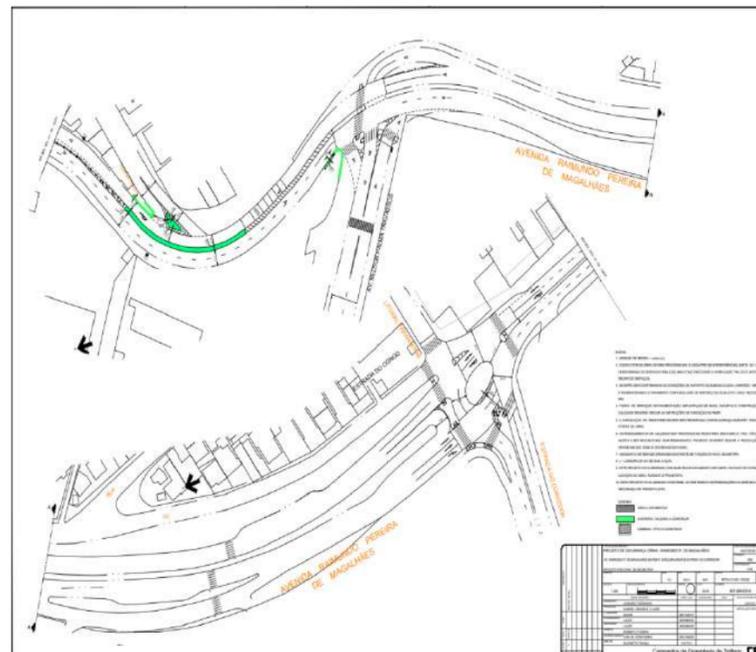

Local Av. Raimundo P de Magalhães
Foto Projeto Funcional
Jan/2020

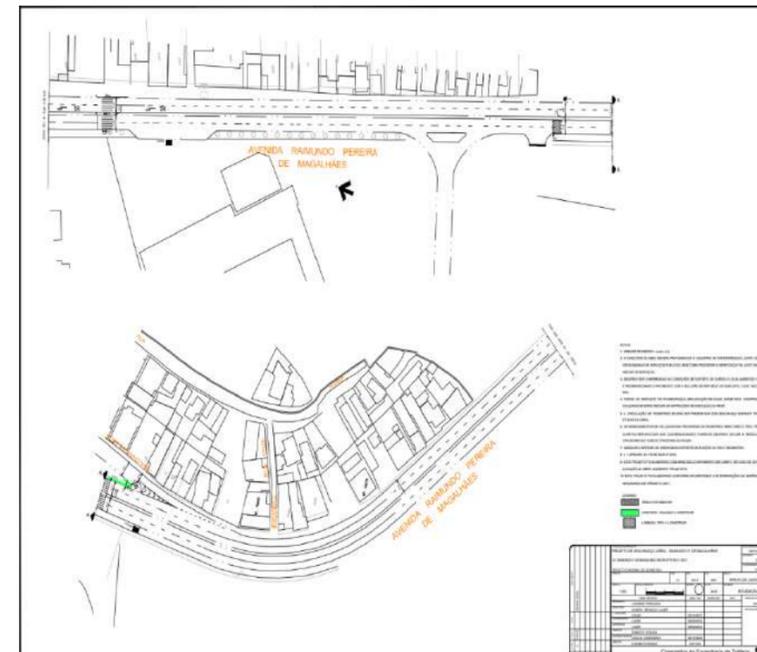

Local Av. Raimundo Pereira de Magalhães
Foto Projeto Funcional
Jan/2020

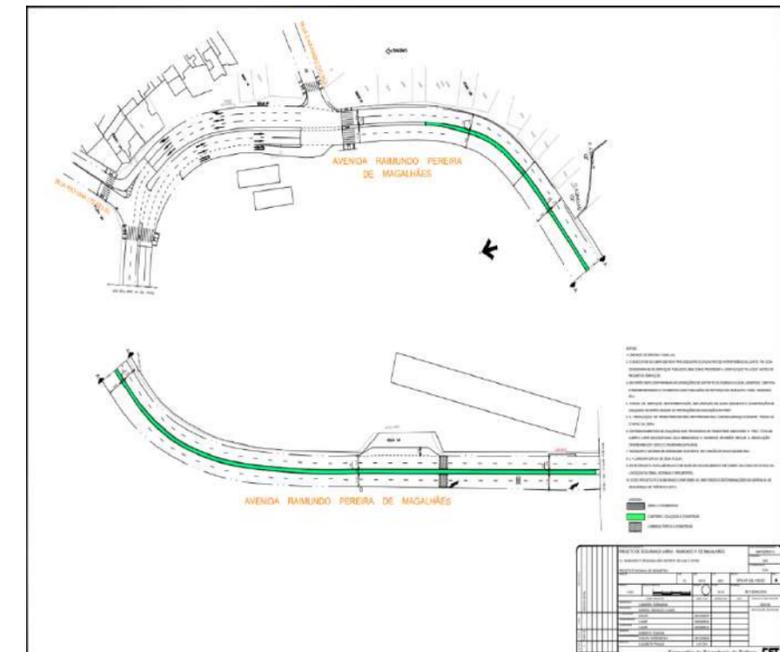

Local Av. Raimundo P. de Magalhães
Foto Projeto Funcional
Jan/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência Barra Funda (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Estação Barra Funda do Metrô. Auro Soares de Moura Andrade, Deputado Salvador Julianelli, Francisco Matarazzo e Ministro Godoi/ Lapa
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021.0021377-9
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mai/2024
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Mar/2023*

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 1.110.821,86	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 5.554.109,30	
Valor Pago	R\$ 3.256.937,33	

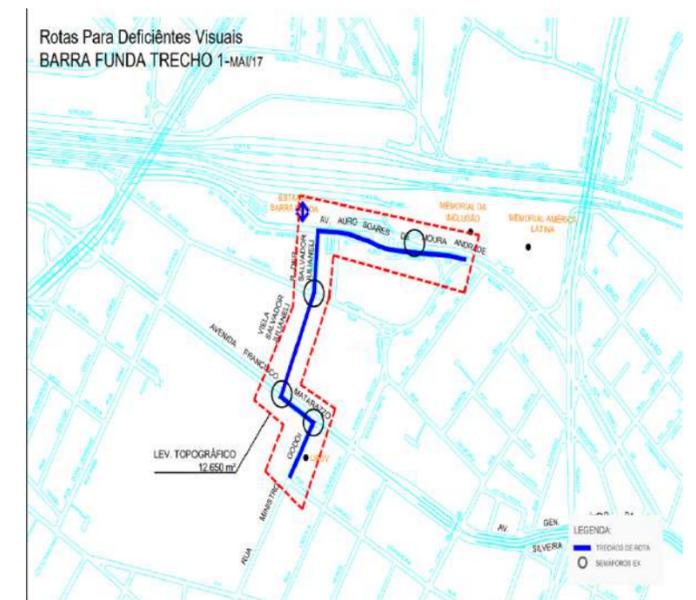


*Foto Projeto Funcional
Mai/2017.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência
Barra Funda (MOB)

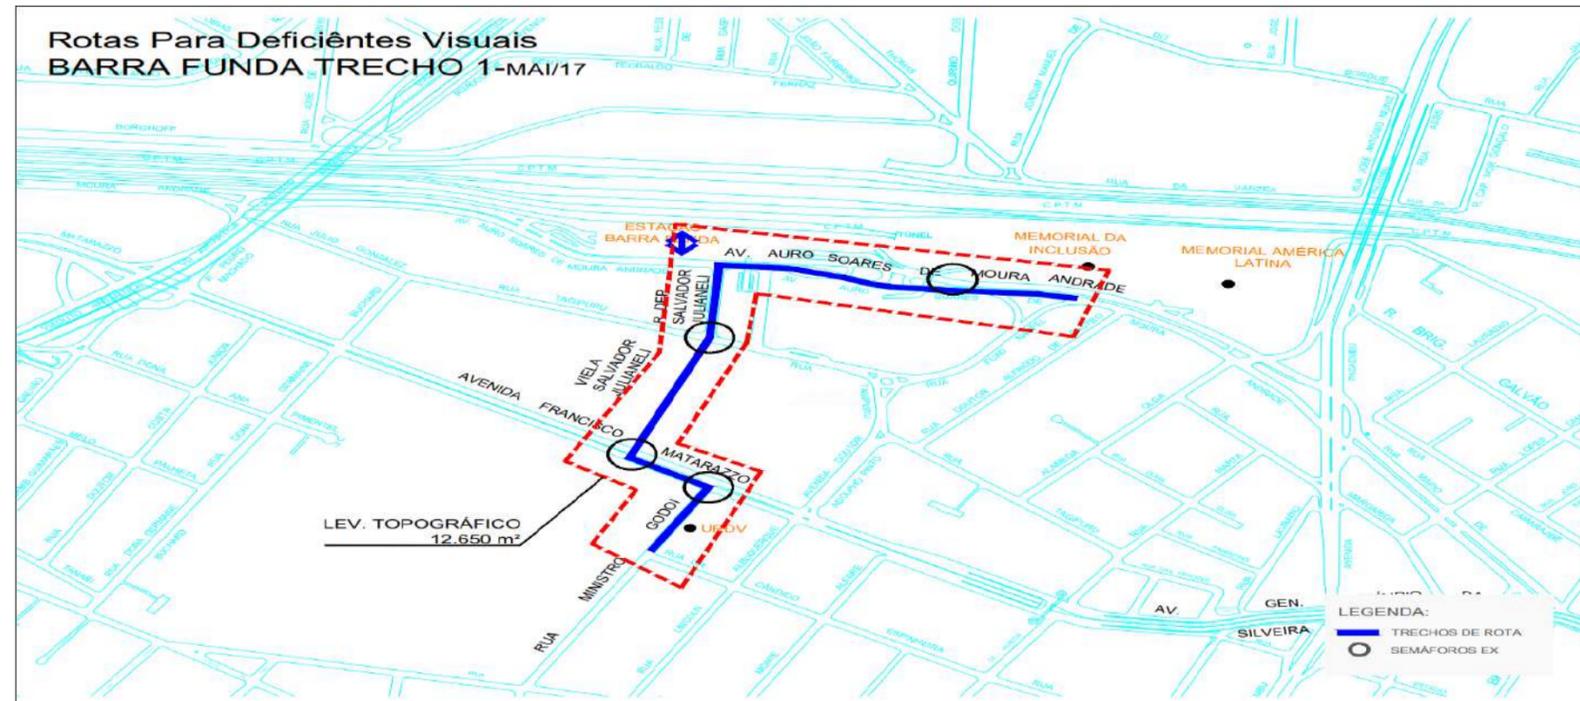

*Local Rua Deputado Salvador
Julianelli
Foto Projeto Funcional
Mai/2017*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência Ipiranga (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Bom Pastor, dos Patriotas, Nazaré e Moreira de Godoi./ Ipiranga
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021.0021377-9
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mai/2024
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



Foto antes da Intervenção.
Mar/2022

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 1.110.821,86	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 5.554.109,30	
Valor Pago	R\$ 3.256.937,33	


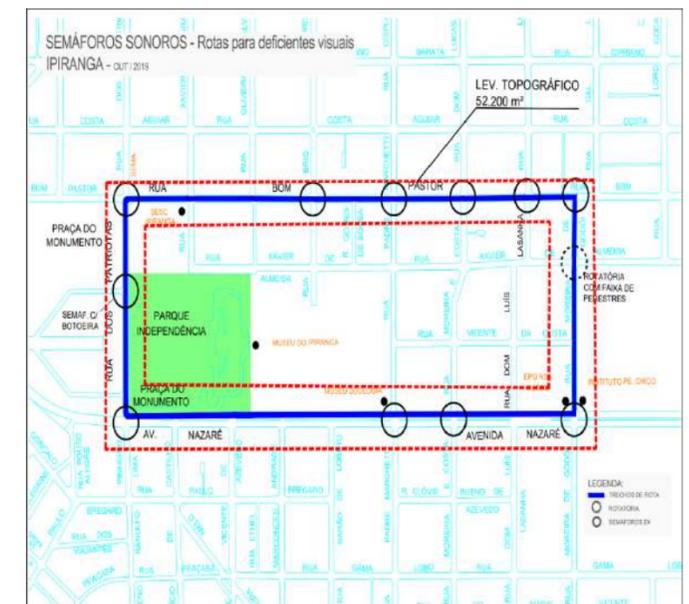


Foto em Execução
Jan/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência Ipiranga (MOB)

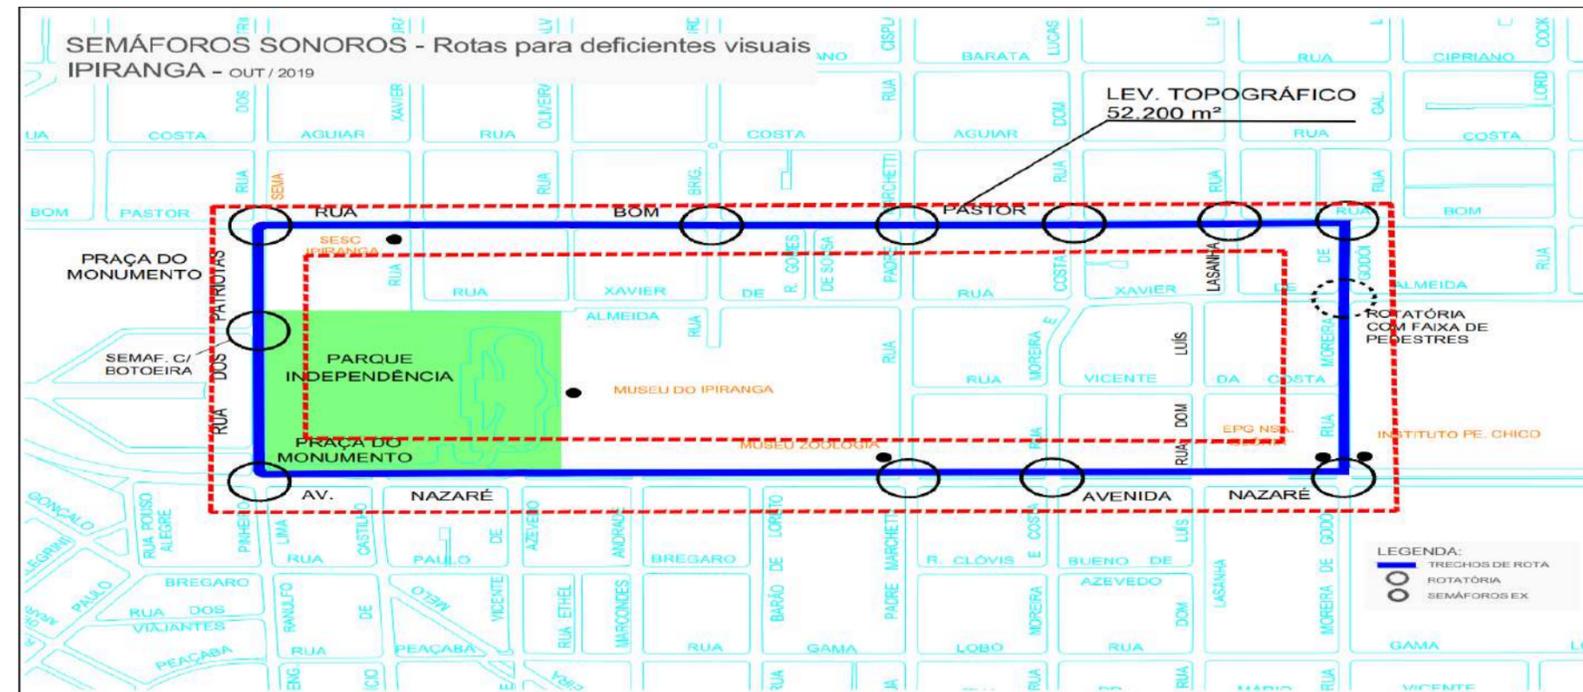

*Local . Rua Bom Pastor x Rua
dos Patriotas
Foto Projeto Funcional
Out/2019.*

*Local Av. Marechal Tito,256
Foto em Execução
Mar/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência Marechal Deodoro (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Gal. Olímpio da Silveira, Lopes de Oliveira, Brigadeiro Galvão e Conselheiro Brotero/Sé
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021.0021377-9
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mai/2024
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



Foto antes da Intervenção.
Dez/2023

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 1.110.821,86	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 5.554.109,30	
Valor Pago	R\$ 3.256.937,33	


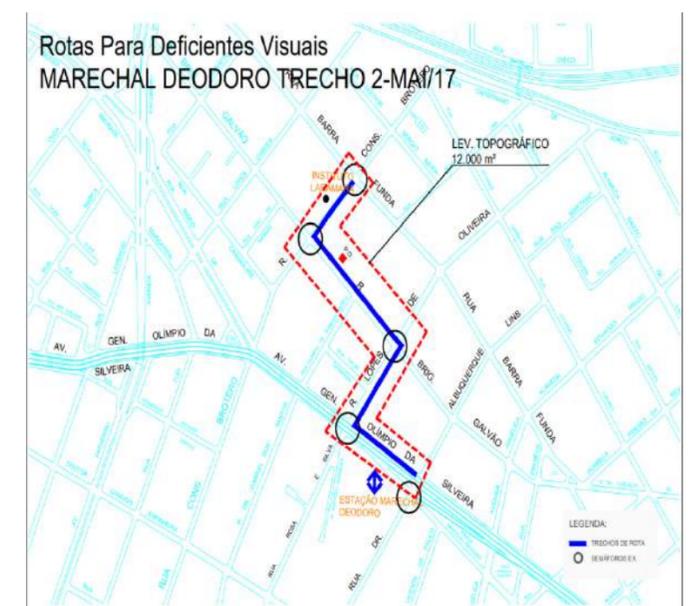


Foto Projeto Funcional
Mai/2017.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência Marechal Deodoro(MOB)

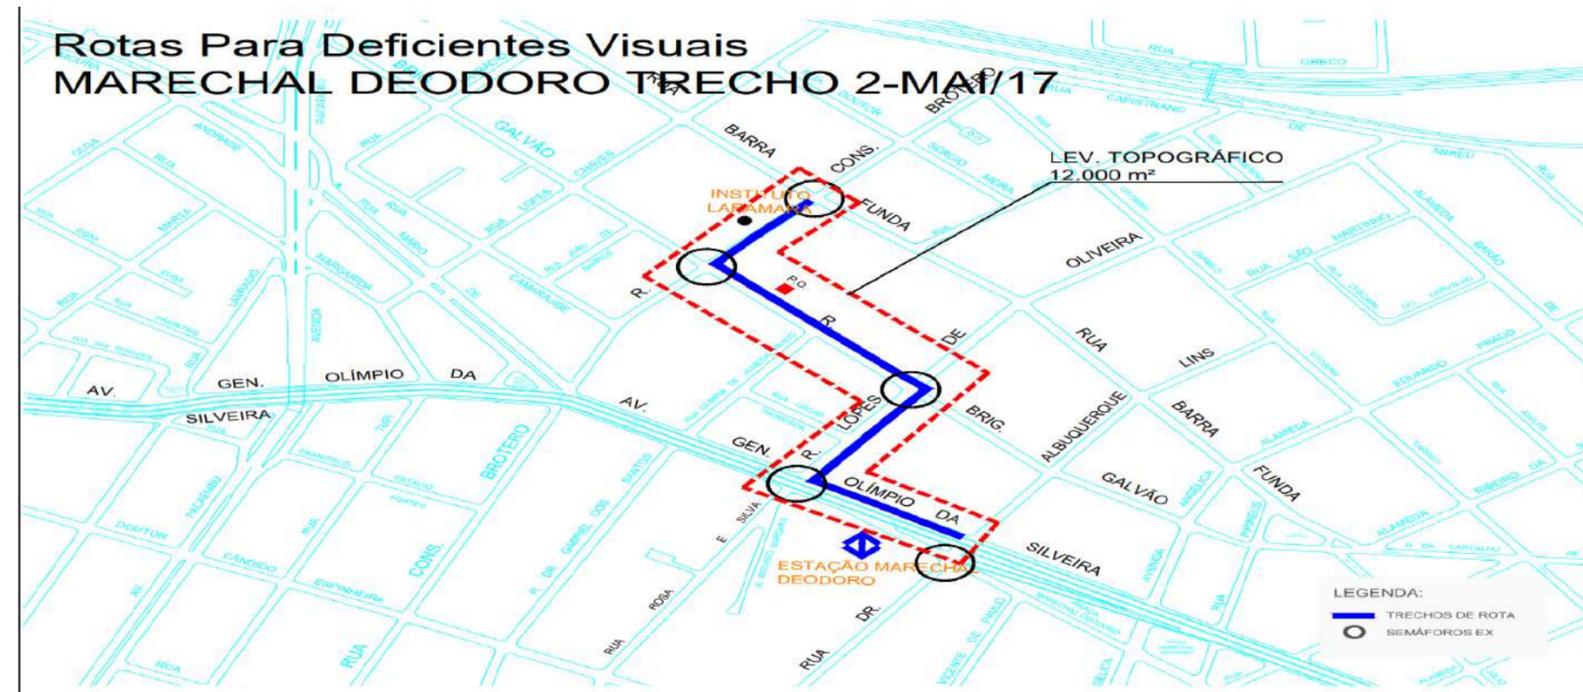

*Local Rua Conselheiro Brotero
Foto. Local das Intervenções
Mai/2017*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência Vila Mariana (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	entorno da Linha Azul do Metrô percorrerá área paralela a parte do trajeto da Linha Azul do Metrô, entre o Centro Cultural Vergueiro e o cruzamento com as Ruas Sena Madureira / Monsenhor Manuel Vicente, percorrendo as vias Domingos de Moraes; Professor Noé Azevedo; Vergueiro; Baltazar Lisboa; Dona Júlia; Machado de Assis; e Manuel de Paiva/ Vila Mariana
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021.0021377-9
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mai/2024
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

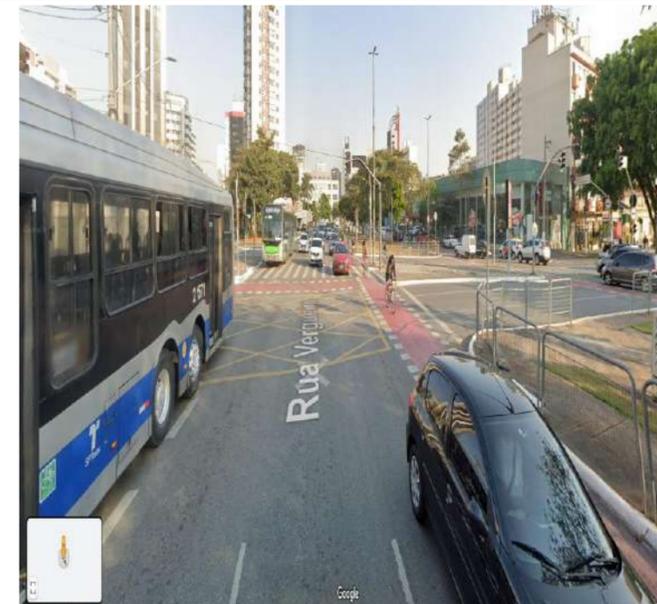


Foto antes da Intervenção.
Set/2022

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 1.110.821,86	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 5.554.109,30	
Valor Pago	R\$ 3.256.937,33	


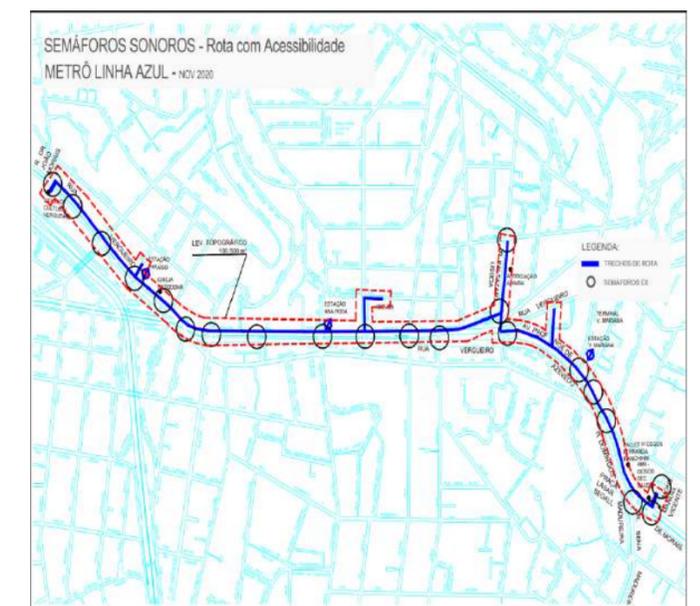


Foto em Execução
Nov/2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Rotas Acessíveis para Pessoas com Deficiência Vila Mariana(MOB)

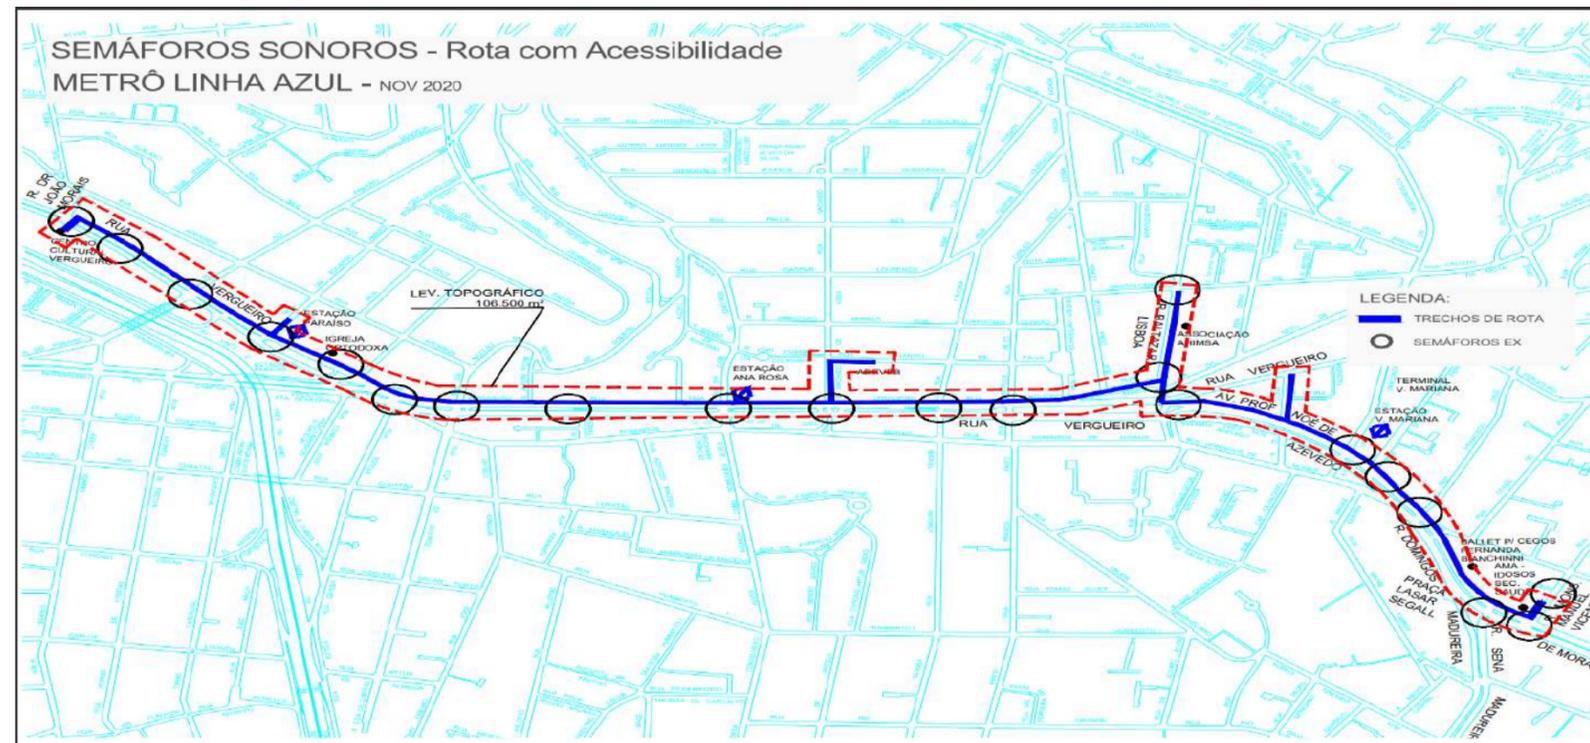

Local . Rua Vergueiro
Foto Projeto Funcional
Nov/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Travessia Segura – 200 projetos de avanços de calçada/ilhas de refúgios (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Projeto de Redesenho Urbano
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Aricanduva, Butantã, Campo Limpo, Capela Do Socorro, Casa Verde, Cidade Tiradentes, Freguesia Do ó-Brasilândia, Guaianazes, Ipiranga, Itaim Paulista, Itaquera, Jabaquara, Jaçanã - Tremembé, Lapa, M'boi Mirim, Mooca, Penha, Perus, Pinheiros, Pirituba - Jaraguá, Santana - Tucuruvi, Santo Amaro, São Mateus, São Miguel, Sapopemba , Sé, Vila Maria - Vila Guilherme, Vila Mariana, Vila Prudente
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2021.0021377-9
Início da Obra	Jun/2023
Previsão de Término	Mai/2024
Unidade de Medida	Número de projetos de redesenho urbano implantados
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

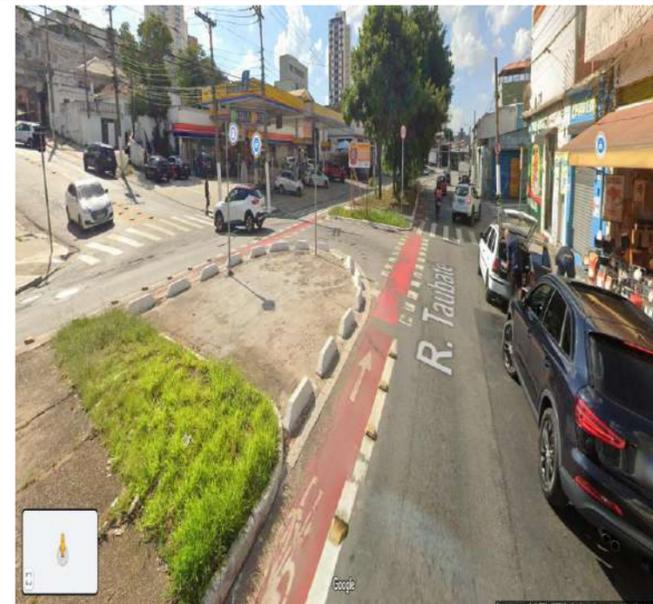


Foto antes da Intervenção.
Abr/2024

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 1.110.821,86	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 5.554.109,30	
Valor Pago	R\$ 3.256.937,33	

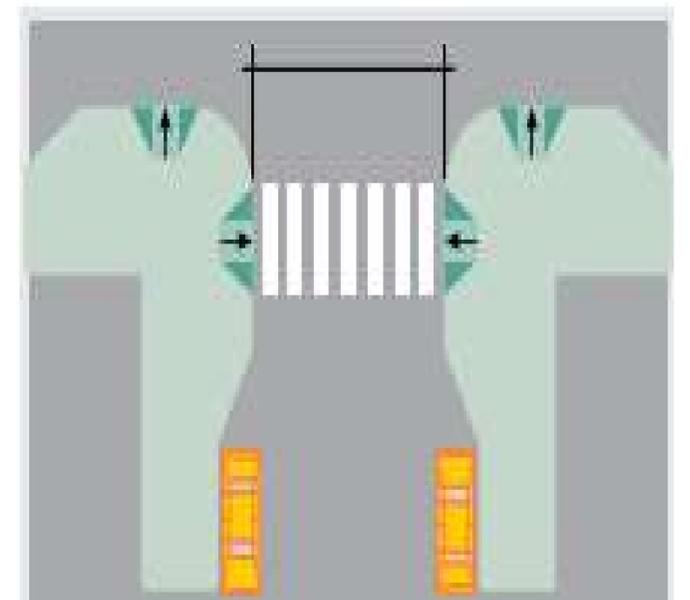


Foto em Execução
Jan/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Travessia Segura – 200 projetos de avanços de calçada/ilhas de refúgios (MOB)



*Local Av. Marechal Tito
Foto antes da Intervenção.
Abr/2024.*



*Local José P. de Carvalho
Foto antes da Intervenção.
Jan/2024.*



*Local Av. Marechal Tito, 256
Foto antes da Intervenção.
Abr/2024.*



*Local Av. Nordestina, 185
Foto antes da Intervenção.
Jul/2023.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Contratação de Projeto de segurança viária: Travessia Segura – 200 projetos de avanços de calçada/ilhas de refúgios (MOB)



*Local Rua Divinópolis
Foto em Execução
Jan/2024.*



*Local Rua Divinópolis
Foto em Execução
Jan/2024.*



*Local Av. João Batista Conti
Foto em Execução
Jul/2024.*



*Local Av. Nordestina, 185
Foto em Execução
Mar/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Viaduto Itinguçu (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Viaduto Itinguçu/Penha
Situação	Concluído – 100% concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0006132-6
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 633.735,74	
Valor Pago	R\$ 0	



*Foto antes da Intervenção.
Jan/2024*



*Foto em Execução
Jan/2024.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Viaduto Itinguçu (**MOB**)



*Local Av. Itinguçu
Foto em Execução
Jan/2024.*



*Local . Rua Júlio Sayago
Foto em Execução
Jan/2024.*



*Local Av. Itinguçu
Foto em Execução
Jan/2024.*



*Local Rua Júlio Sayago, 377
Foto em Execução
Jan/2024.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Nagib Farah Maluf (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Nagib Farah Maluf/ São Miguel Paulista
Situação	Em andamento – 0% concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0006132-6
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 633.735,74	
Valor Pago	R\$ 0	




*Foto antes da Intervenção.
Abr/2024*

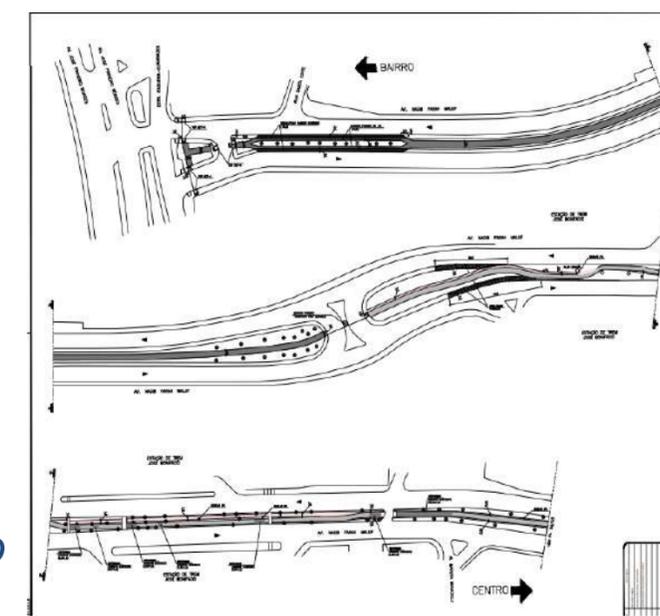


*Foto em Execução
Jul/2020.*


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Nagib Farah Maluf (MOB)

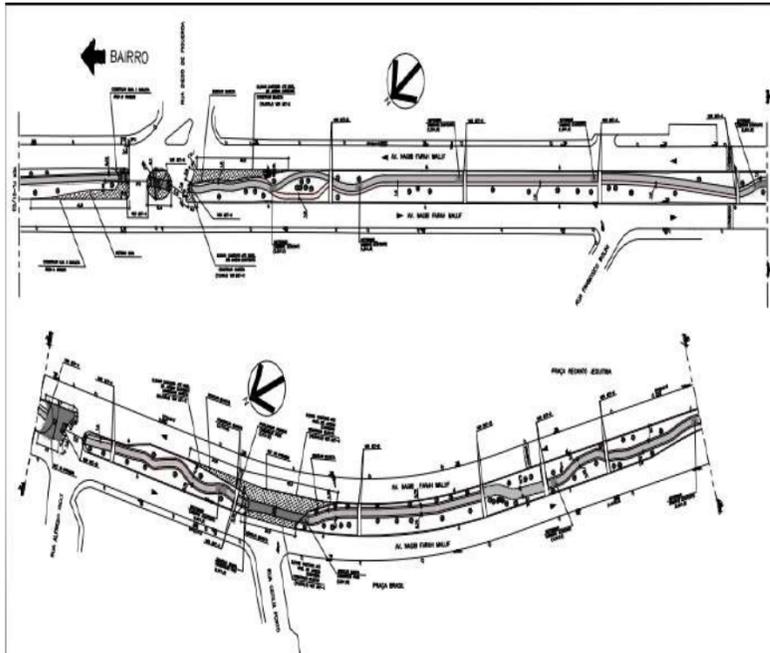


Local Av. Nagib Farah Maluf
Foto Projeto Funcional
Jul/2020.

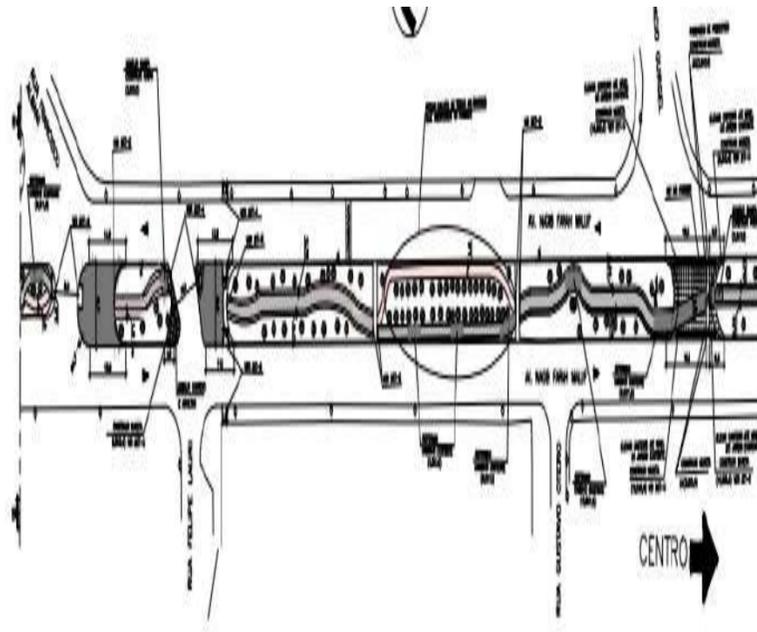

Local .Av. Nagib Farah Maluf
Foto Projeto Funcional
Jul/2020.

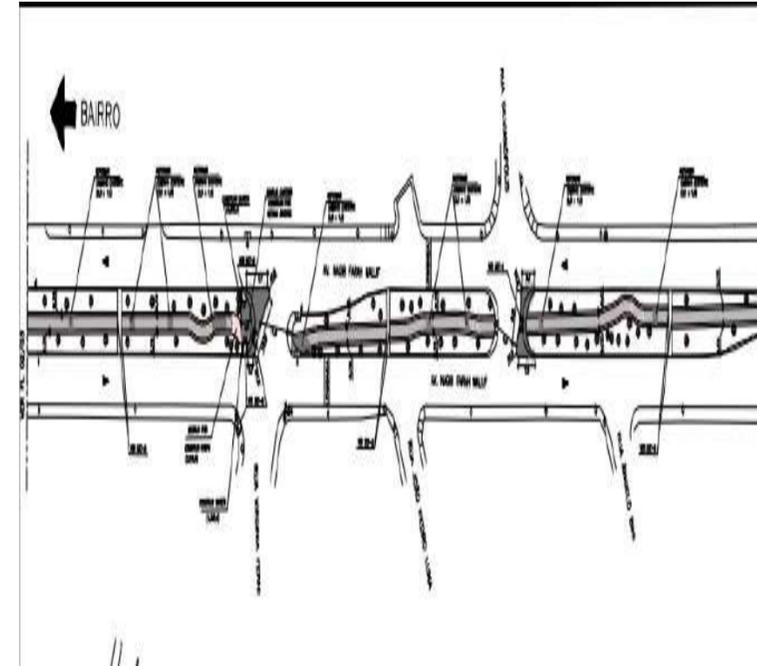

Local Av. Nagib Farah Maluf
Foto Projeto Funcional
Jul/2020.

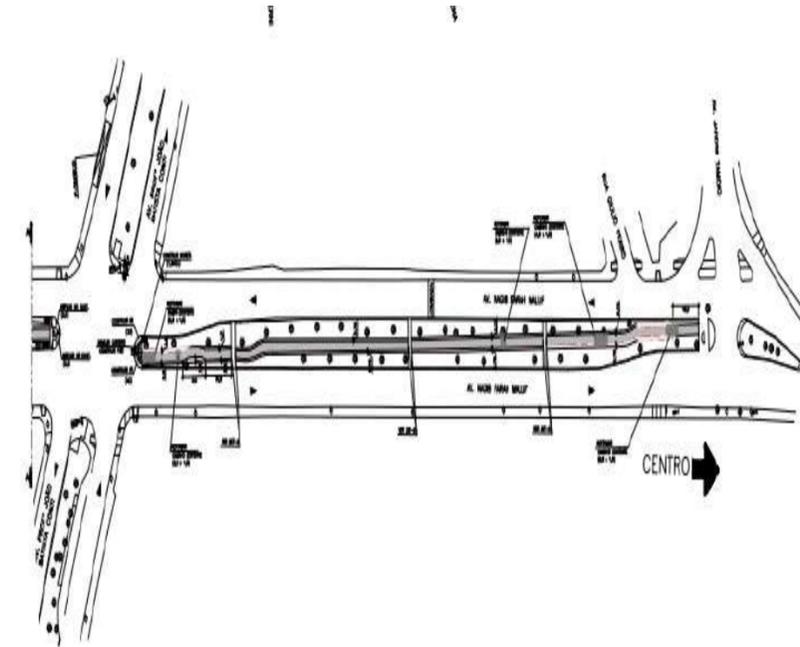

Local Av. Nagib Farah Maluf
Foto Projeto Funcional
Jul/2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas João Batista Conti (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Prof João Batista Conti/Itaquera
Situação	Em andamento – 50% concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0006132-6
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 633.735,74	
Valor Pago	R\$ 0	



*Foto antes da Intervenção.
Out/2022*

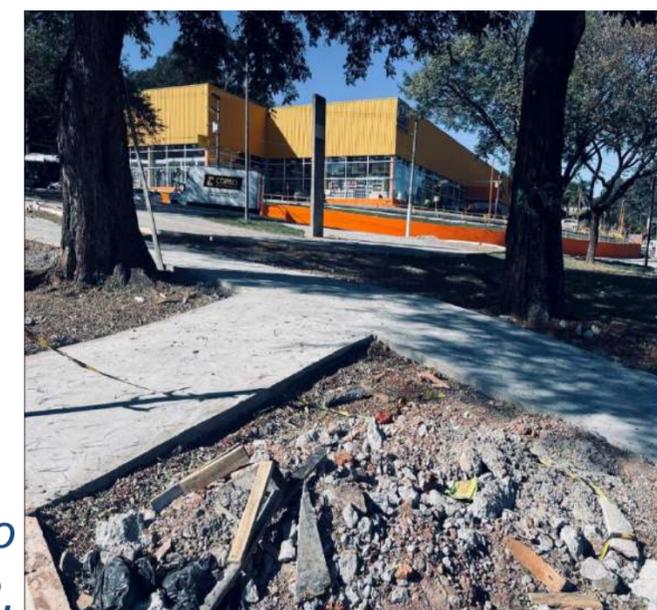

*Foto em Execução
Mar/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024
DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas João Batista Conti (MOB)



*Local Av. Prof. João Batista
Conti
Foto em Execução
Mar/2022.*



*Local . Av. Prof. João Batista
Conti
Foto em Execução
Mar/2022.*



*Local . Av. Prof. João Batista
Conti
Foto em Execução
Mar/2022.*



*Local . Av. Prof. João Batista
Conti
Foto em Execução
Mar/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Jacu Pessêgo (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Jacu-Pêssego/São Miguel e Itaquera
Situação	Em andamento – 90%
Processo Administrativo	6020.2022/0006132-6
Início da Obra	Mai/2024
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 633.735,74	
Valor Pago	R\$ 0	

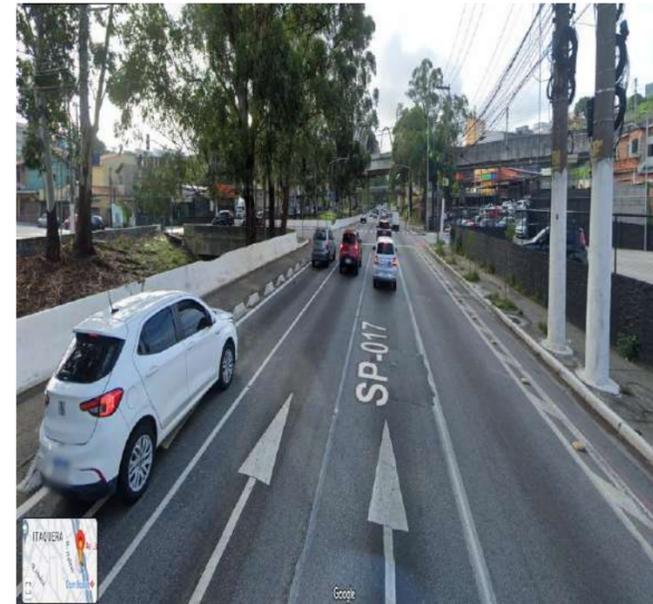
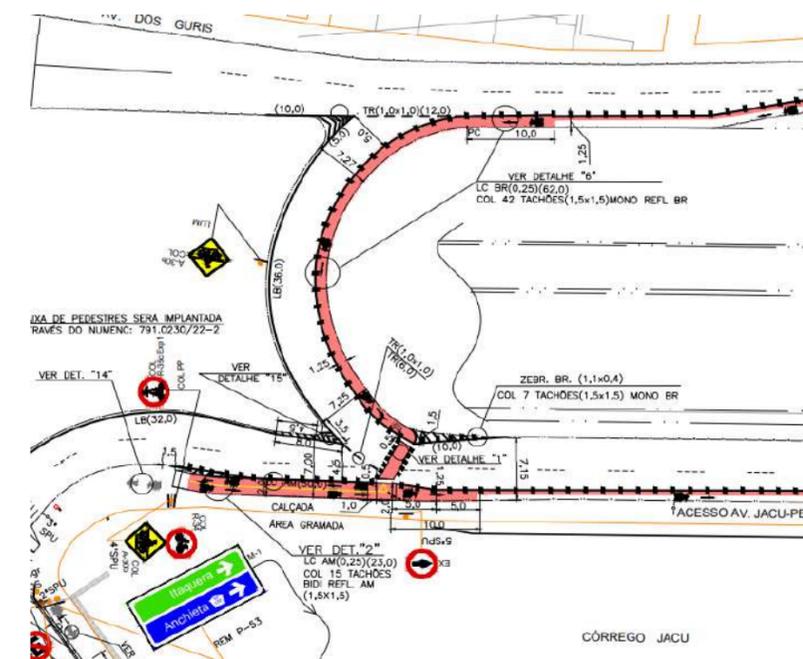


Foto antes da Intervenção.
Abr/2024

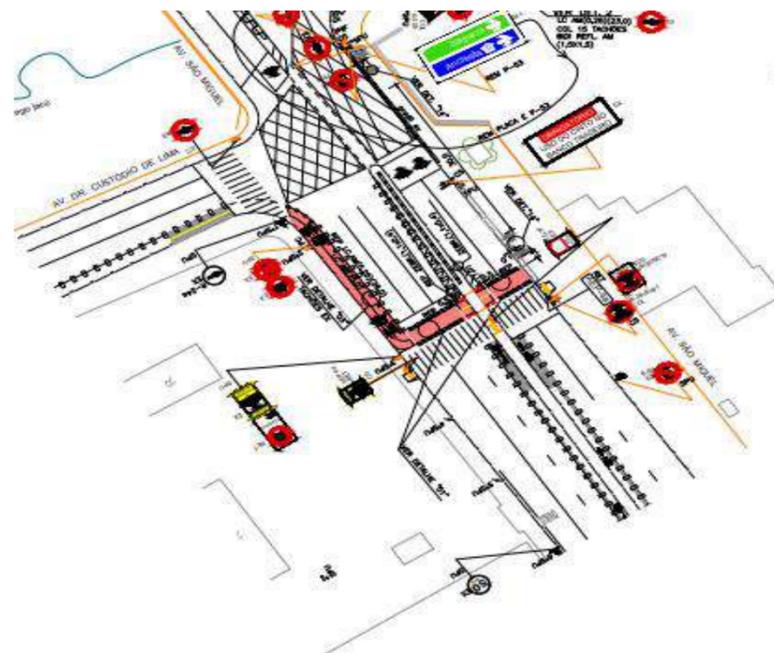


Foto em Execução
Ago/2024.


OBJETO Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Jacu Pêssego (MOB)




Local Av. Jacu Pêssego
Foto Projeto Funcional
Mai/2020.



Local Av. Jacu Pêssego
Foto Projeto Funcional
Mai/2020.

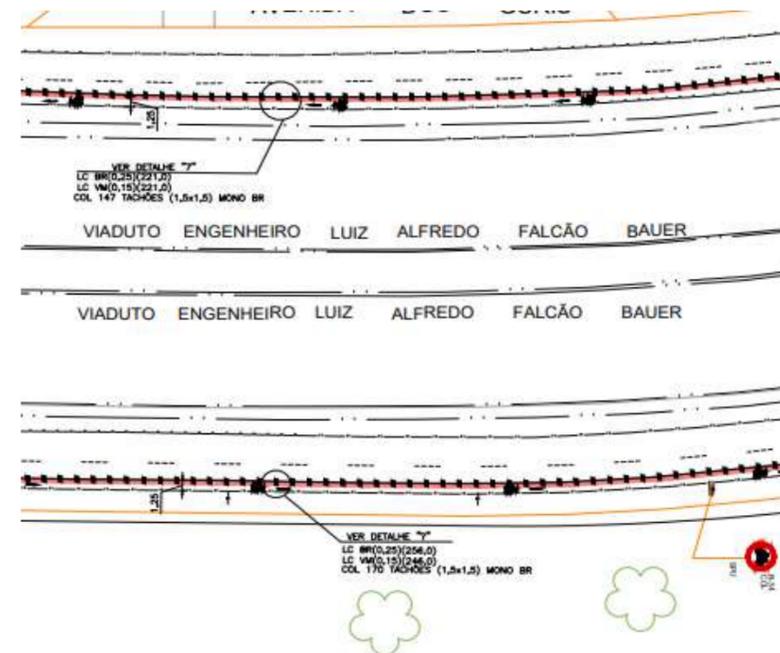

Local Av. Jacu Pêssego
Foto Projeto Funcional
Mai/2020.

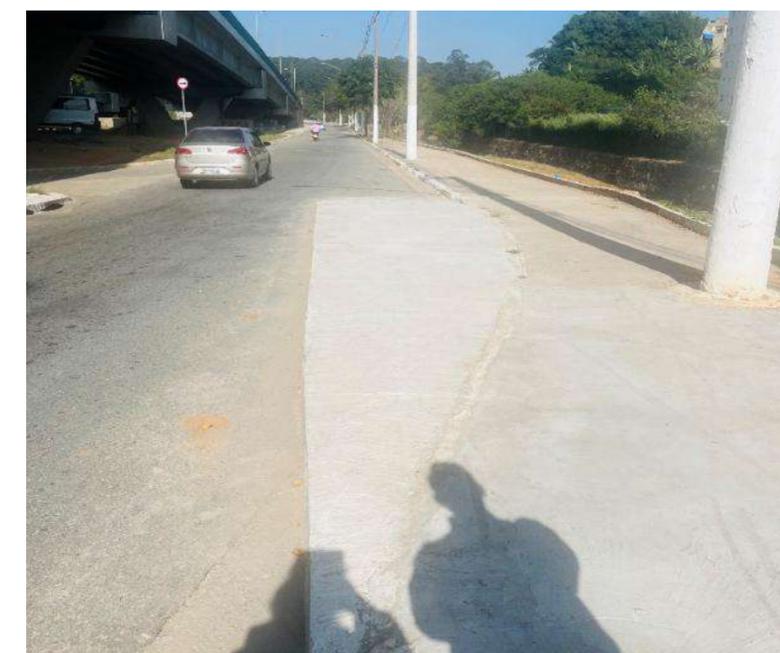

Local . Av. Jacu Pêssego
Foto em Execução
Ago/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Raimundo Pereira de Magalhães (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Raimundo Pereira de Magalhães/ Pirituba/Jaraguá
Situação	Em andamento – 99 % concluído
Processo Administrativo	
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.192.590,37	
Valor Pago	R\$ 380.870,83	



*Foto antes da Intervenção.
Abr/2024*



*Foto em Execução
Jan/2024.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Raimundo Pereira de Magalhães (MOB)



*Local Av. Raimundo Pereira de
Magalhães
Foto em Execução
Mai/2024.*

*Local Av. Raimundo Pereira de
Magalhães
Foto em Execução
Abr/2024.*

*Local Av. Raimundo Pereira de
Magalhães
Foto em Execução
Abr/2024.*

*Local Av. Raimundo Pereira de
Magalhães
Foto em Execução
Abr/2024.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Ponte Jaguaré (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Ponte Jaguaré/Lapa
Situação	Em andamento – 60% concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0006133-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.192.590,37	
Valor Pago	R\$ 380.870,83	

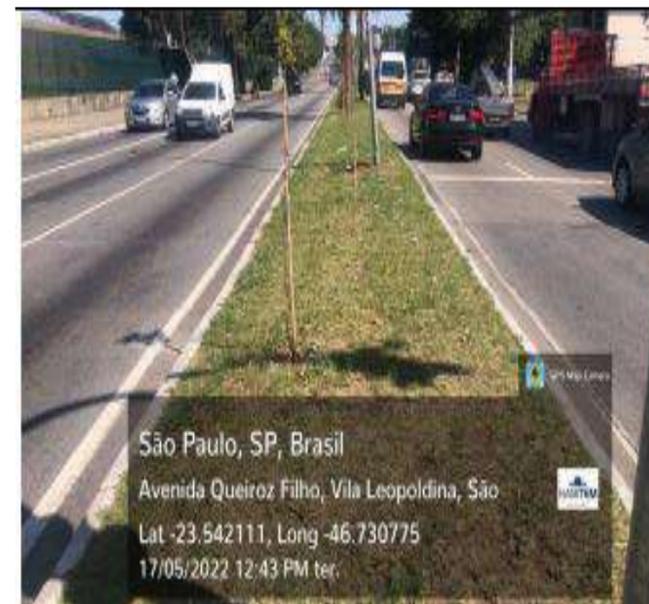

*Foto antes da Intervenção.
Mar/2022*



*Foto em Execução
Jun/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Ponte Jaguaré (**MOB**)



*Local Av. Queiroz Filho
Foto em Execução
Jun/2022*



*Local Av. Queiroz Filho 1560
Foto em Execução
Jun/2022*



*Local Rua Rinaldo Rivetti
Foto em Execução
Jun/2022.*



*Local Av. Queiroz Filho
Foto em Execução
Jun/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Praça Campo de Bagatelle (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Praça Campo de Bagatelle/ Santana/ Tucuruvi
Situação	Concluído – 100% concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0006133-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.192.590,37	
Valor Pago	R\$ 380.870,83	



*Foto antes da Intervenção.
Jun/2022*



*Foto em Execução
Jun/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Praça Campo de Bagatelle (**MOB**)



*Local Rua Santa Eulália
Foto em Execução
Mai/2022.*



*Local . Av. Santos Dumont
Foto em Execução
Mai/2022.*



*Local Av.Santos Dumont
Foto em Execução
Mai/2022.*



*Local Av.Santos Dumont
Foto em Execução
Mai/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Viaduto Abraão Ribeiro (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Dr. Abraão Ribeiro/Lapa
Situação	Concluído – 100% concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0006133-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.192.590,37	
Valor Pago	R\$ 380.870,83	



*Foto antes da Intervenção.
Mai/2024*



*Foto em Execução
Jan/2024.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Viaduto Abraão Ribeiro (**MOB**)



*Local Av.Dr. Abraão Ribeiro
Foto em Execução
Mai/2024.*



*Local Av.Dr. Abraão Ribeiro
Foto em Execução
Mai/2024.*



*Local Av.Dr. Abraão Ribeiro
Foto em Execução
Abr/2024.*



*Local Av.Dr. Abraão Ribeiro
Foto em Execução
Abr/2024.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Ponte Freguesia do Ó (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Ponte Freguesia do Ó/ Casa Verde/Cachoeirinha
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0006133-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.192.590,37	
Valor Pago	R\$ 380.870,83	



Foto antes da Intervenção.
Abr/2024



Foto em Execução
Jan/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Ponte Freguesia do Ó (**MOB**)




*Local Rua Francisco Luiz de Souza Jr
Foto em Execução
Mai/2023.*



*Local . Rua Miguel Casagrande
Foto em Execução
Mai/2023.*



*Local . Rua Miguel Casagrande
Foto em Execução
Mai/2023.*

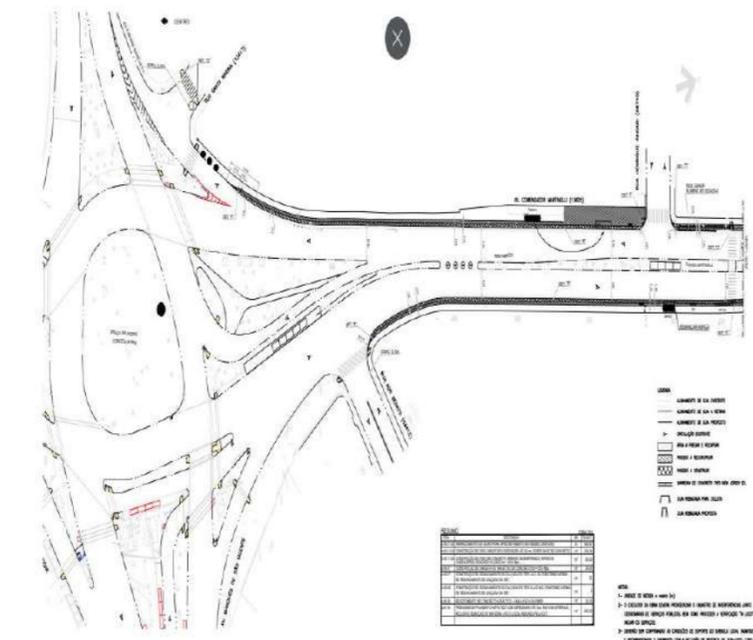

*Local Av. Comendador Martinelli
Foto Projeto Funcional
Abr/2022*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Alvarenga (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Alvarenga/ Butantã
Situação	Concluído – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0006133-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.192.590,37	
Valor Pago	R\$ 380.870,83	



*Foto antes da Intervenção.
Abr/2023*



*Foto em Execução
Abr/2023.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Alvarenga(MOB)



*Local Rua Alvarenga
Foto em Execução
Abr/2023.*



*Local Rua Alvarenga
Foto em Execução
Abr/2023.*



*Local Rua Alvarenga
Foto em Execução
Abr/2023.*



*Local Rua Alvarenga
Foto em Execução
Abr/2023.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL/FINAL 20XX

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Mutinga (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Mutinga, Rua Ana Paulina/ Pirituba/Jaraguá
Situação	Em andamento – 90% concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0006133-4
Início da Obra	
Previsão de Término	
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.192.590,37	
Valor Pago	R\$ 380.870,83	

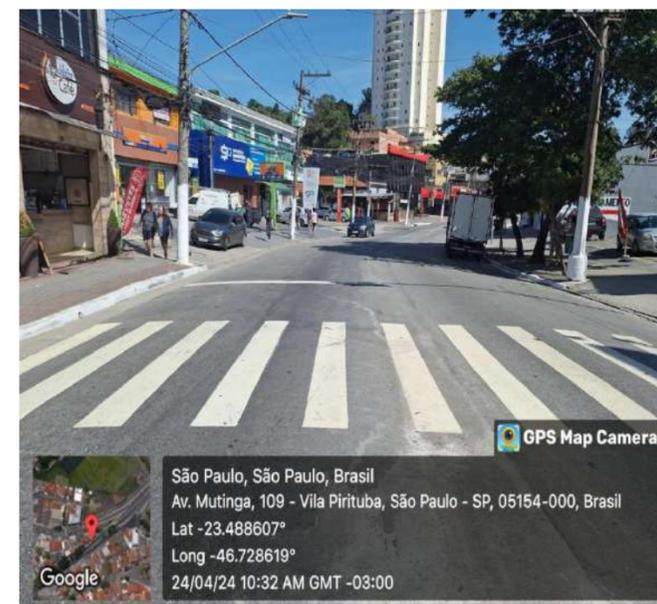

*Foto antes da Intervenção.
Abr/2024*



*Foto em Execução
Abr/2024.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Mutinga(MOB)




*Local Av. Mutinga
Foto em Execução
Abr/2024.*



*Local Av. Mutinga
Foto em Execução
Abr/2024.*

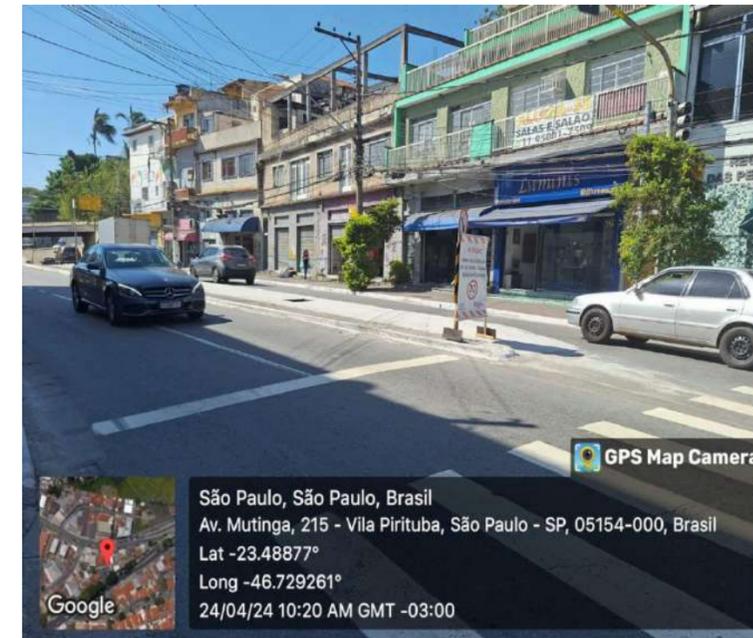

*Local Av. Mutinga
Foto em Execução
Abr/2024.*

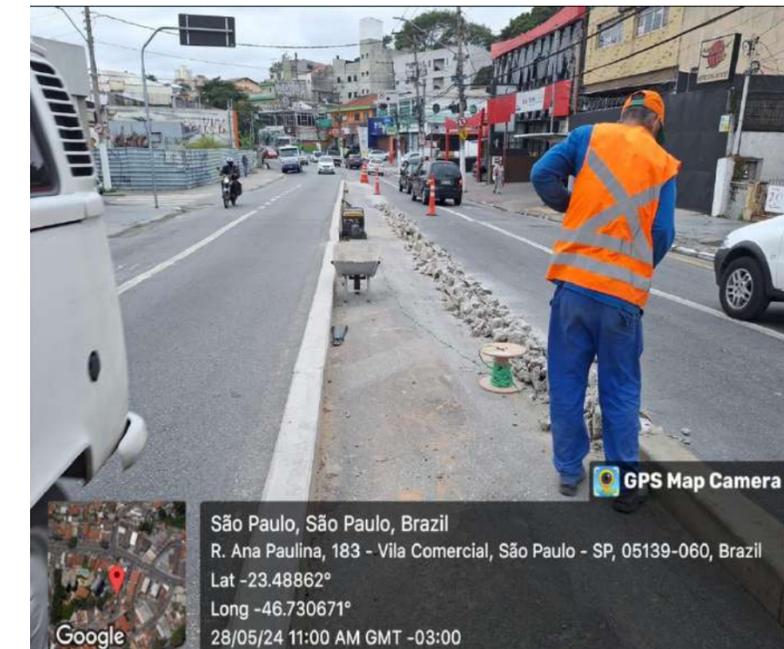

*Local Rua Ana Paulina
Foto em Execução
Mar/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Ordem e Progresso (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Ordem e Progresso/ Lapa
Situação	Concluído – 100% concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0006133-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.192.590,37	
Valor Pago	R\$ 380.870,83	



Foto antes da Intervenção.
Dez/2022


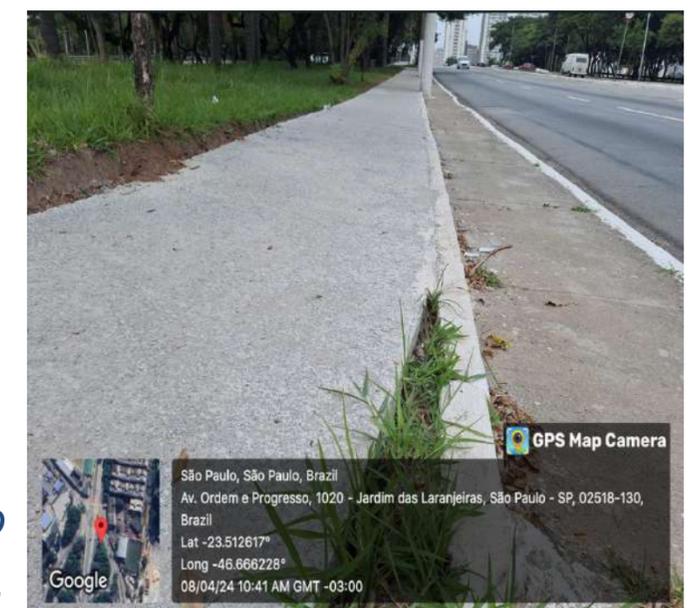


Foto em Execução
Abr/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Ordem e Progresso (**MOB**)

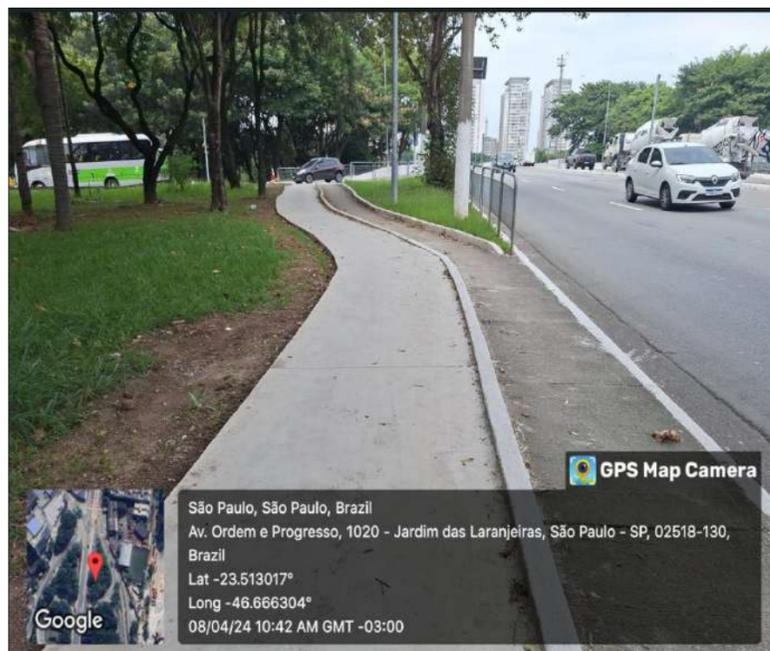

*Local Av. Ordem e Progresso
Foto em Execução
Abr/2024.*



*Local Av. Ordem e Progresso
Foto em Execução
Abr/2024.*

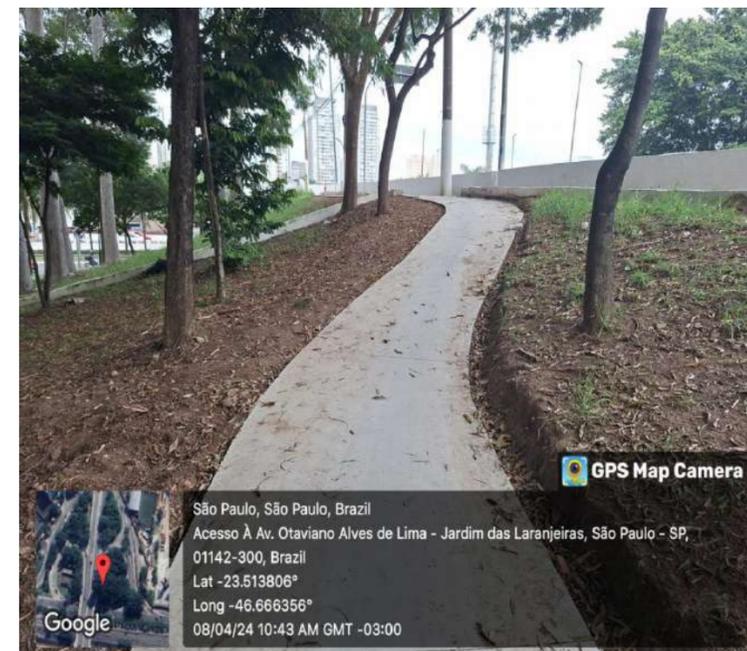

*Local Av. Ordem e Progresso
Foto em Execução
Abr/2024.*



*Local Av. Ordem e Progresso
Foto em Execução
Abr/2024.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Armando Arruda Pereira (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Armando Arruda Pereira, Dr Hugo Beolchi e Av. George Corbisesie/ Jabaquara
Situação	Em andamento – 99% concluído
Processo Administrativo	6020.2020/0005064-9
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.048.848,94	
Valor Pago	R\$ 0,00	



*Foto antes da Intervenção.
Set/2021*



*Foto em Execução
Nov/2022.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Armando Arruda Pereira (MOB)



*Local Av. Eng. George Corbisié
Foto em Execução
Nov/2022*

*Local Av. Eng. George Corbisié
Foto em Execução
Nov/2022*

*Local Av. Dr. Hugo Beolchi
Foto em Execução
Dez/2022.*

*Local Av. Dr. Hugo Beolchi
Foto em Execução
Dez/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Carlos Caldeira (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Carlos Caldeira/Campo Limpo
Situação	Em andamento – 0% concluído
Processo Administrativo	6020.2020/0005064-9
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim






*Foto antes da Intervenção.
Mar/2022*

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.048.848,94	
Valor Pago	R\$ 0,00	

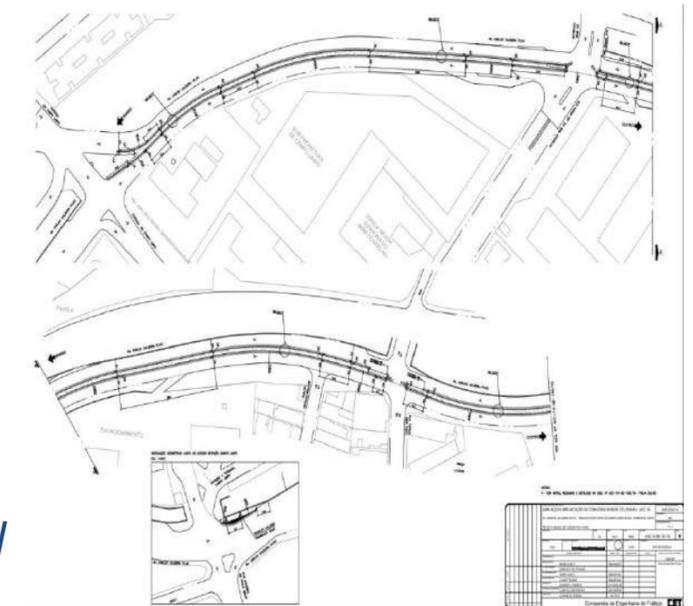

*Foto Projeto Funcional
Mai/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Carlos Caldeira Filho(MOB)

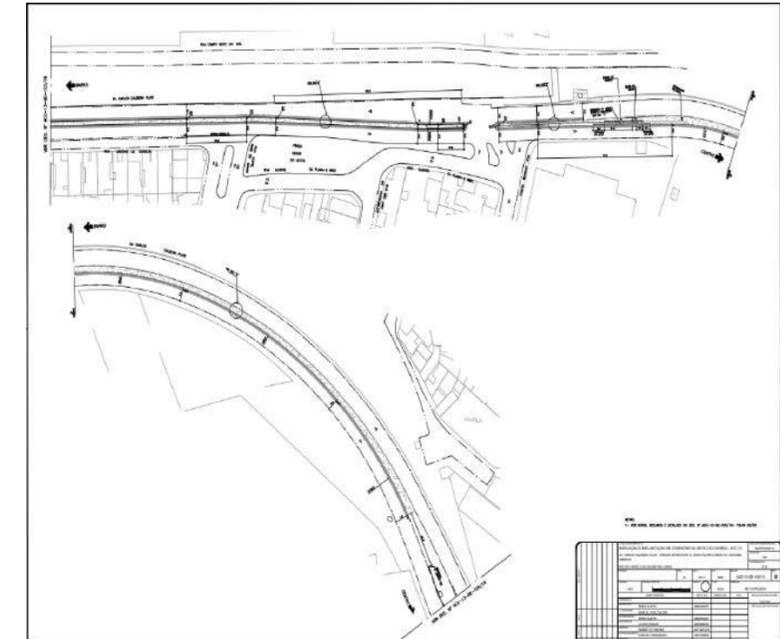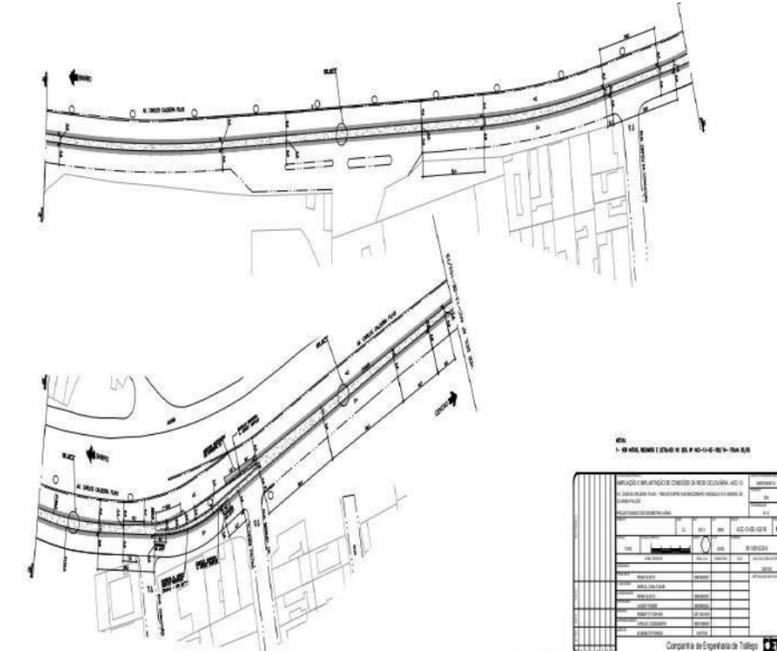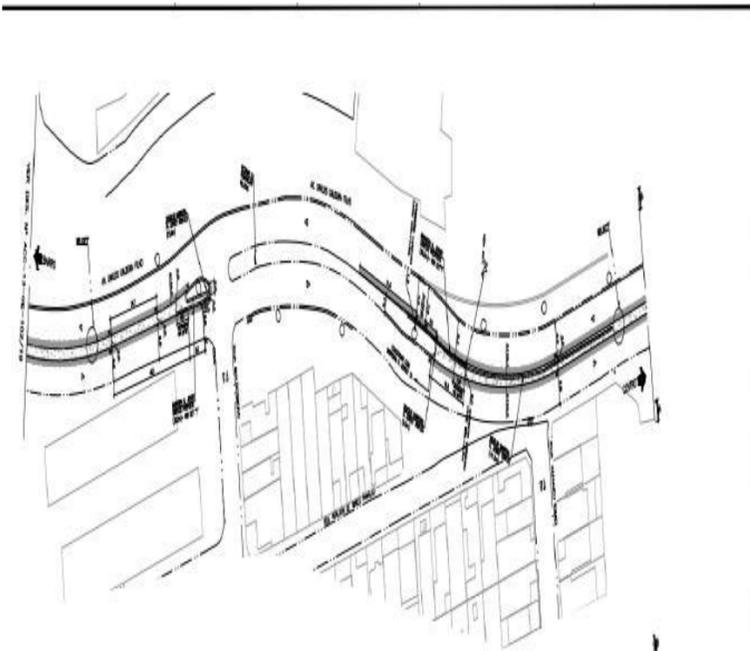

Local Av. Carlos Caldeira Filho
Foto Projeto Funcional
Mai/2023

Local Av. Carlos Caldeira Filho
Foto Projeto Funcional
Mai/2023

Local Av. Carlos Caldeira Filho
Foto Projeto Funcional
Mai/2023

Local Av. Carlos Caldeira Filho
Foto Projeto Funcional
Mai/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Radial Leste (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Radial Leste/ Mooca
Situação	Em andamento – 30 % concluído
Processo Administrativo	6020.2020/0005064-9
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 266.666,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 1.048.848,94	
Valor Pago	R\$ 0,00	




*Foto antes da Intervenção.
Out/2023*

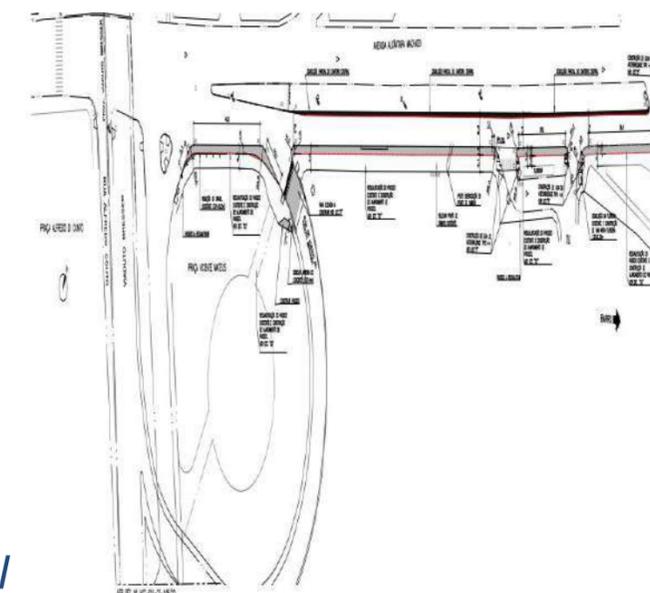

*Foto Projeto Funcional
Mar/2020.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Radial Leste (**MOB**)

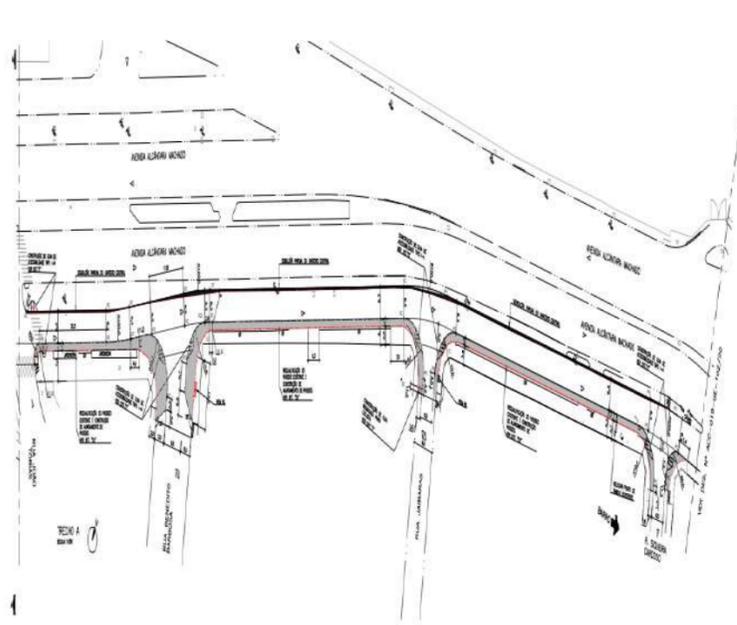


Local Av. Alcântara Machado
Foto Projeto Funcional
Mar/2020.



Local Av. Alcântara Machado
Foto Projeto Funcional
Mar/2020.



Local Av. Alcântara Machado
Foto Projeto Funcional
Mar/2020.

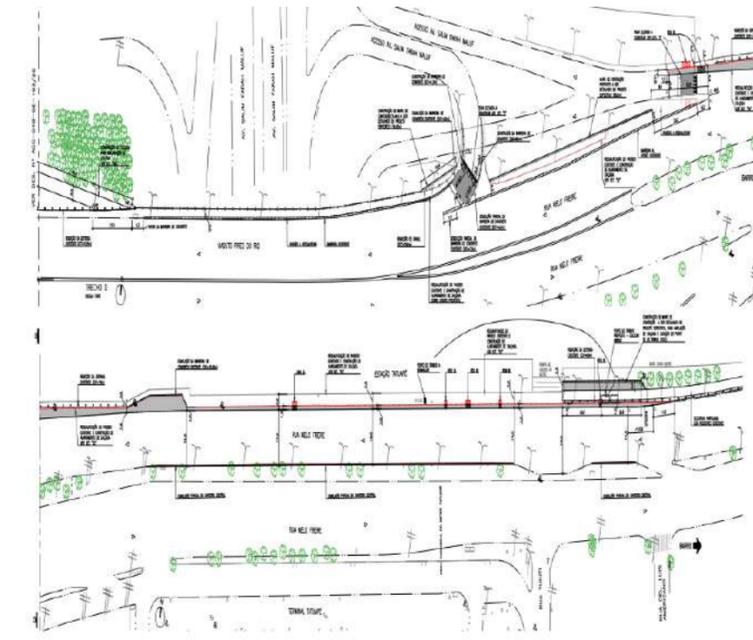

Local Rua Melo Freire
Foto Projeto Funcional
Mar/2020.


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Cipriano Barata (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Cipriano Barata; R. Dom Lucas Obes; R. dos Patriotas/ Ipiranga
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038385-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 1.226.180,68	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0 00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

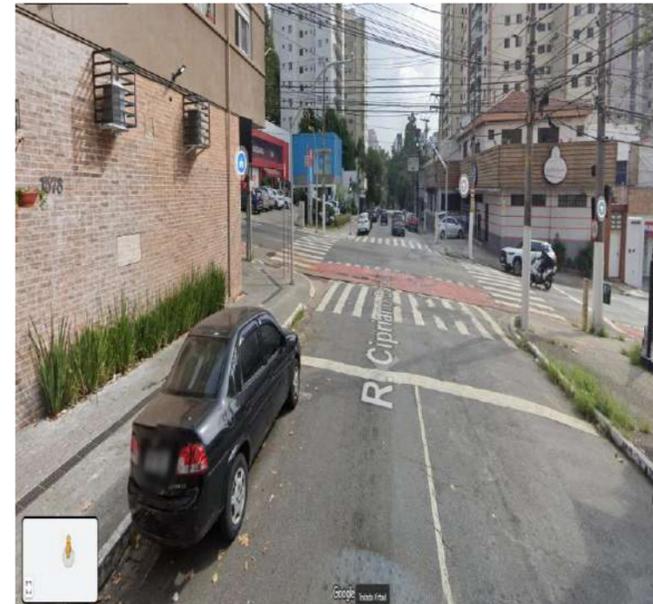

*Foto antes da Intervenção.
Abr/2024*

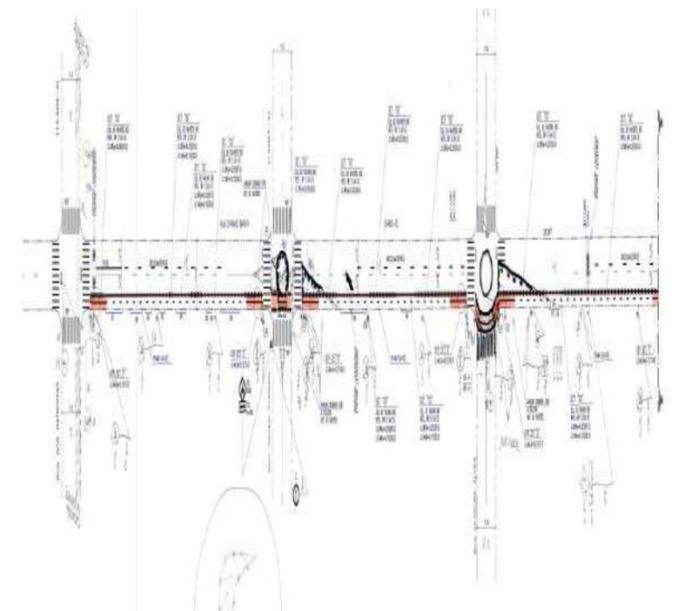


*Foto Projeto Funcional
Ago/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Cipriano Barata (**MOB**)

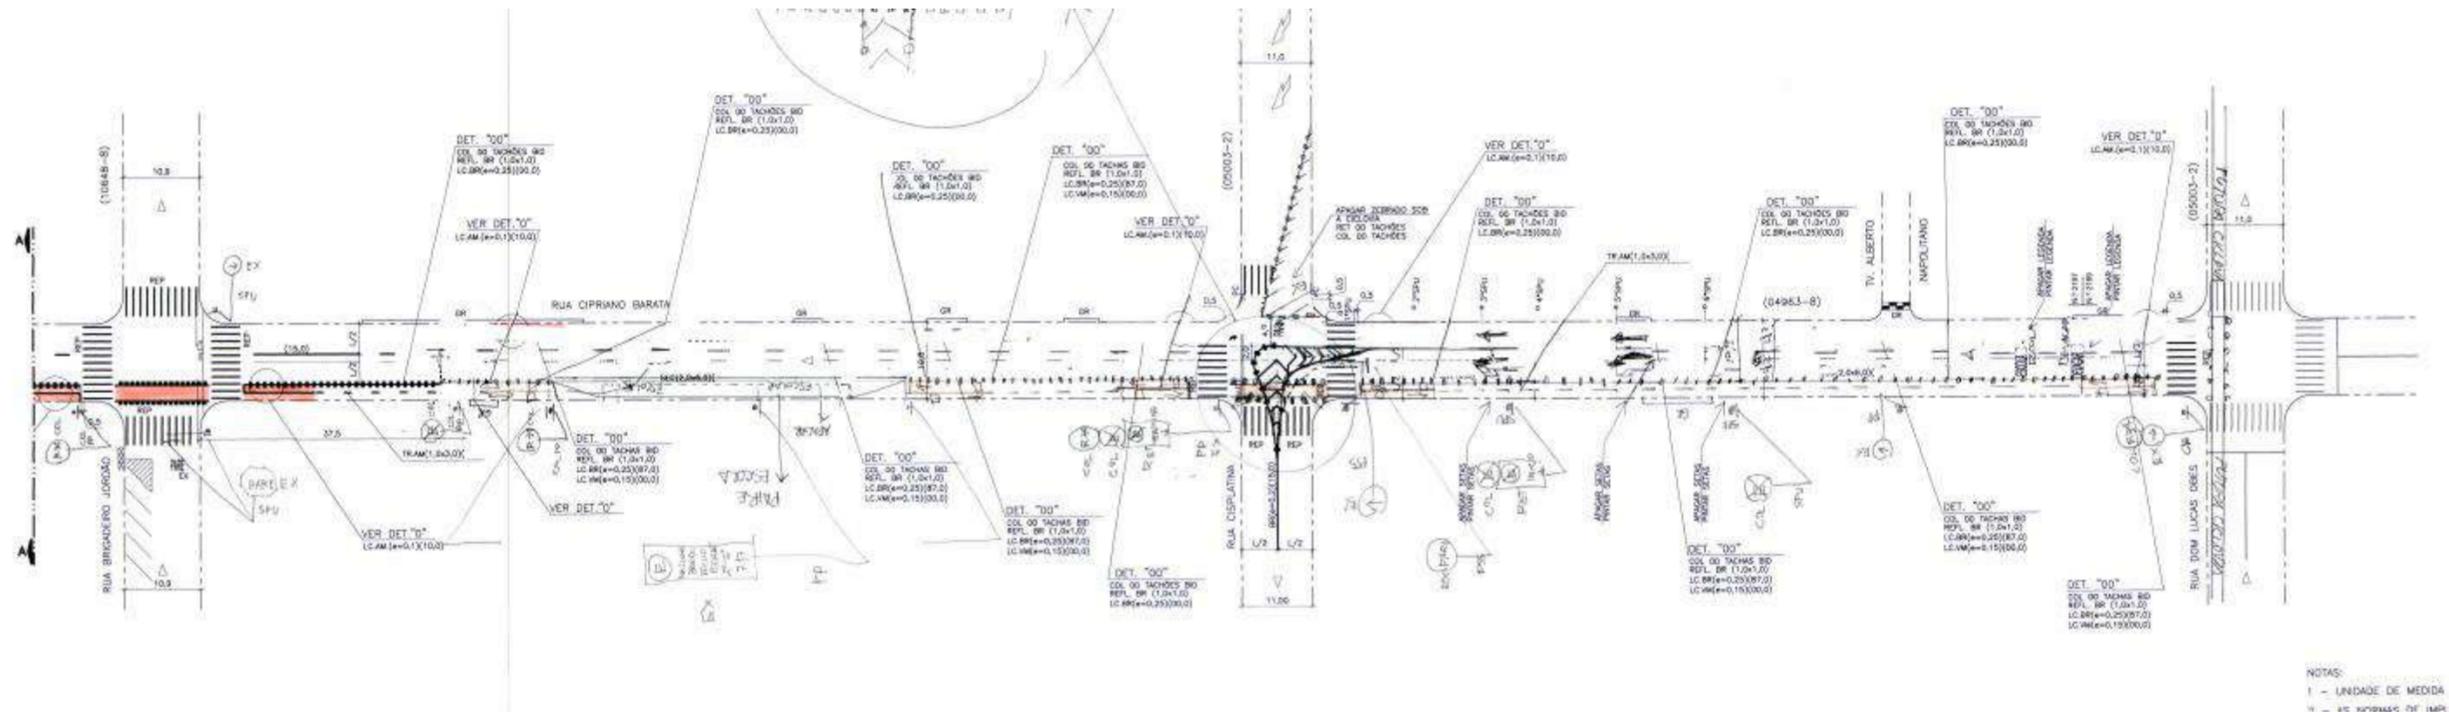

Local Rua Cipriano Barata
Foto Projeto Funcional
Ago/2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Antonio Carlos da Fonseca (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Bosque da Saúde; Av Prof. Abraao De Moraes; R. Diogo Freire; Pça. Brás Gonçalves; R Francisco Dias; R França Junior; Pç. Cristiano S das Neves (viela); R Pierre Curie; R Antonio Carlos da Fonseca; Av. Osvaldo Aranha; Av Inhaiba; R. Vergueiro; Av. Pres. Tancredo Neves/ Ipiranga
Situação	Em andamento – 65 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038385-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim




*Foto antes da Intervenção.
Mar/2023*

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 5.271.384,45	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

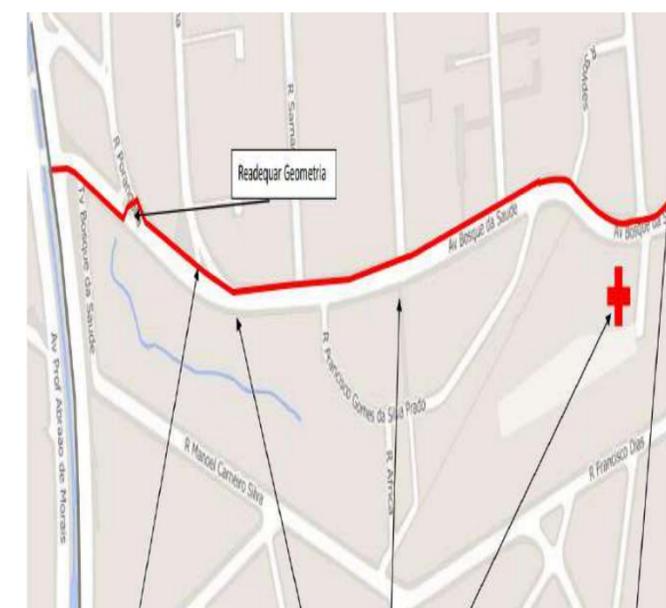


*Foto Projeto Funcional
Ago/2022.*


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Antonio Carlos da Fonseca (MOB)

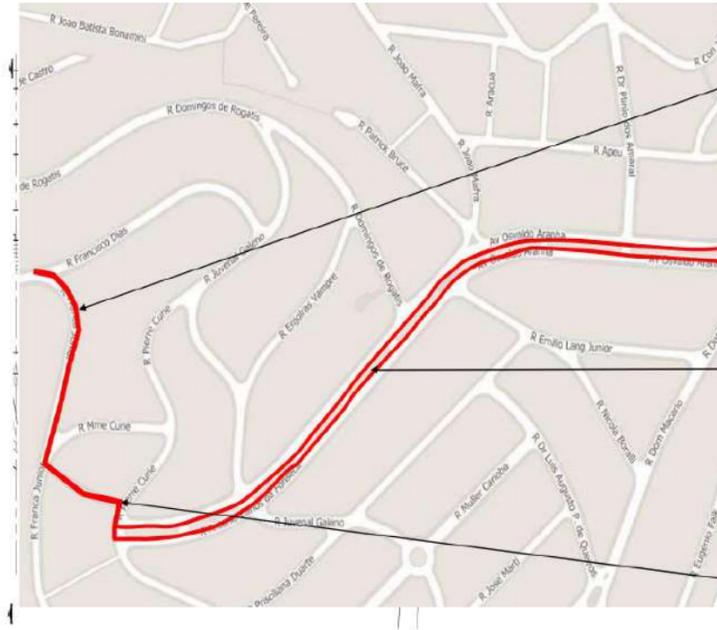


Local Av. Oswaldo Aranha
Foto Projeto Funcional
Ago/2022

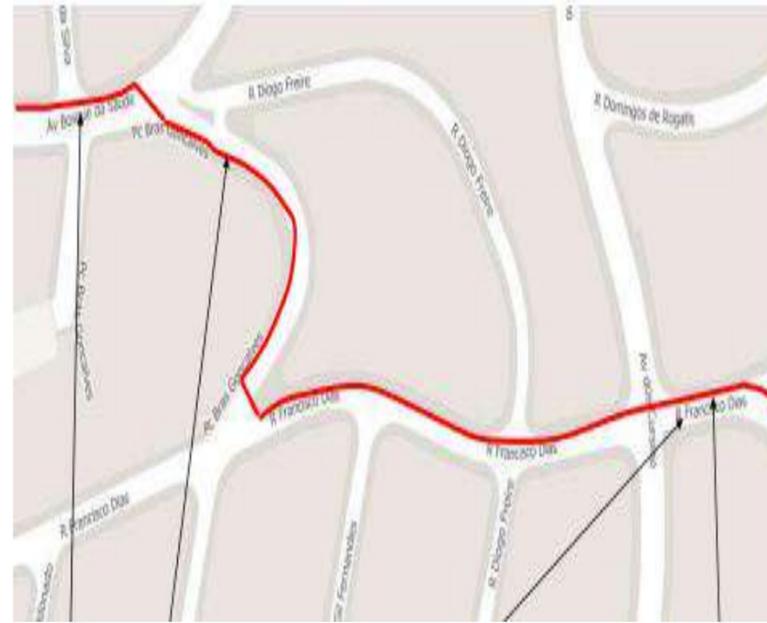

Local Rua Francisco Dias
Foto Projeto Funcional
Ago/2022.

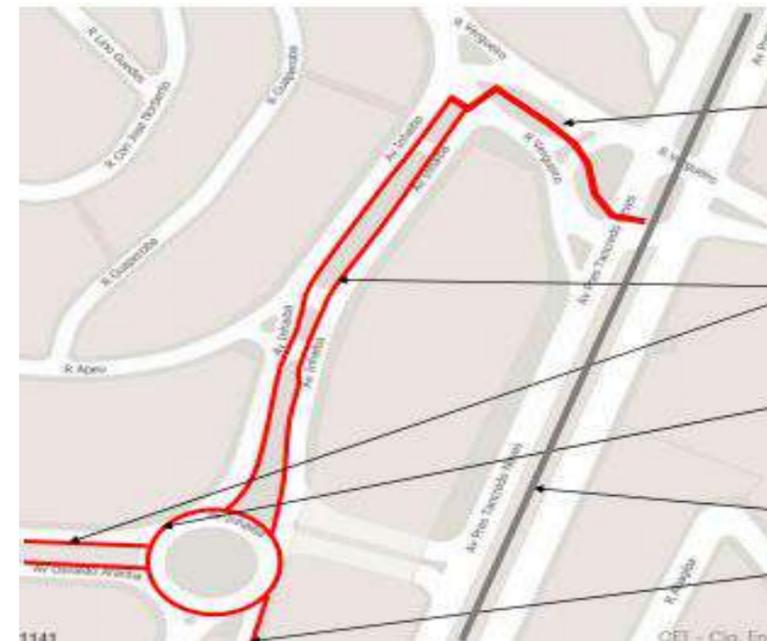

Local Av. Inhaíba
Foto Projeto Funcional
Ago/2022

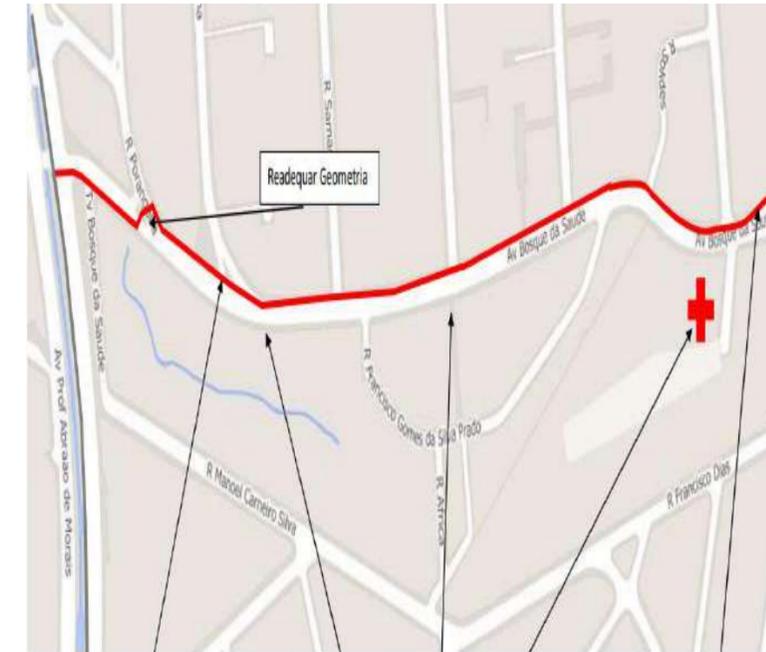

Local Av. Bosque da Saúde
Foto Projeto Funcional
Ago/2022


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Dom Macario (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R Dom Macario; Av Osvaldo Aranha; R Dr Luis Augusto Pereira de Queiros; Av. Pres. Tancredo Neves; R. Dr. Nicolau Alberto Defina; R Divinópolis; R do Boqueirão/ Ipiranga
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038385-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 3.918.887,25	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

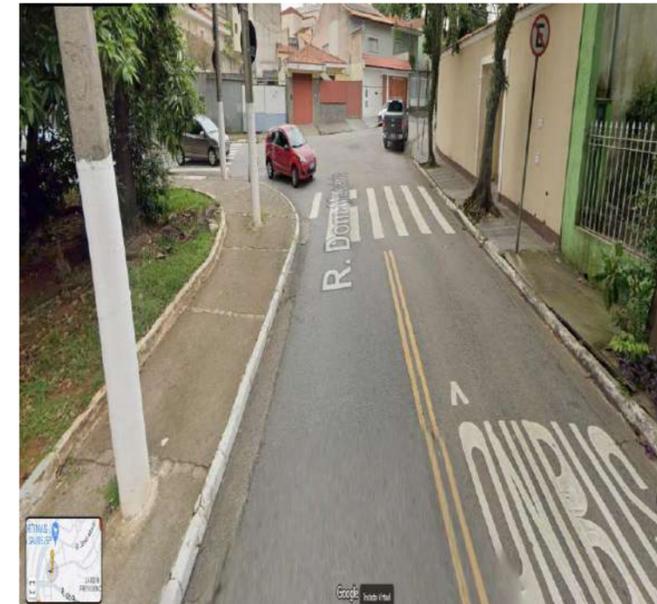


*Foto antes da Intervenção.
Jan/2024*



*Foto Projeto Funcional
Ago/2022.*


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Dom Macario (**MOB**)

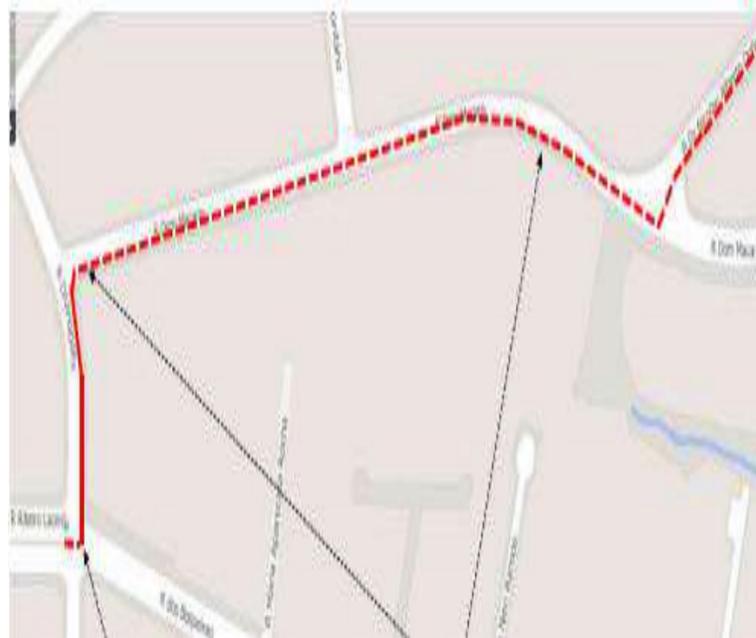

Local Rua Dom Macario
Foto Projeto Funcional
Ago/2022.



Local Rua Dom Macario
Foto Projeto Funcional
Ago/2022.

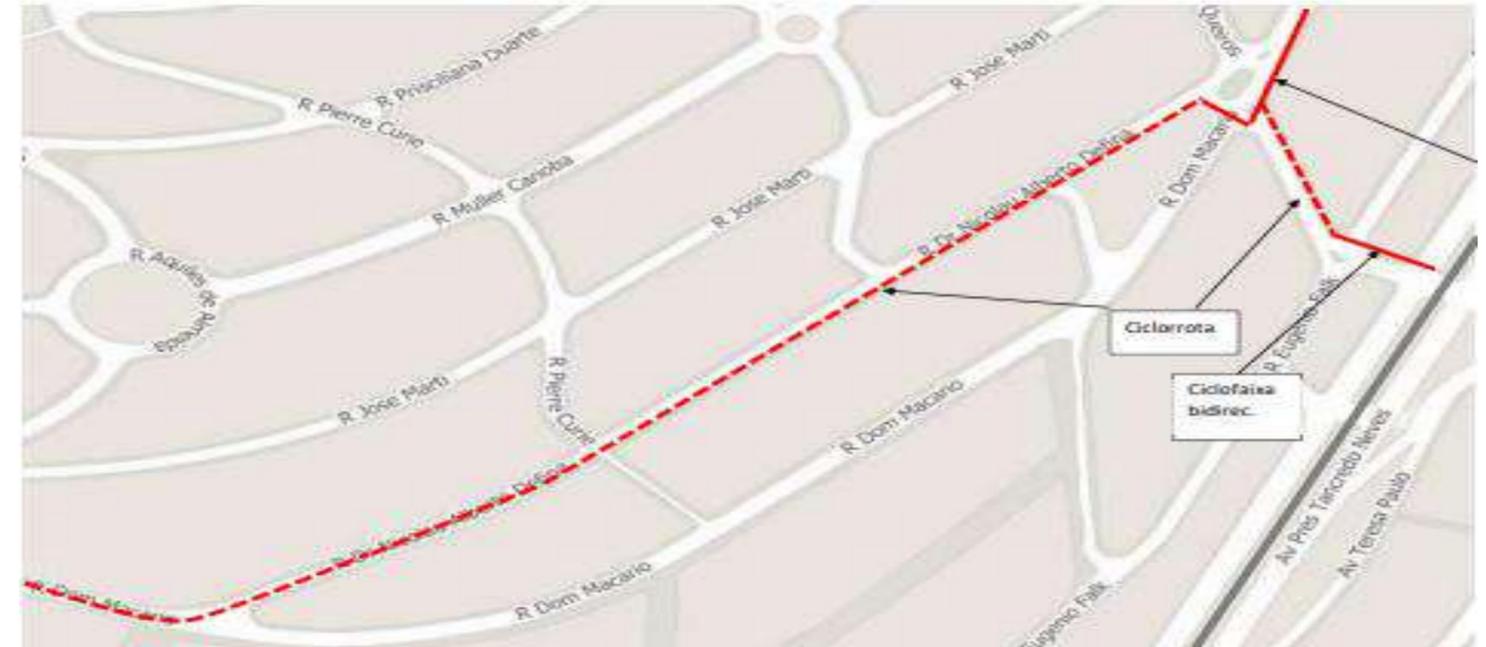

Local Rua Dr. Nicolau Alberto
Delfina
Foto Projeto Funcional
Ago/2022

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas José dos Reis (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Ibitirama; Pça. Pe. Lourenço Barendse; R. José dos Reis; R. Oliveira Gouveia; Av. Prof. Luiz I. De A Mello/ Vila Prudente
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038385-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

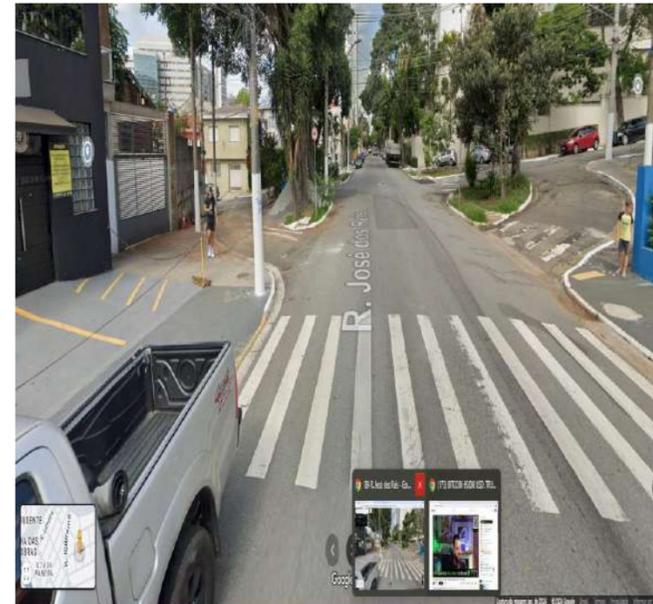


Foto antes da Intervenção.
Jan/2024

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 1.512.991,47	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	


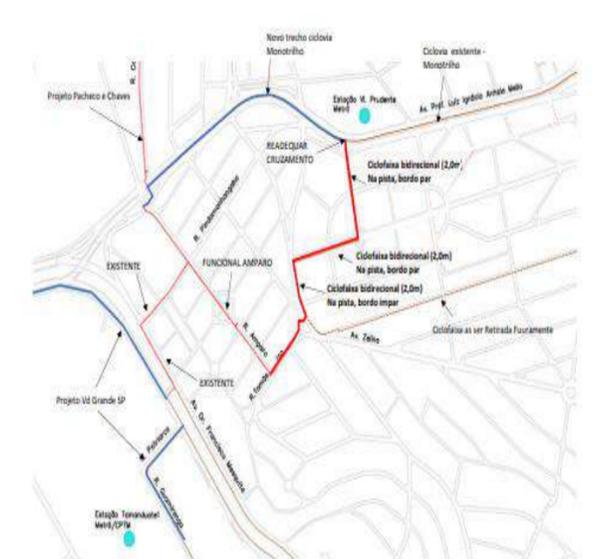


Foto Projeto Funcional
Ago/2022.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas José dos Reis (**MOB**)

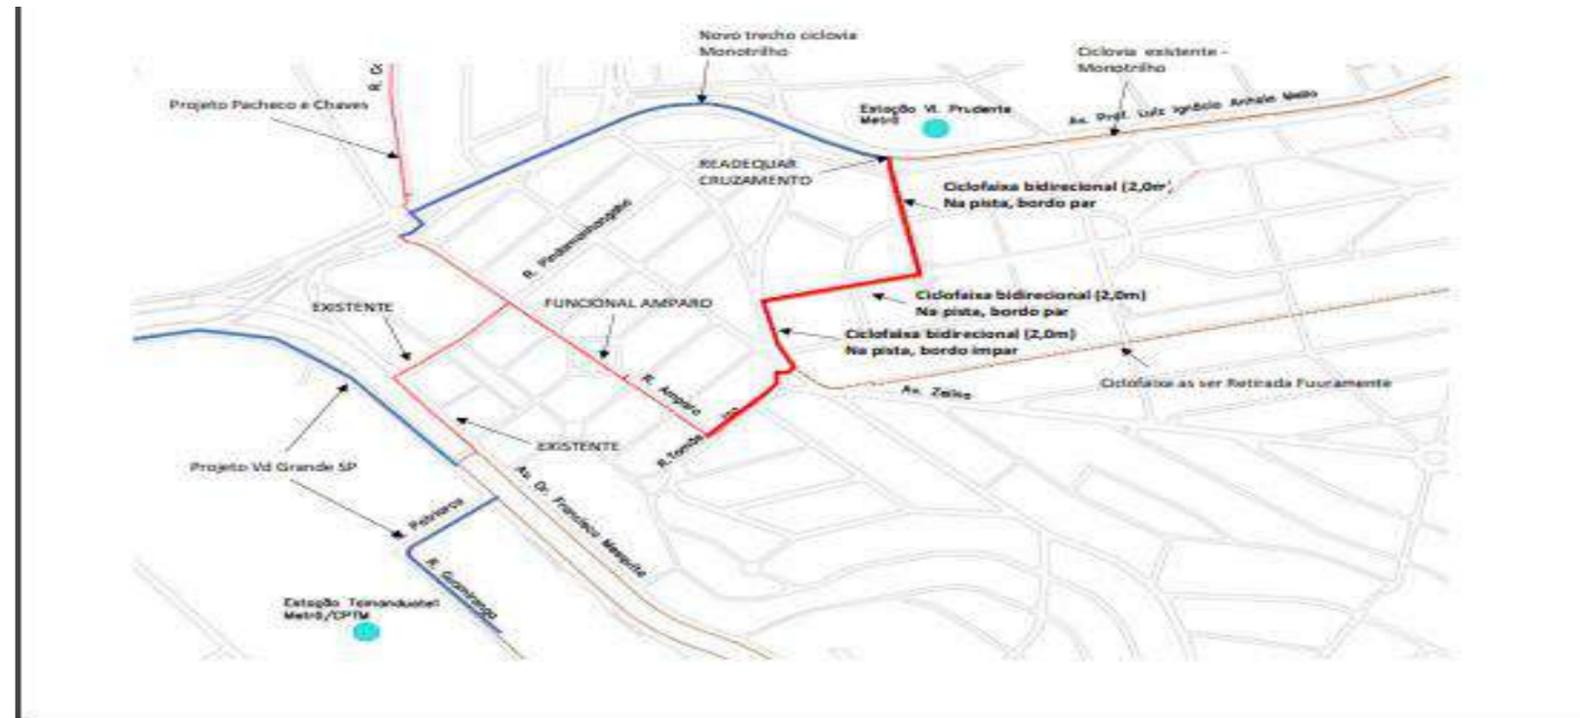

*Local Rua José dos Reis
Foto Projeto Funcional
Ago/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Vd Grande São Paulo (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Cipriano Barata; R. Dom Lucas Obes; R. dos Patriotas/ Ipiranga
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038385-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim




*Foto antes da Intervenção.
Jan/2024*

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 1.226.180,68	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

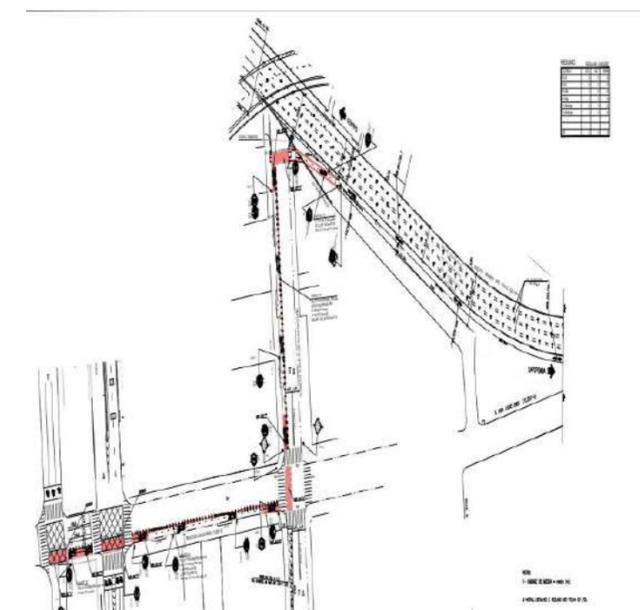


*Foto Projeto Funcional
Jul/2020.*


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Vd Grande São Paulo (**MOB**)

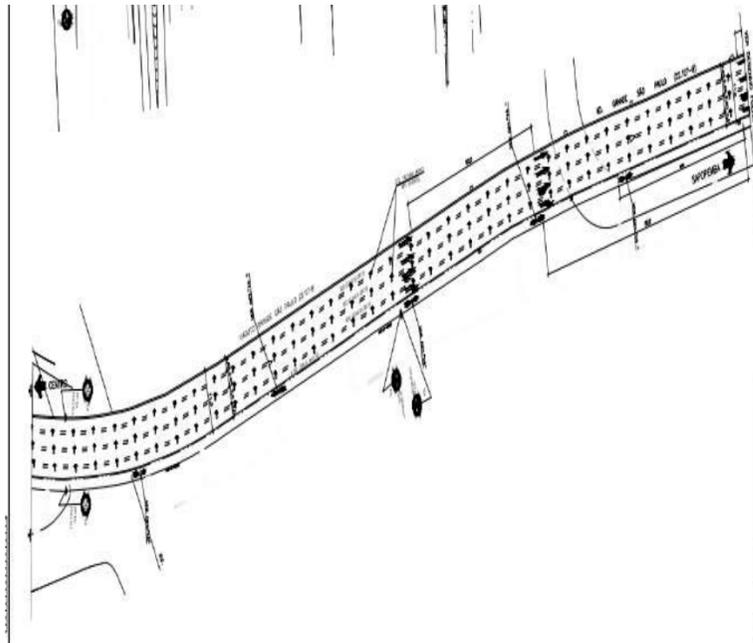

Local Viaduto Grande São Paulo
Foto Projeto Funcional
Jul/2020.

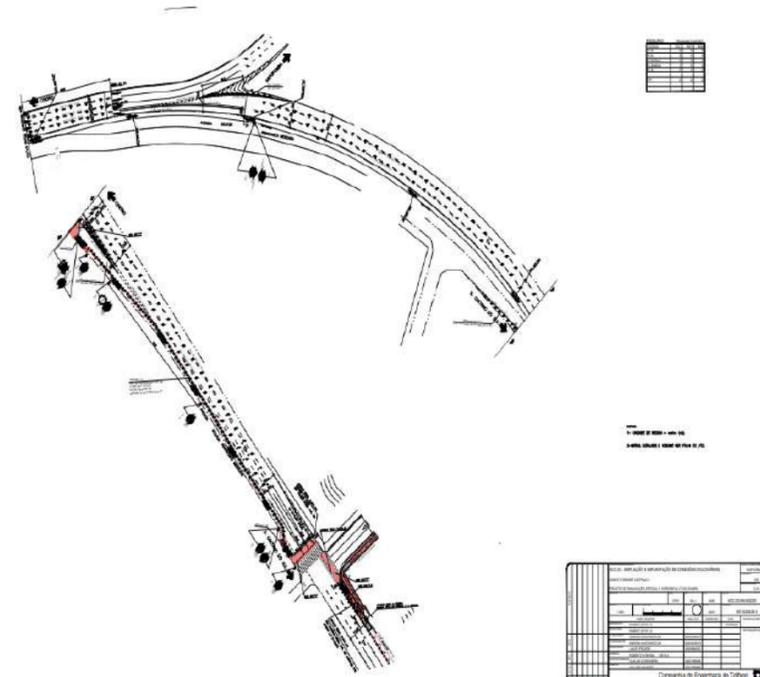

Local Av. Doutor Francisco Mesquita
Foto Projeto Funcional
Jul/2020.

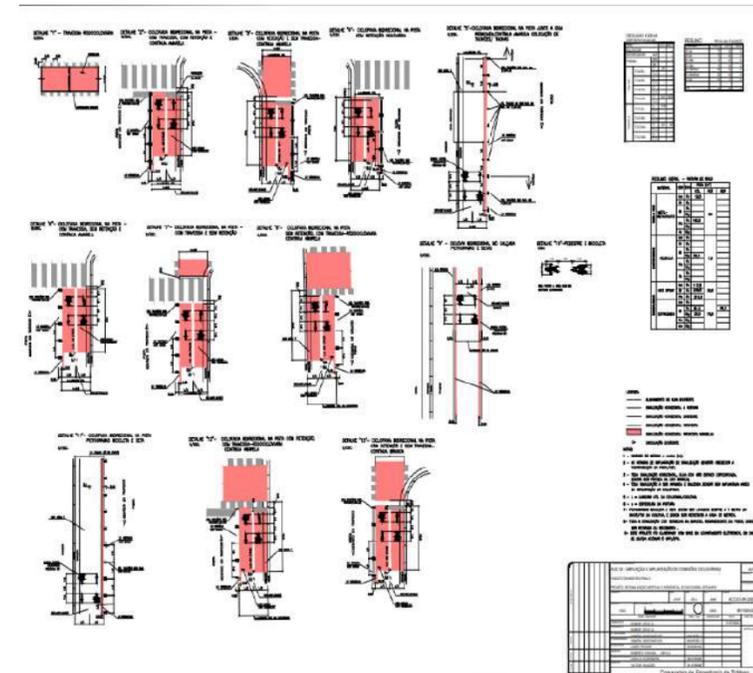

Local Viaduto Grande São Paulo
Foto Projeto Funcional
Jul/2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Salvador Simões (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Santa Cruz; R. Pedrália; R. Vergueiro; R. Dr. Gentil de Moura; R. Salvador Simões; R. Dr. Mário Vicente; R. Dona Leopoldina; R. Visconde de Pirajá/ Ipiranga
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038385-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



Foto antes da Intervenção.
Jan/2024

INVESTIMENTO 2024		
Valor Aprovado	R\$ 1.786.948,37	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

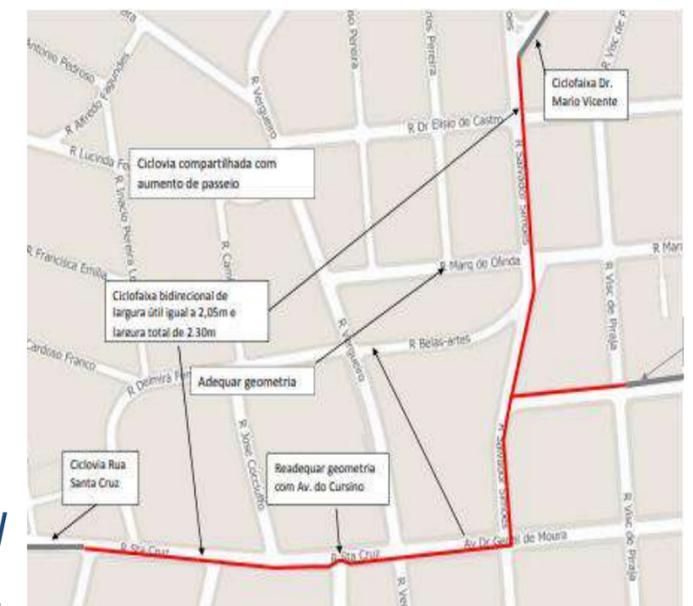


Foto Projeto Funcional
Jul/2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Salvador Simões (**MOB**)



Local Rua Salvador Simões.

Foto Projeto Funcional


Jul/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Manifesto (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. do Manifesto; R. Dos Patriotas; R. Do Grito/ Ipiranga
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038385-4
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

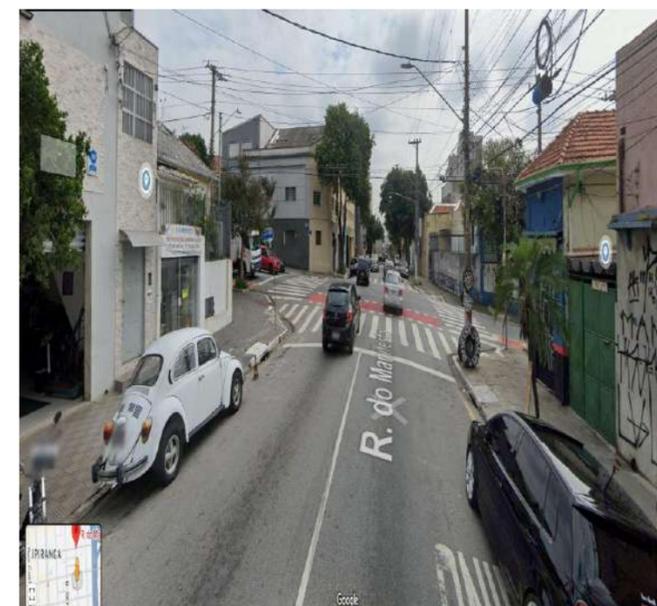

*Foto antes da Intervenção.
Abr/2024*

INVESTIMENTO 2024 + REMANESCENTE 2022		
Valor Aprovado	R\$ 3.245.233,50	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

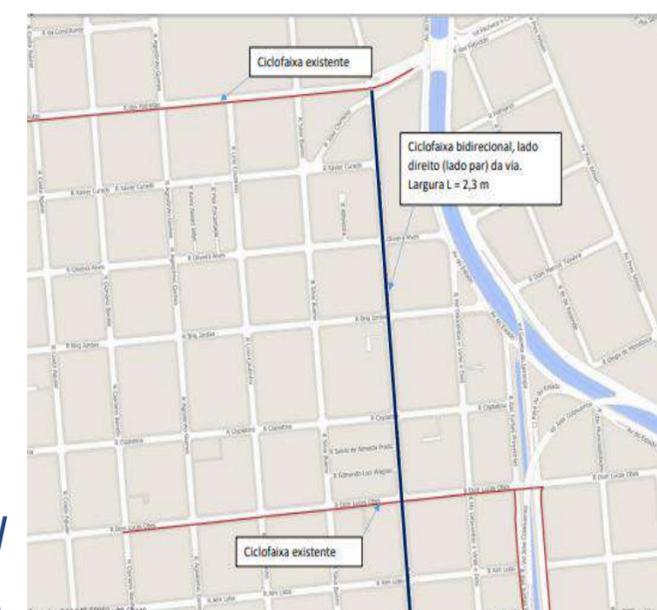

*Foto Projeto Funcional
Jul/2020.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Manifesto (**MOB**)



*Local Rua Manifesto
Foto Projeto Funcional
Jul/2020.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Cisplatina(MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Cisplatina; R. Bom Pastor; R. do Manifesto/ Ipiranga
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0012312-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Fev/2022*

REMANESCENTE 2022		
Valor Aprovado	R\$ 1.858.760,31	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



*Foto Projeto Funcional
Ago/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Cisplatina (**MOB**)



*Local Rua Cisplatina
Foto Antes da Intervenção
Fev/2023*



*Local Rua Cisplatina
Foto Antes da Intervenção
Fev/2023*



*Local Rua Cisplatina
Foto Antes da Intervenção
Fev/2023*



*Local Rua Cisplatina
Foto Antes da Intervenção
Fev/2023*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024


DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Nossa Sra da Saúde (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Nossa Sra. Da Saúde; Av. Tancredo Neves; R. Abagiba/ Ipiranga
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0012312-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Fev/2023*

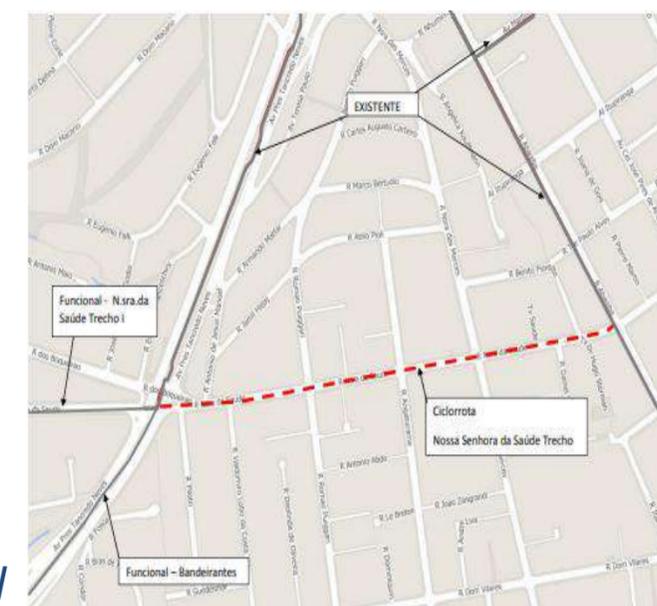

*Foto Projeto Funcional
Ago/2022.*

REMANESCENTE 2022 + REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 782.219,11	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Nossa Sra da Saúde (**MOB**)



*Local Travessa Benito Fioretto
Foto Antes da Intervenção
Fev/2023*



*Local Rua Nossa Senhora da
Saúde
Foto Antes da Intervenção
Fev/2023*



*Local Rua Nossa Senhora da
Saúde
Foto Antes da Intervenção
Fev/2023*



*Local Rua Nossa Senhora da
Saúde
Foto Antes da Intervenção
Fev/2023*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Amparo (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Amparo; R. Pindamonhangaba; R. Tomas Izzo; Pça. Pe. Lourenço Barendse; R. Ibitirama/ Vila Prudente
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0012312-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Out/2023*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.058.745,21	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



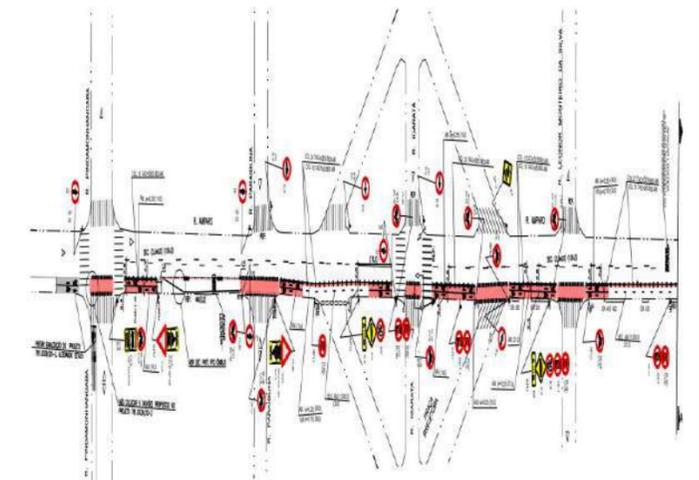


Foto Projeto Funcional

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Amparo (MOB)

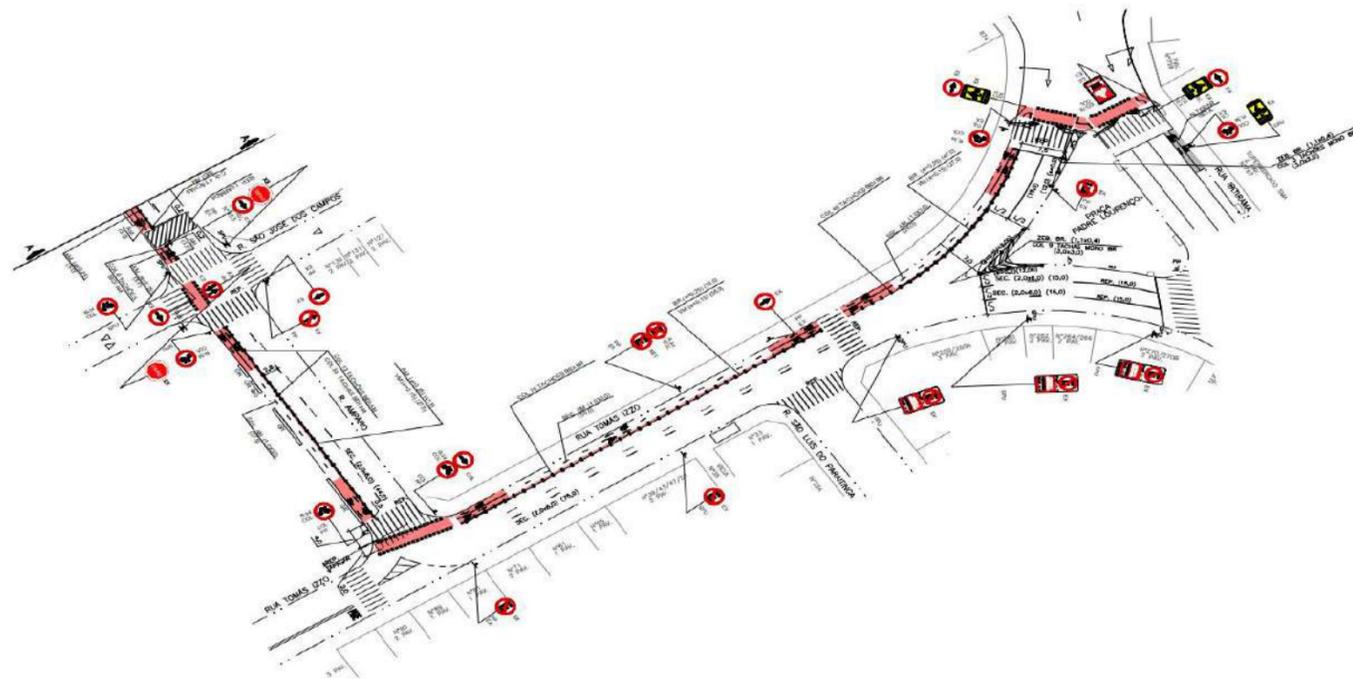

*Local Rua Tomas Izo
Foto Projeto Funcional*

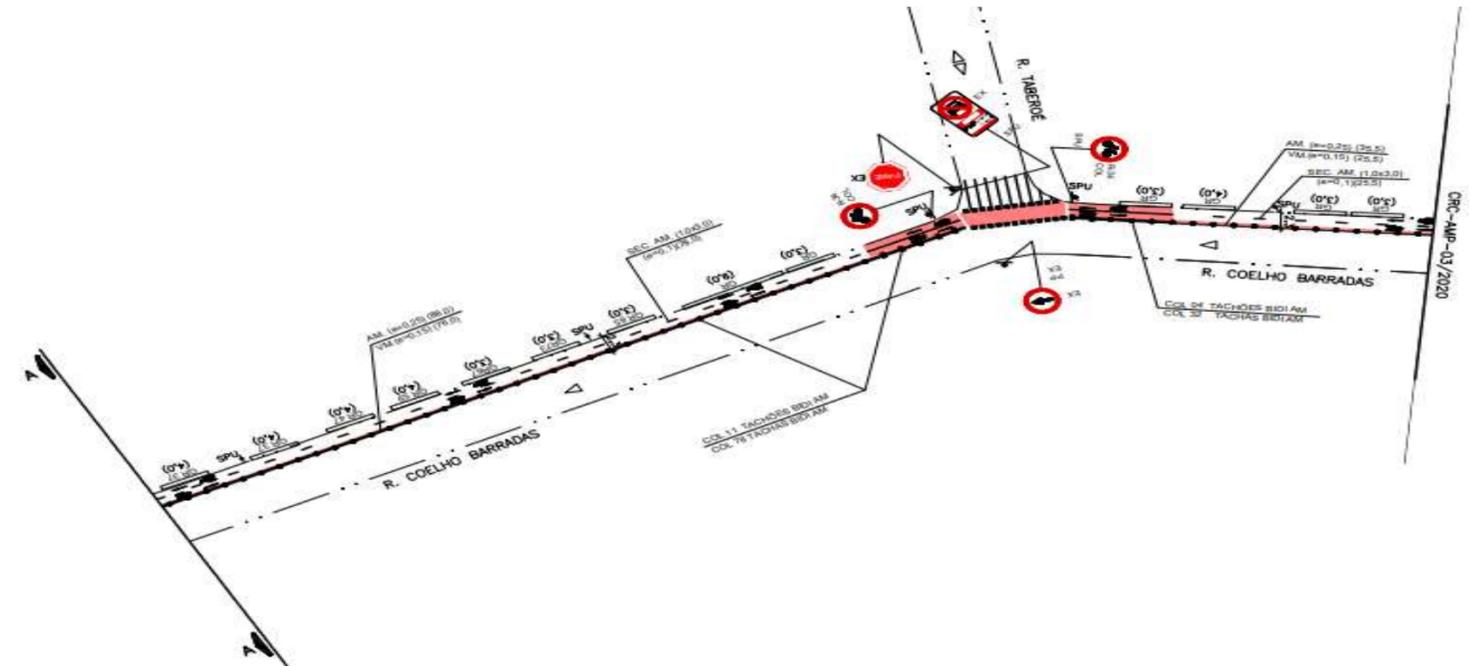

*Local Rua Coelho Barradas
Foto Projeto Funcional*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Bandeirantes (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Complexo Viario Maria Maluf; Av. Afonso D'Escagnolle Taunay; Av. Pres. Tancredo Neves; Av. dos Bandeirantes ; Av. Nações Unidas/ Jabaquara/Vila Mariana
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0012312-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 19.346.143,94	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



*Foto antes da Intervenção.
Out/2022*

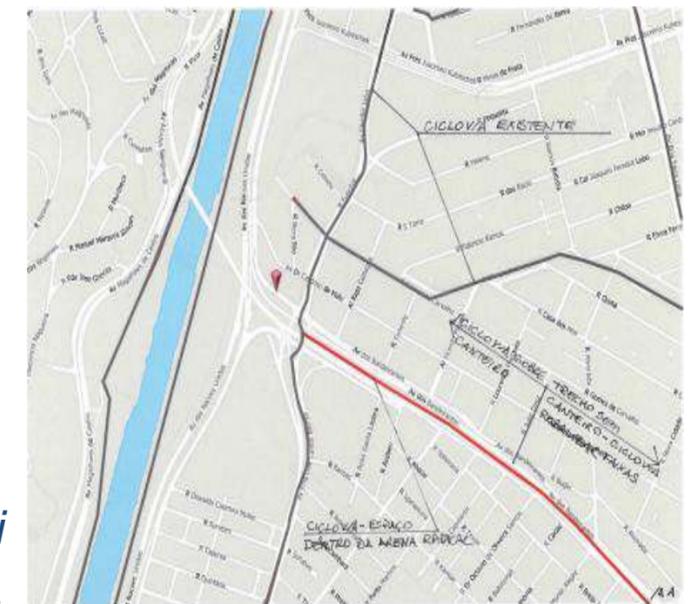

*Foto Croqui
Jun/2021.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Bandeirantes (**MOB**)



*Local Av. dos Bandeirantes
Foto Antes da Intervenção
Out/2022*



*Local Av. dos Bandeirantes
Foto Antes da Intervenção
Out/2022*



*Local Av. dos Bandeirantes
Foto Antes da Intervenção
Out/2022*



*Local Av. dos Bandeirantes
Foto Antes da Intervenção
Out/2022*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Abraão de Moraes (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Abraão de Moraes; Rua Santa Cruz; Avenida Fagundes Filho/ Ipiranga
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0012312-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 5.959.220,82	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	




*Foto antes da Intervenção.
Mar/2022*

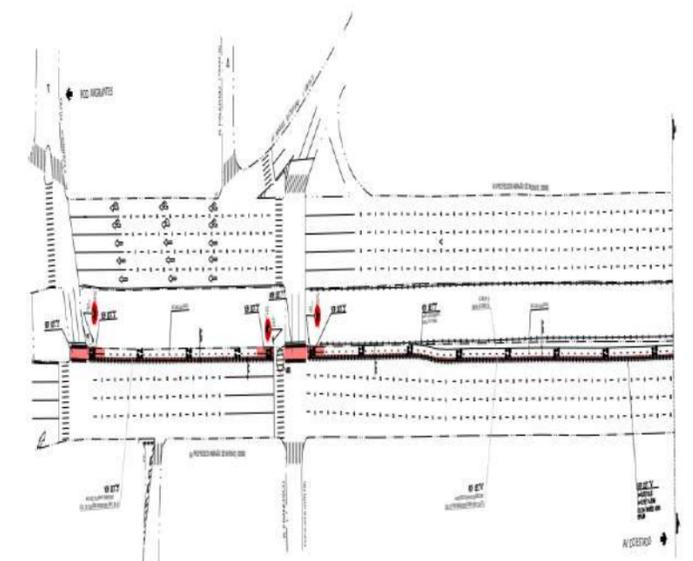


*Foto Projeto Funcional
Jan/2020.*


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Abraão de Moraes(MOB)

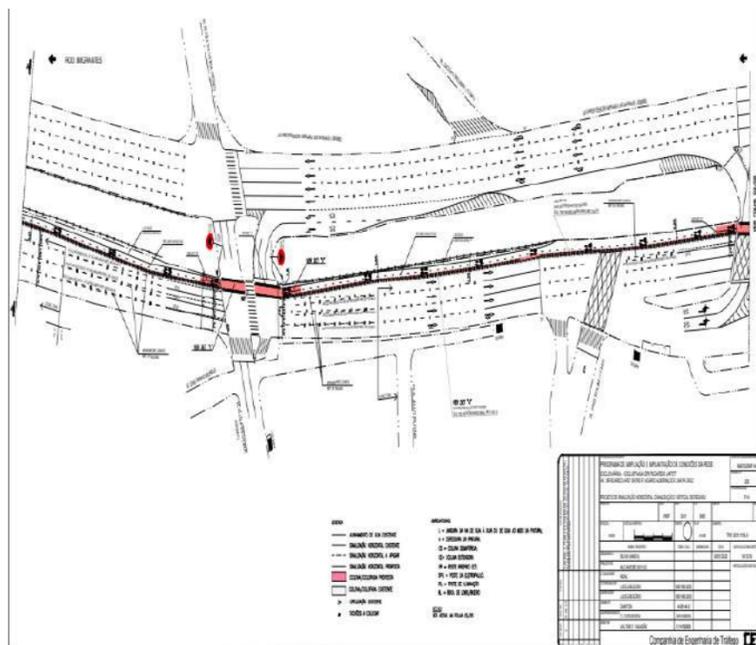


Local Av. Abraão de Moraes
Foto Projeto Funcional
Jan/2020.

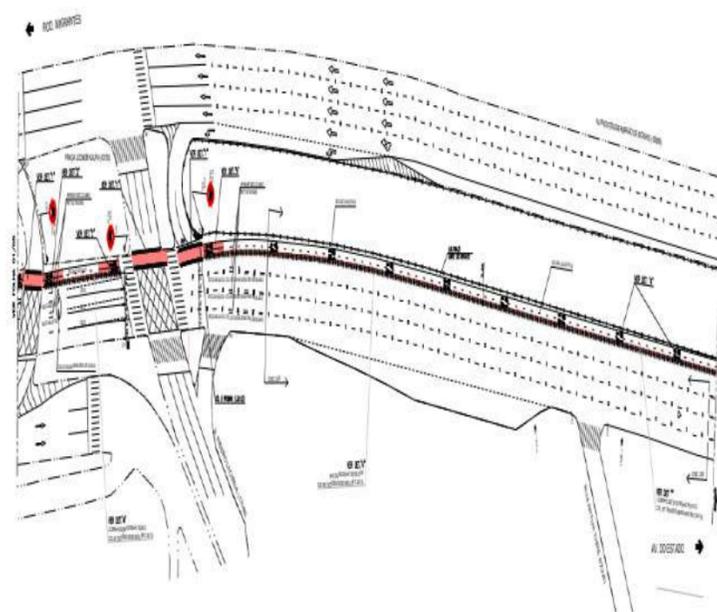

Local Av. Abraão de Moraes
Foto Projeto Funcional
Jan/2020.

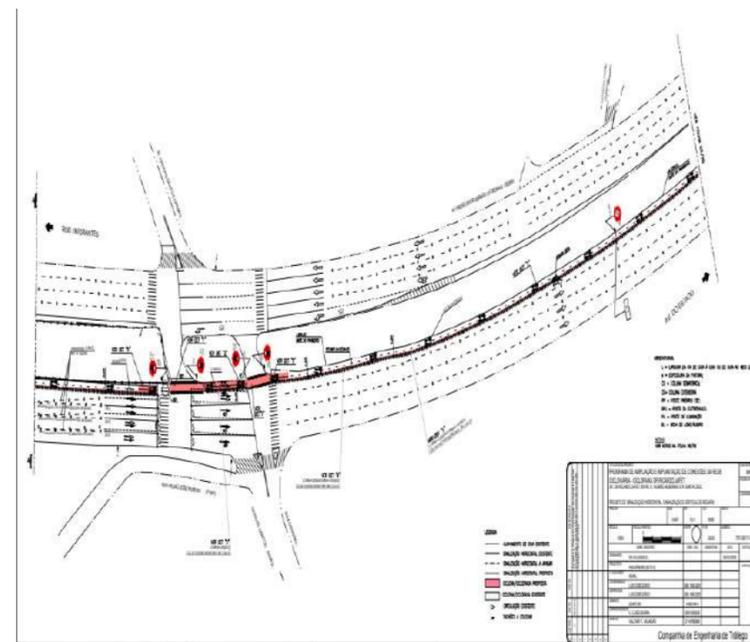

Local Av. Abraão de Moraes
Foto Projeto Funcional
Jan/2020.

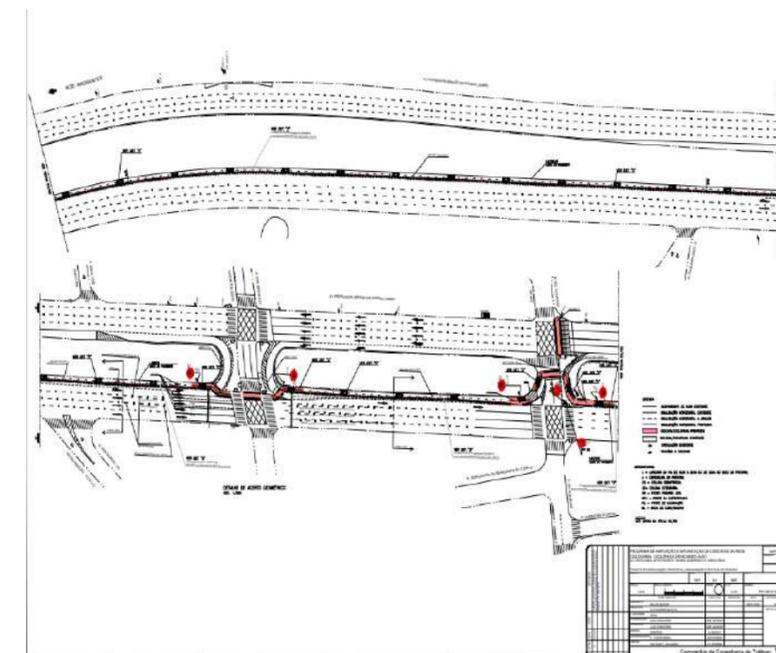

Local Av. Abraão de Moraes
Foto Projeto Funcional
Jan/2020.


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL/ 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Astarte (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Astarte; Av. Dezenove De Janeiro; Av. Aricanduva/ Mooca
Situação	Em andamento – 100 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Jul/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 511.982,02	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

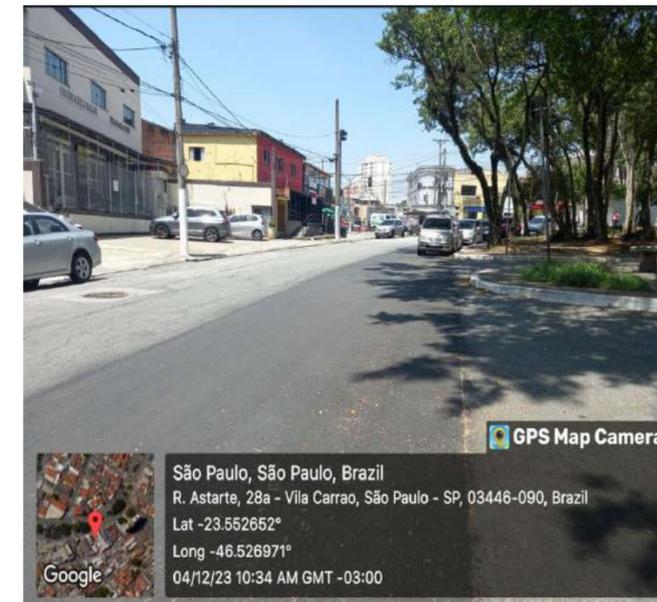

*Foto antes da Intervenção.
Dez/2023*



*Foto em Execução
Dez/2023.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Astarte (**MOB**)



*Local Rua Astarte
Foto Em Execução
Dez/2023*



*Local Rua Astarte
Foto Em Execução
Dez/2023*



*Local Rua Astarte
Foto Em Execução
Dez/2023*



*Local Rua Astarte
Foto Em Execução
Dez/2023*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Carlos de Campos (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Carlos de Campos ; R. Dr. Pacheco e Silva; Av. Bom Jardim/ Mooca
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Jul/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Out/2023*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 759.555,11	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



*Foto em execução
Mar/2022.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL/FINAL 20XX

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Carlos de Campos(**MOB**)



*Local Av. Carlos de Campos
Foto Em Execução
Dez/2023.*

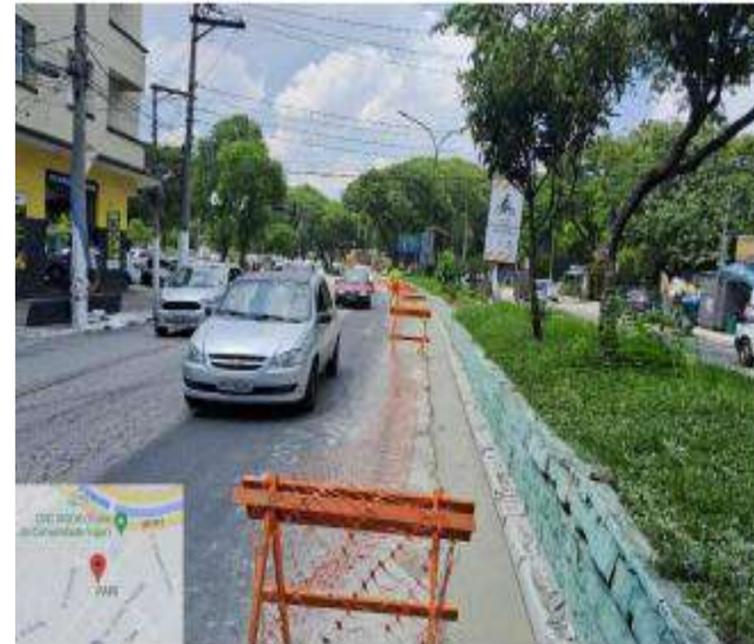

*Local Av. Carlos de Campos
Foto Em Execução
Dez/2023.*



*Local Av. Carlos de Campos
Foto Em Execução
Mar/2022.*



*Local Av. Carlos de Campos
Foto Em Execução
Mar/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Apucarana(MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Apucarana; R. Melo Freire; R. Emilia Marengo; R. Lucilia de Queiroz; R. Eleonora Cintra/Moooca
Situação	Concluído– 100 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Jul/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.594.026,24	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



*Foto antes da Intervenção.
Fev/2023*



*Foto em Execução
Mar/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Apucarana(MOB)



*Local Rua Apucarana
Foto em Execução
Abr/2024*



*Local Rua Apucarana
Foto em Execução
Dez/2023*



*Local Rua Apucarana
Foto em Execução
Mar/2022.*



*Local Rua Apucarana
Foto em Execução
Dez/2023.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas João Boemer (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Joao Boemer; R. Bresser; Av. Carlos de Campos/ Mooca
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 2.374.346,03	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



*Foto antes da Intervenção.
Jan/2023*

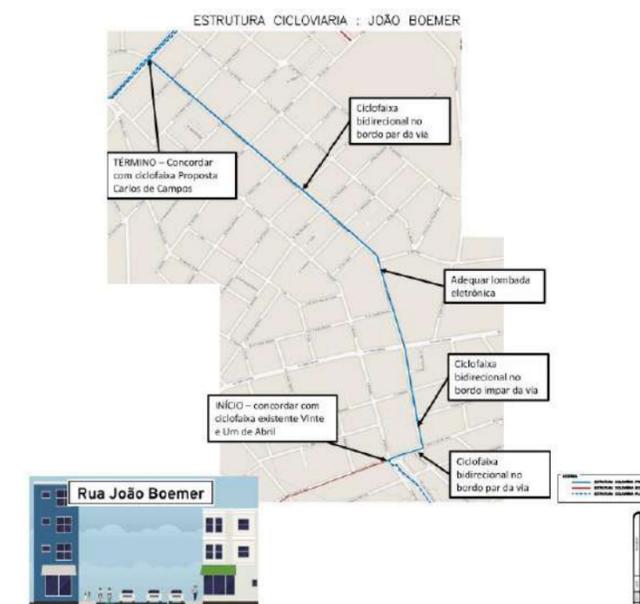


*Foto Projeto Funcional
Mar/2020.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas João Boemer (**MOB**)

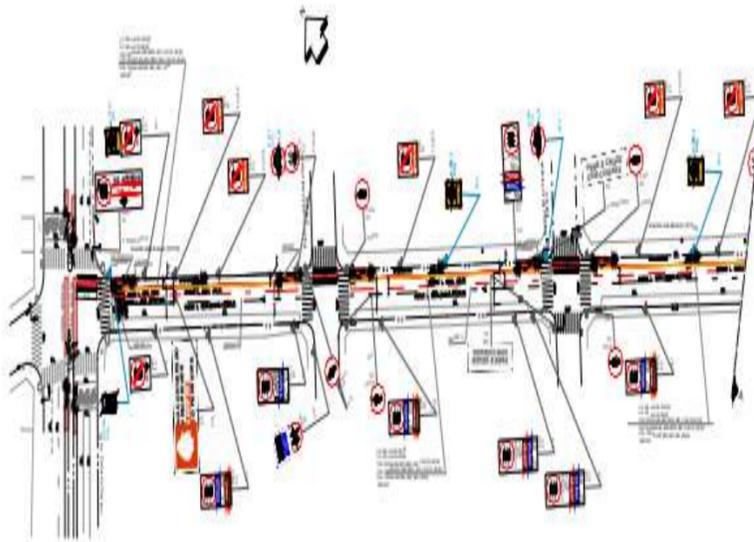


Local Av. João Boemer
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

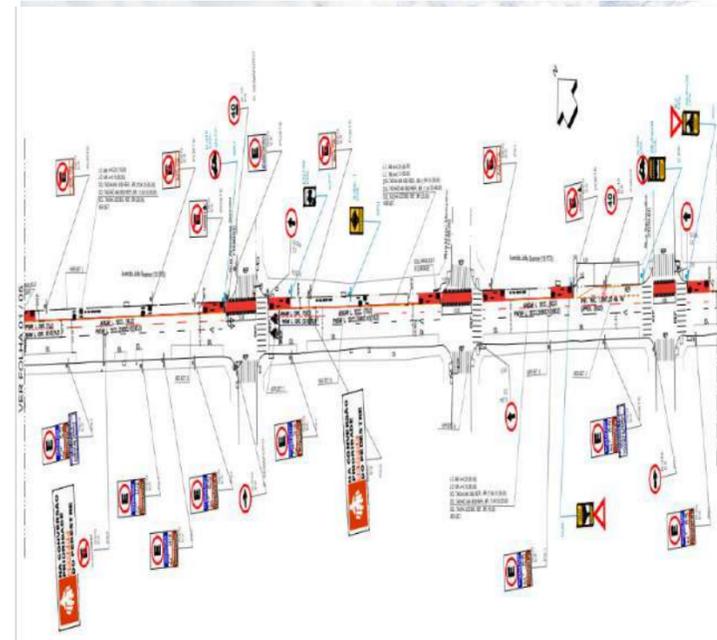

Local Av. João Boemer
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

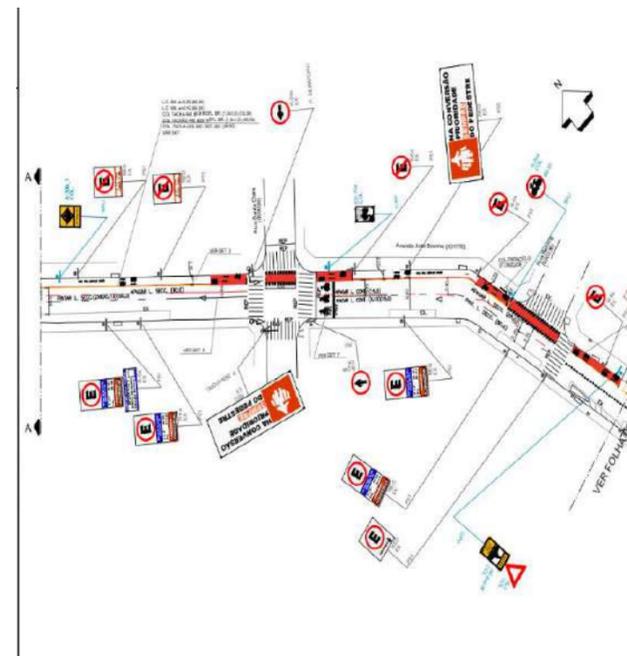

Local Av. João Boemer
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

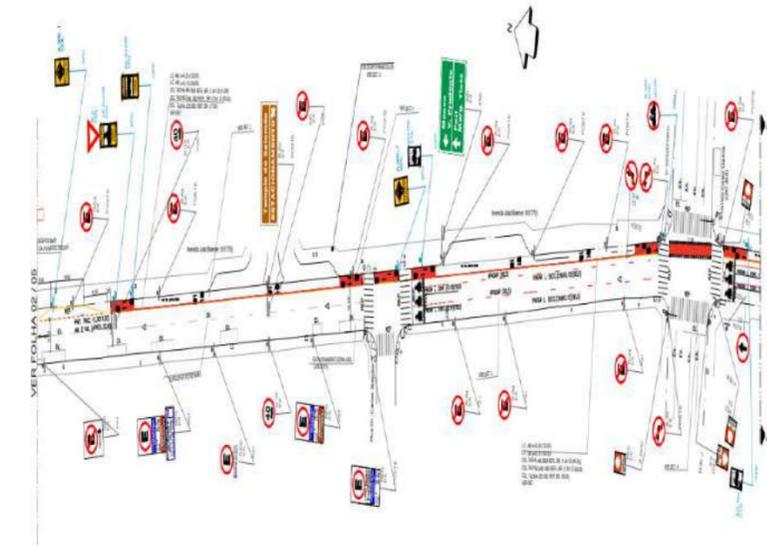

Local Av. João Boemer
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Airton Pretini (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Airton Pretini; Celso Garcia; Pte Aricanduva/ Mooca
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Mai/2024*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 2.403.789,31	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

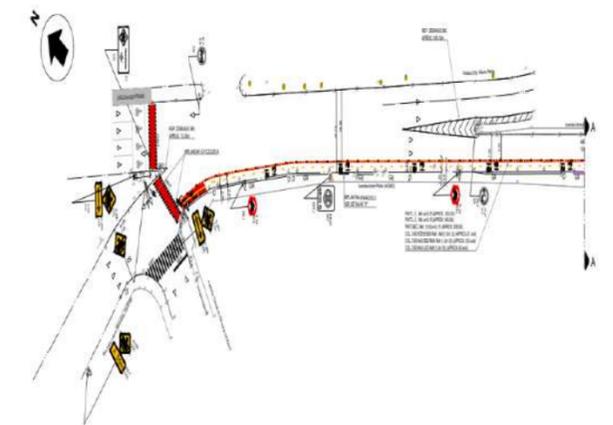


*Foto Projeto Funcional
Abr/2023.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Airton Pretini (MOB)

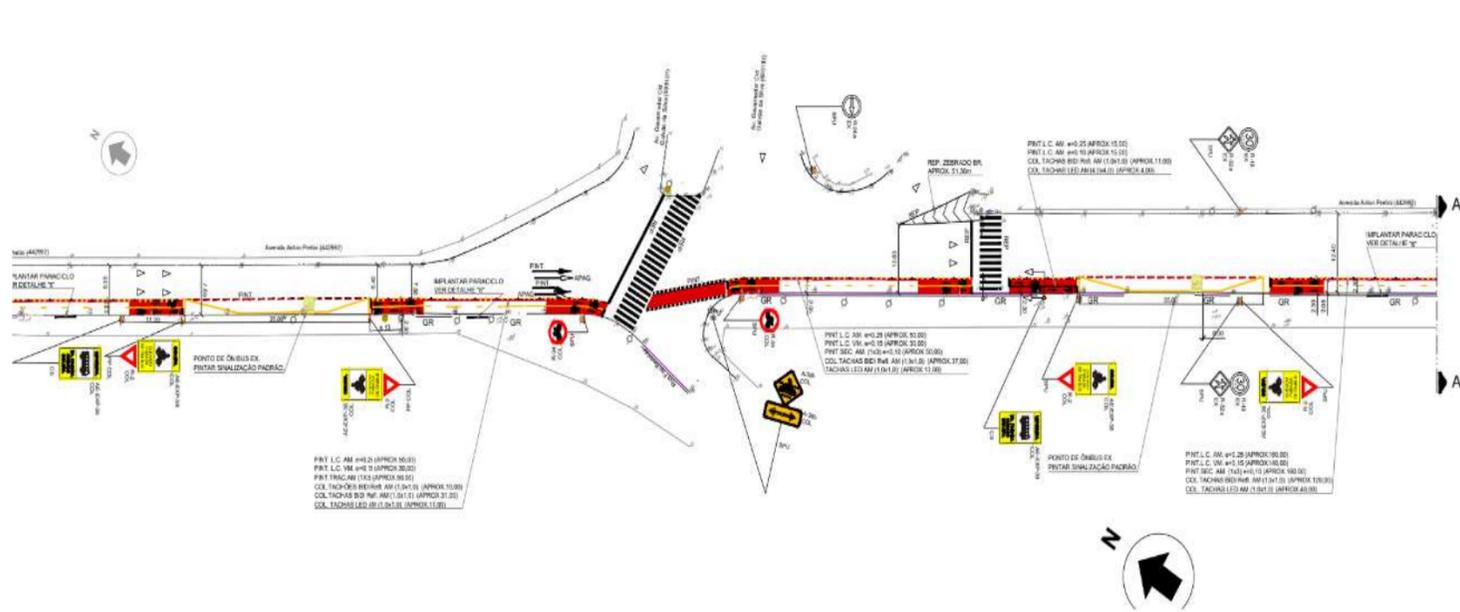

Local Av. Airton Pretini
Foto Projeto Funcional
Abr/2023

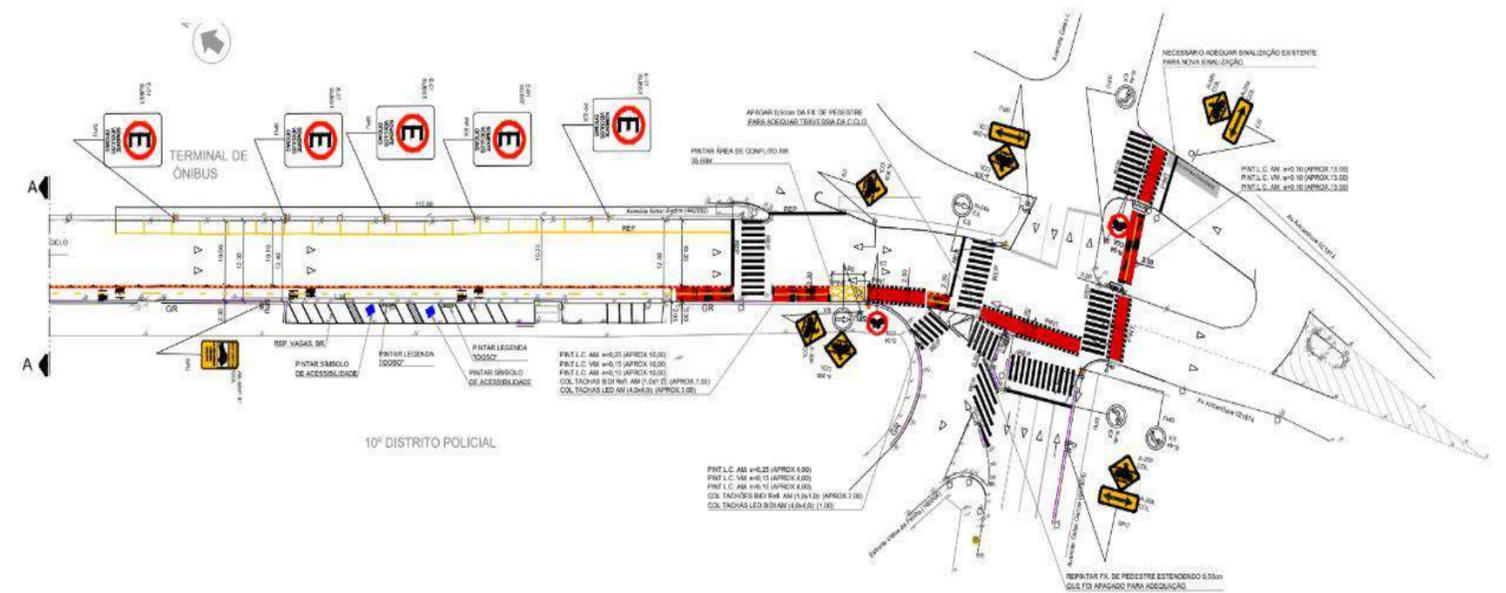

Local Av. Airton Pretini
Foto Projeto Funcional
Abr/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Aricanduva (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Aricanduva; Avenida Conde de Frontin; Rua Santo Isidoro/ Aricanduva
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 2.313.338,95	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	




*Foto antes da Intervenção.
Nov/2023*



*Foto Projeto Funcional
Jul/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Aricanduva (**MOB**)

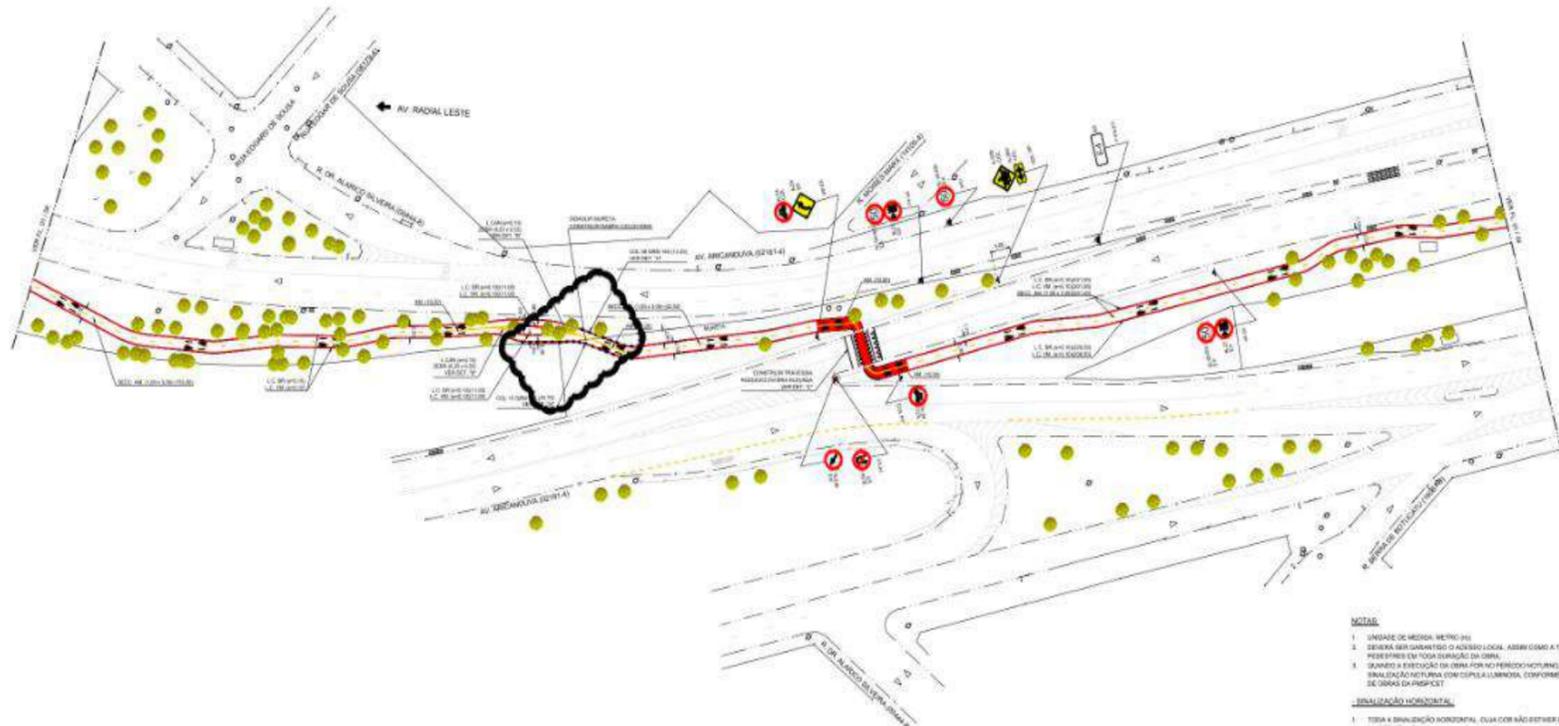

*Local Av. Aricanduva
Foto Projeto Funcional
Jul/2023*



*Local Av. Aricanduva
Foto Projeto Funcional
Jul/2023*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Adhemar P. de Barros (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Rio Das Pedras; Av. Ver. Emilio Meneghini; Pc S Joao Vicenzotto; Av. Gov. Adhemar Pereira de Barros; R. Antonio La Giudice; Av. Aricanduva; R. Rego Barros/ Aricanduva
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Fev/2023*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 2.045.304,56	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

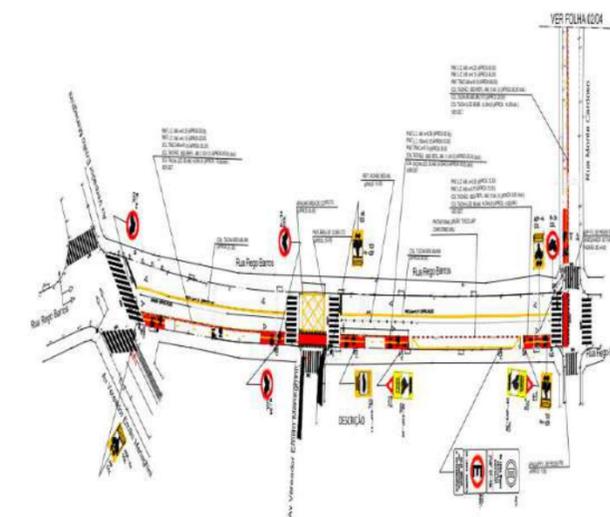


*Foto Projeto Funcional
Jun/2023.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Adhemar P. de Barros (MOB)

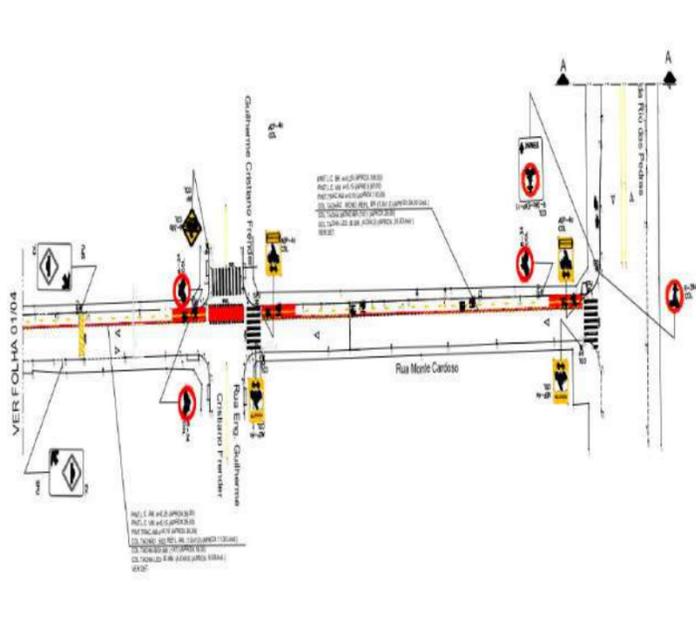


Local Rua Monte Cardoso
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.

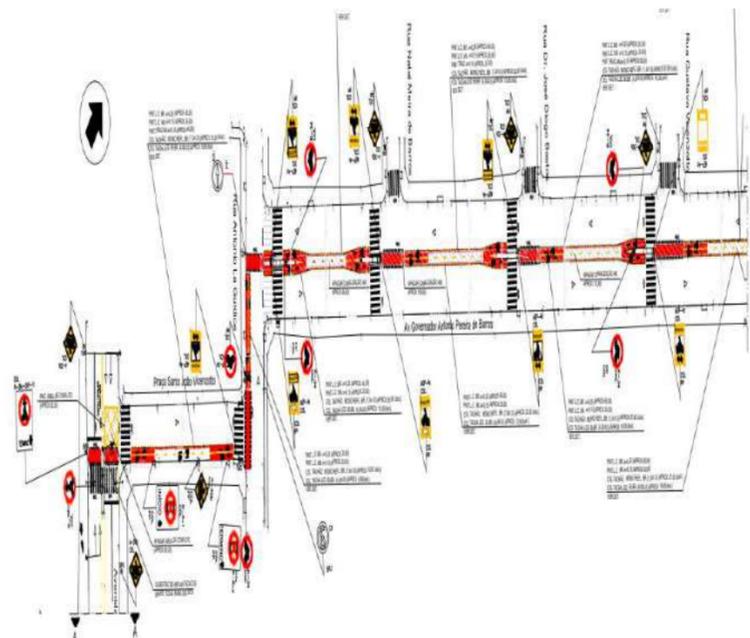

Local Av. Gov. Adhemar
Pereira de Barros
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.

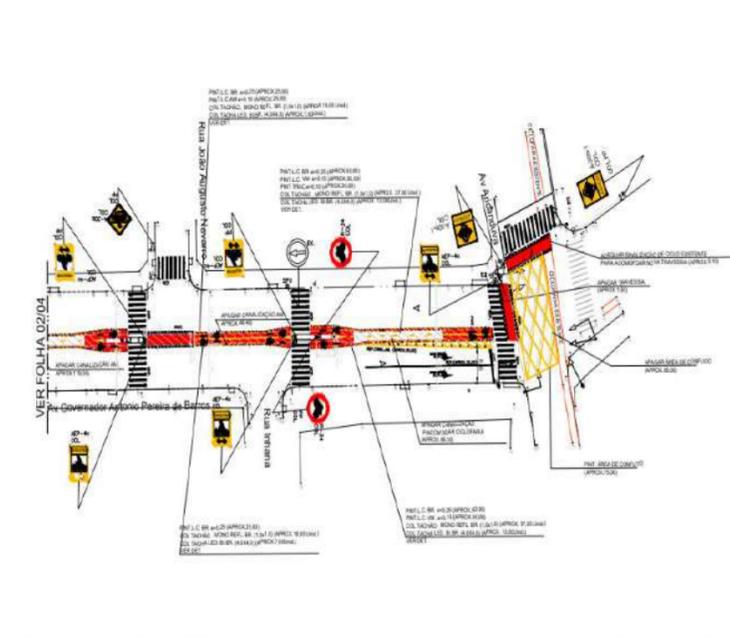

Local Av. Gov. Adhemar
Pereira de Barros
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.

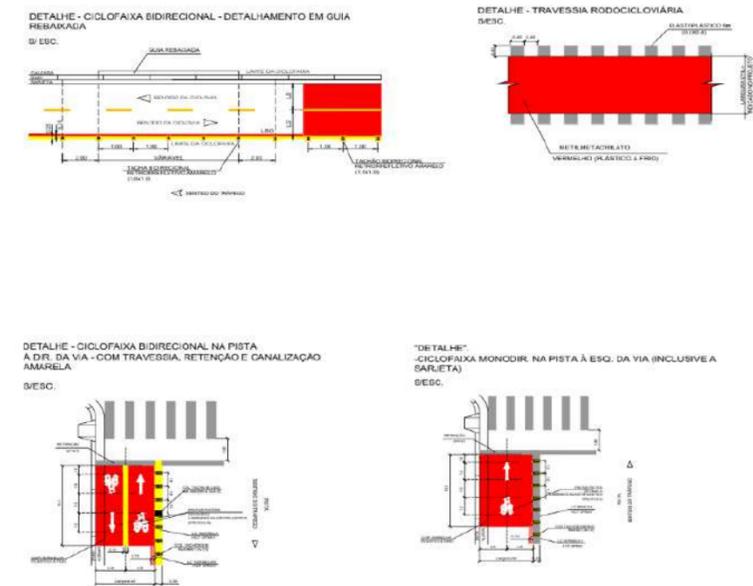

Local Av. Gov. Adhemar
Pereira de Barros
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Cap. Pacheco Chaves (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Vd. Capitão Pacheco Chaves; Av. do Estado; R. Capitão Pacheco Chaves; R. Coelho Neto; Av. Prof. Luiz I. De A Mello/ Mooca
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



Foto antes da Intervenção.
Nov/2022

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 3.883.418,03	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$	
Valor Pago	R\$	



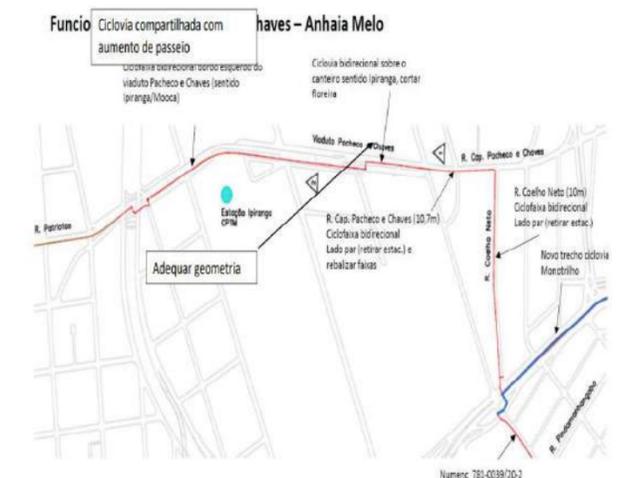


Foto Projeto Funcional
Mar/2022.

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Cap. Pacheco Chaves (MOB)

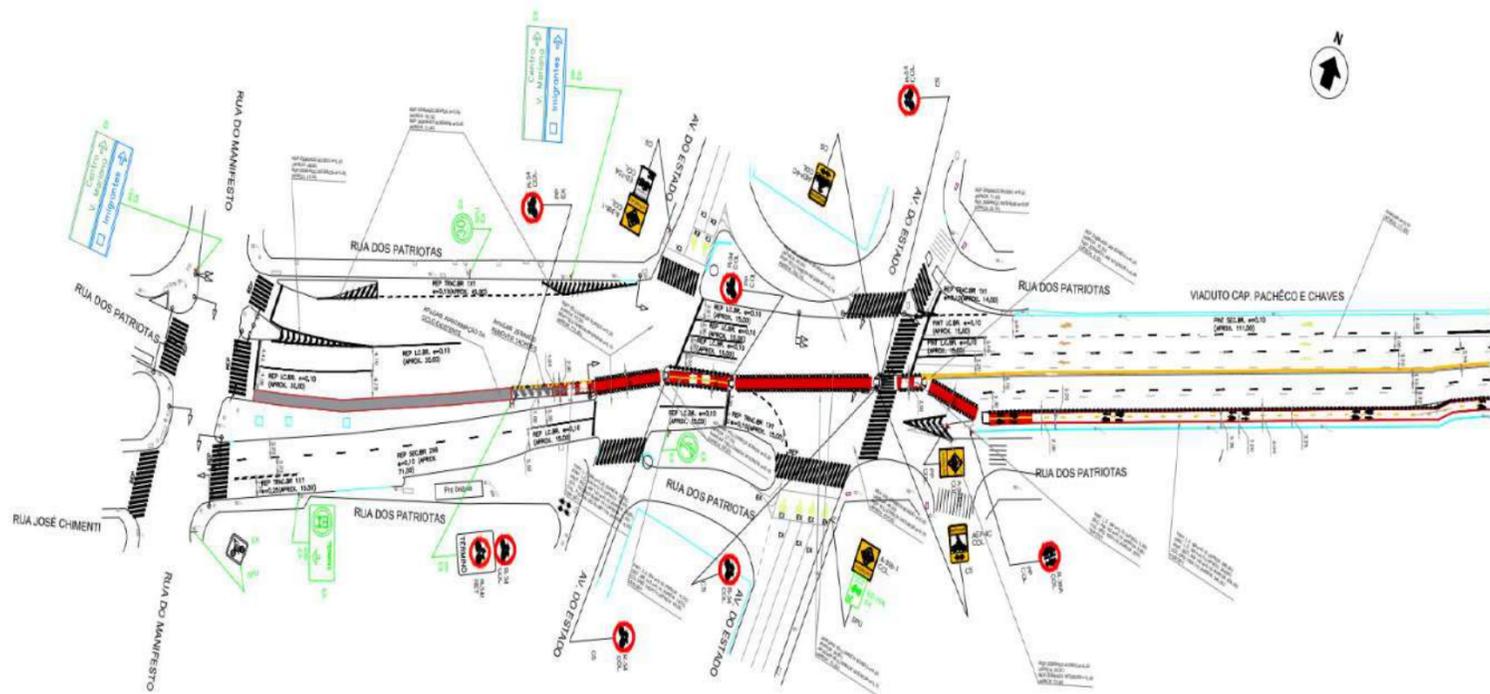

*Local Rua dos Patriotas
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.*

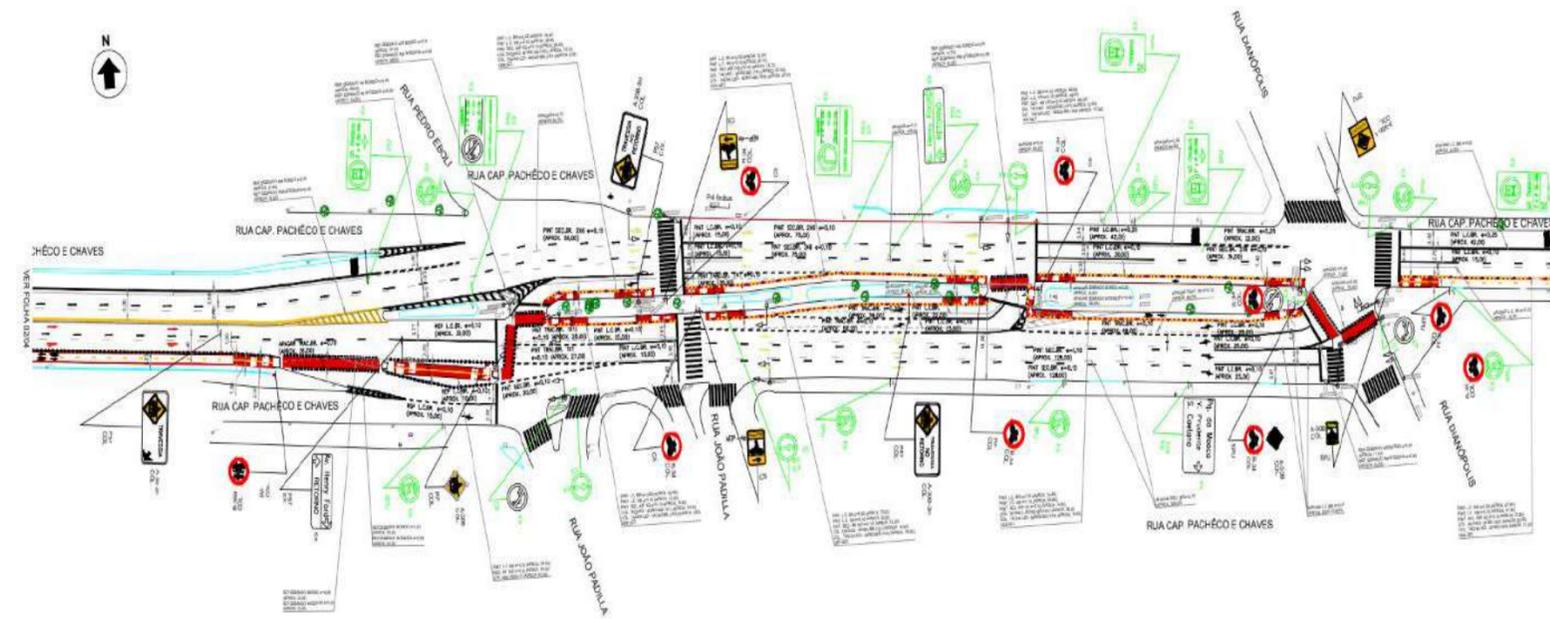

*Local Rua Cap. Pacheco
Chaves
Foto Projeto Funcional
Jun/2023*

*Local Rua Melo Freire
Foto Projeto Funcional
Mar/2020.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Ponte Tatuapé (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Pte Tatuapé; R. Ulisses Cruz/ Mooca
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 2.569.665,43	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	




*Foto antes da Intervenção.
Mai/2022*

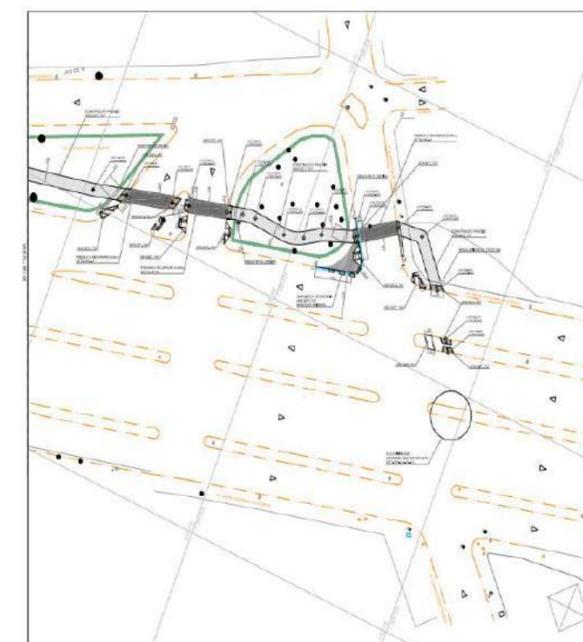


*Foto Projeto Funcional
Mar/2023.*


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Ponte Tatuapé (**MOB**)

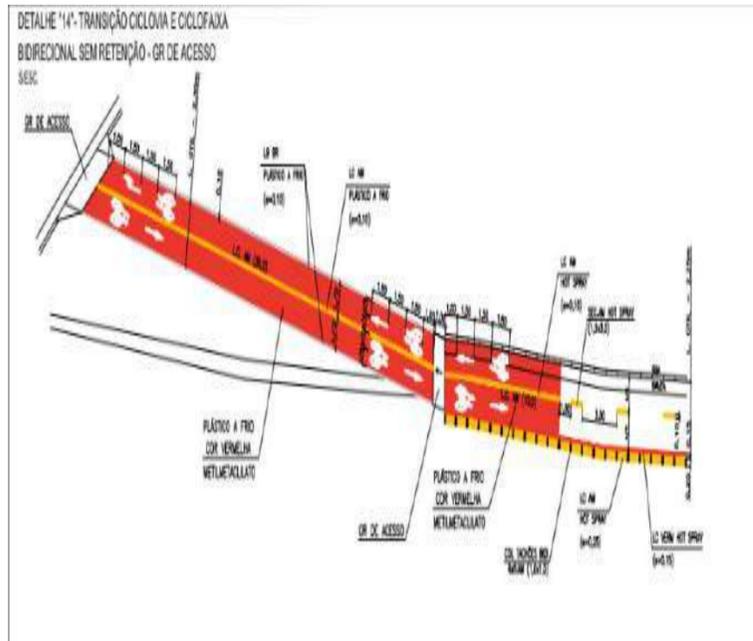


Local Ponte Tatuapé
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

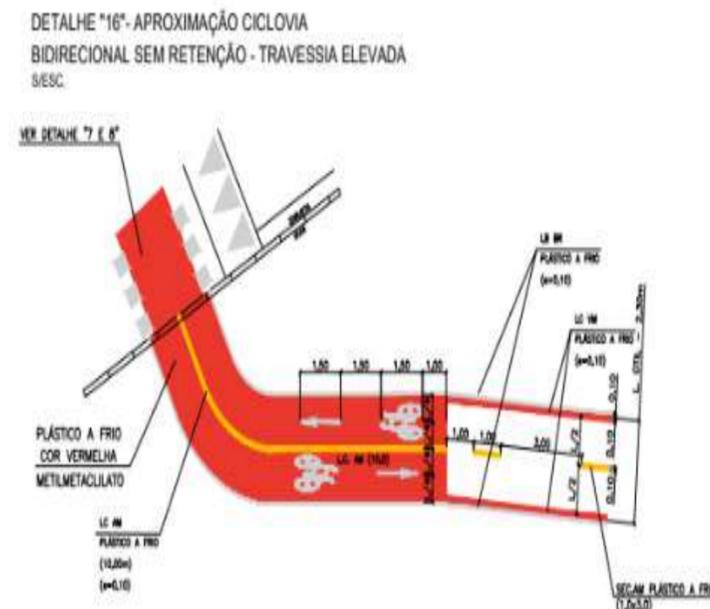

Local Ponte Tatuapé
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

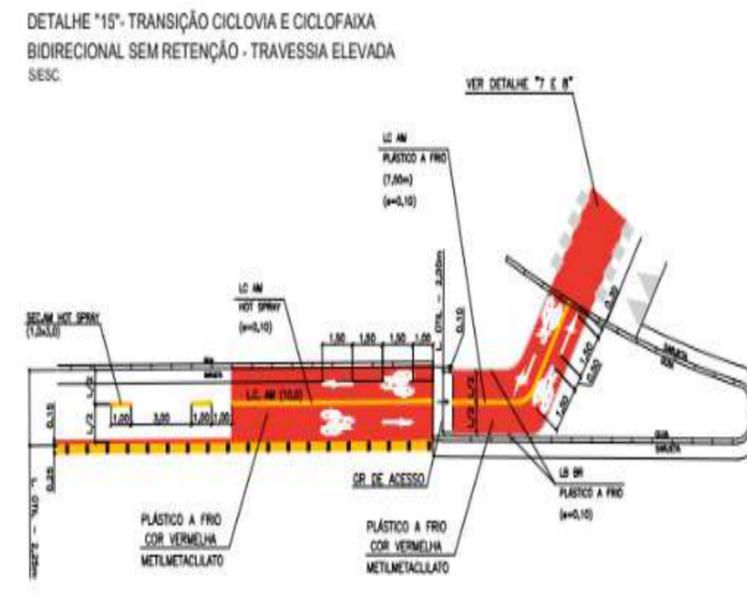

Local Ponte Tatuapé
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

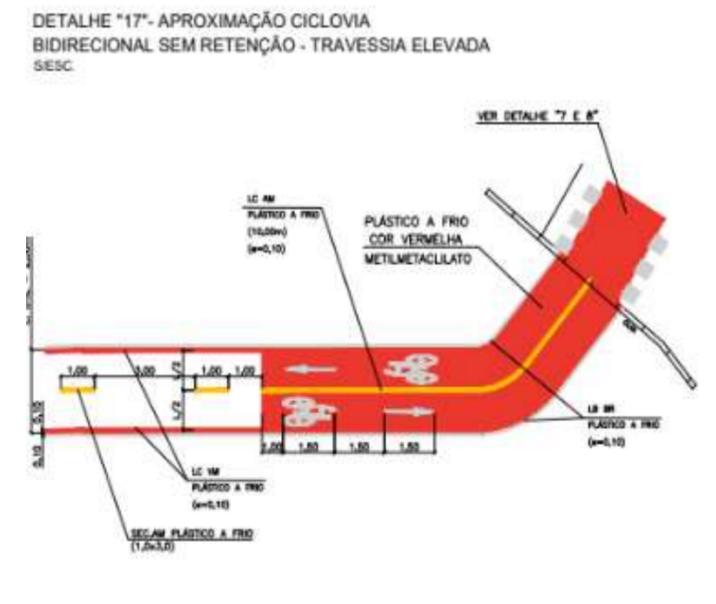

Local Ponte Tatuapé
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Ribeiro de Lima (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Ribeiro de Lima; Av. Tiradentes; R. Prates/Mooca
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.331.462,47	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



*Foto antes da Intervenção.
Mar/2023*




*Foto Projeto Funcional
Jul/2023.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Ribeiro de Lima (**MOB**)

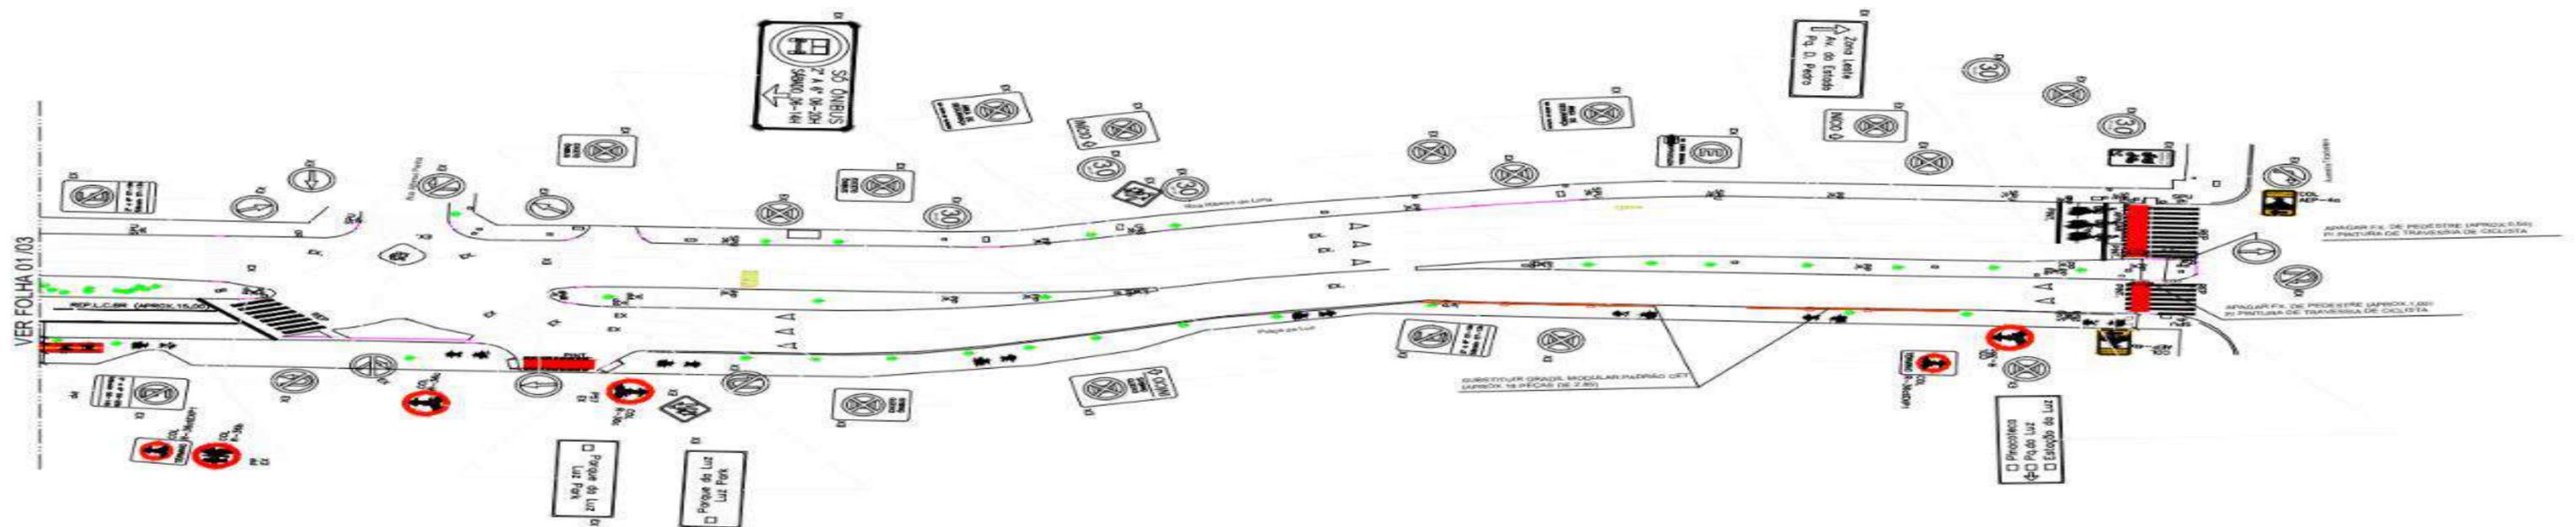

*Local Rua Ribeiro de Lima
Foto Projeto Funcional
Jul/2023.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Estado (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. do Estado ; R. do Gasometro; Av. Cruzeiro do Sul/ Sé
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 6.605.737,66	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	




*Foto antes da Intervenção.
Mar/2023*

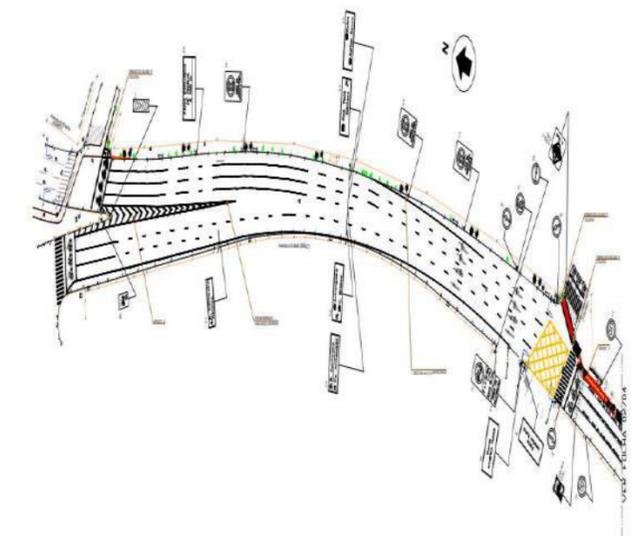


*Foto Projeto Funcional
Jul/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Estado (**MOB**)

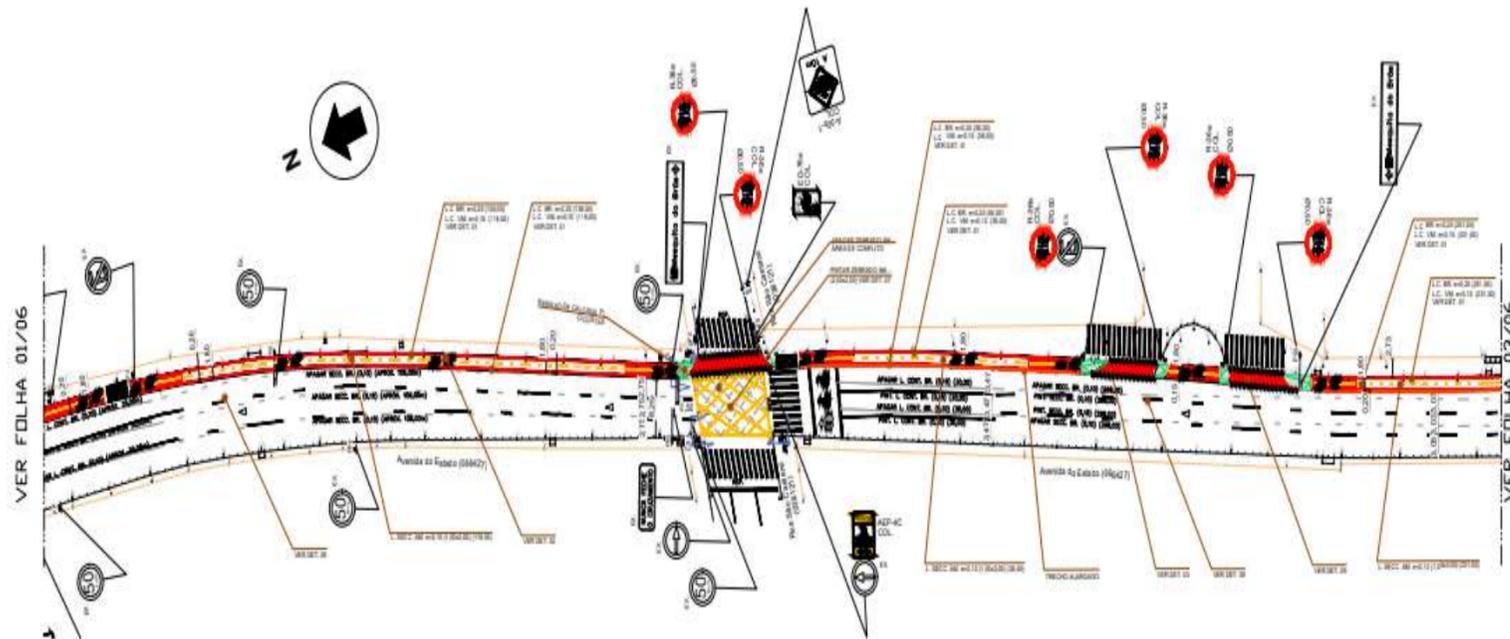

Local Av do Estado
Foto Projeto Funcional
Jul/2023.

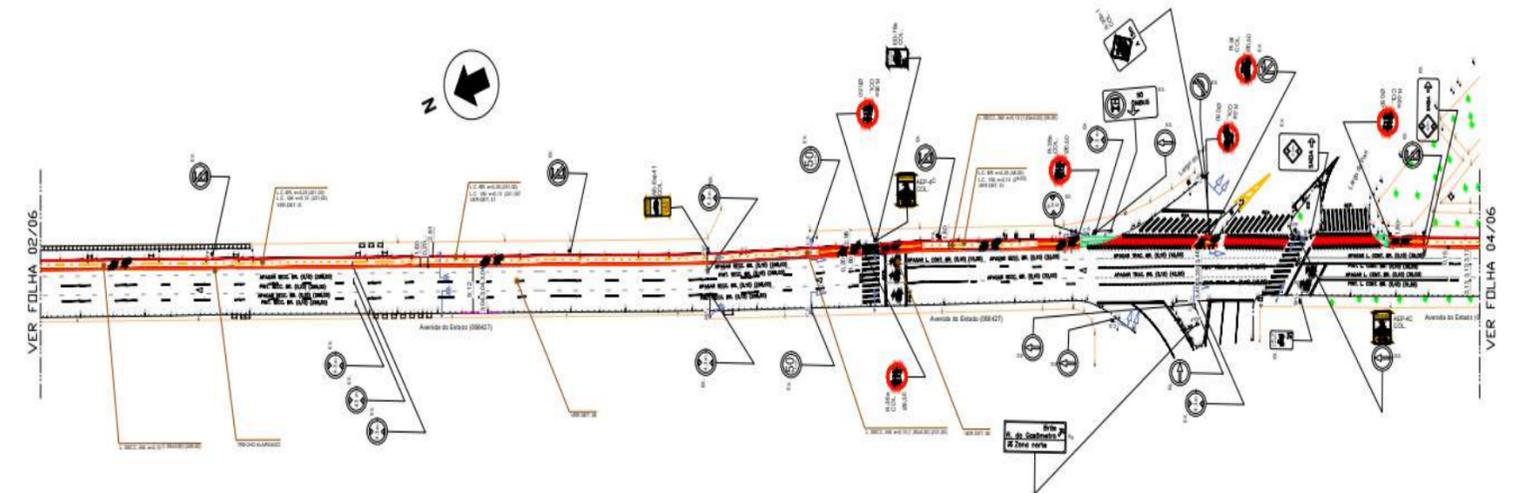

Local Av do Estado
Foto Projeto Funcional
Jul/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Av. Salim F. Maluf (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Salim Farah Maluf; Av. Celso Garcia; Av. Ver Abel Ferreira/ Mooca
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	7610.2022/0003159-1
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim




*Foto antes da Intervenção.
Out/2023*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 11.853.226,22	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

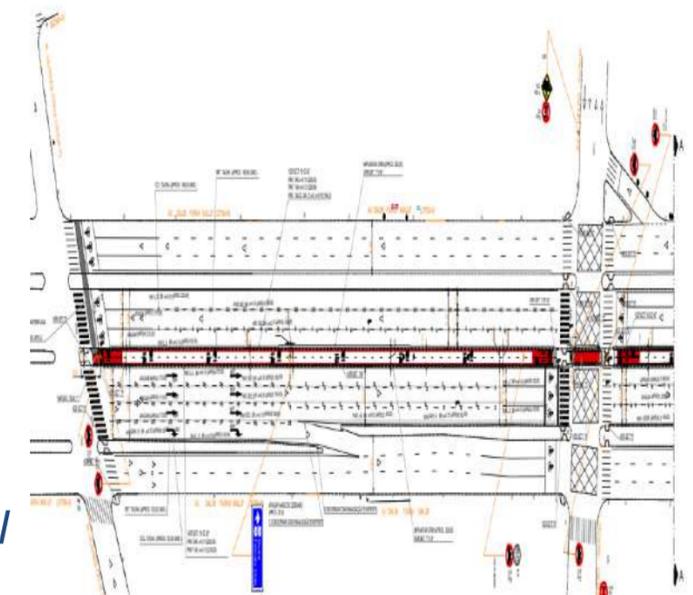


*Foto Projeto Funcional
Mar/2023.*


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Av. Salim F. Maluf (MOB)

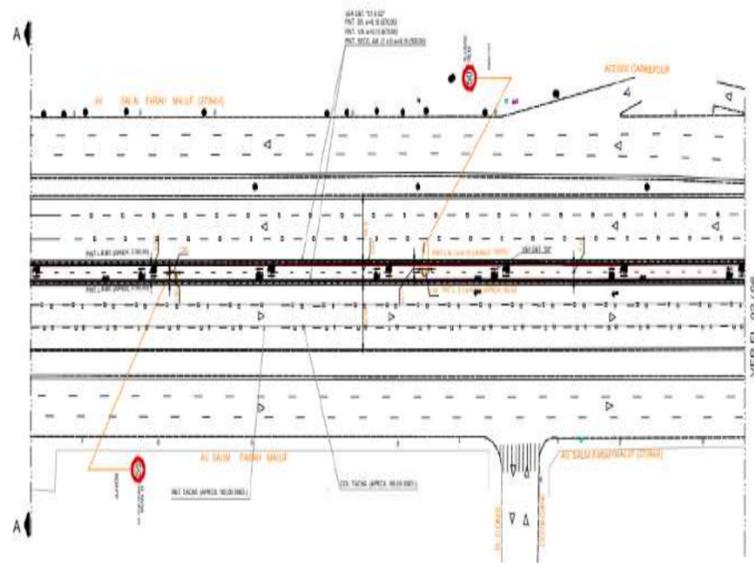


Local Av. Salim Farah Maluf
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

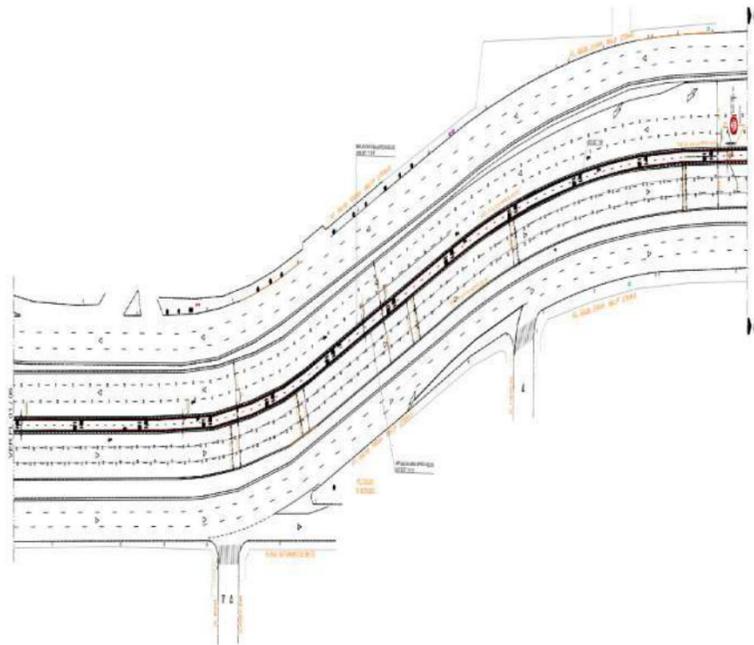

Local Av. Salim Farah Maluf
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

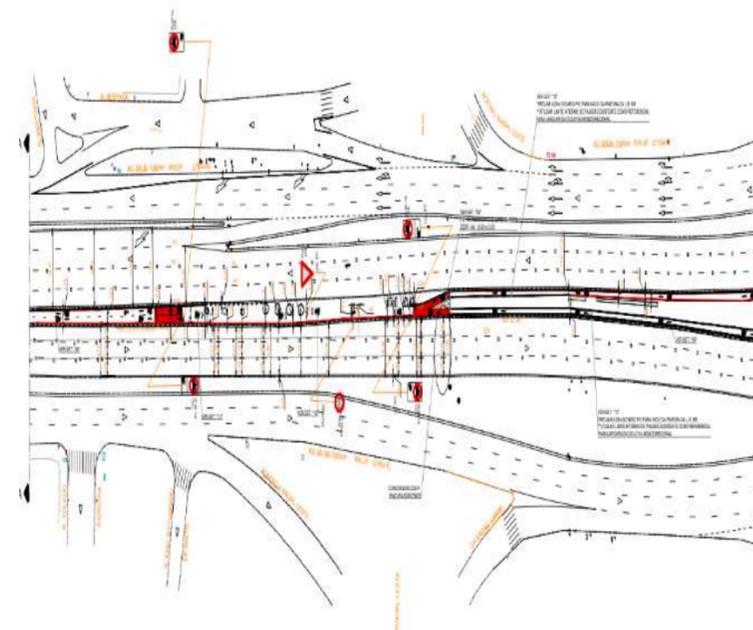

Local Av. Salim Farah Maluf
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

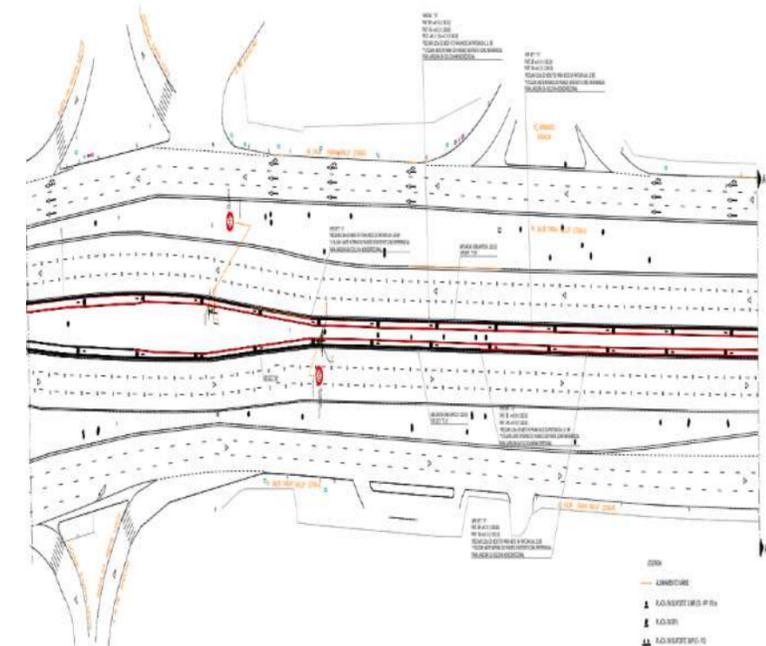

Local Av. Salim Farah Maluf
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Maria Cândida (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Maria Candida; Av Nadir Dias de Figueiredo; Av.Luiz Dumont Vilares/ Vila Maria/Vila Guilherme
Situação	Em andamento – 95 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038490-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim




*Foto antes da Intervenção.
Out/2022*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 2.031.694,18	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$	
Valor Pago	R\$	

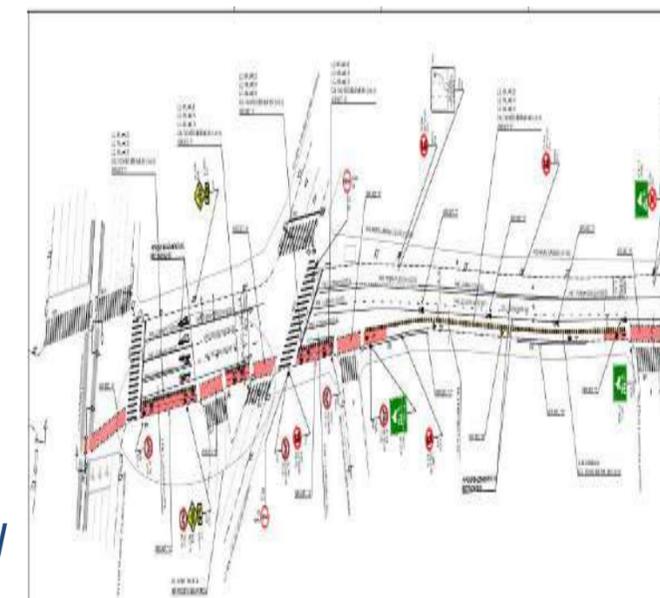


*Foto Projeto Funcional
Nov/2022.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Maria Cândida (**MOB**)

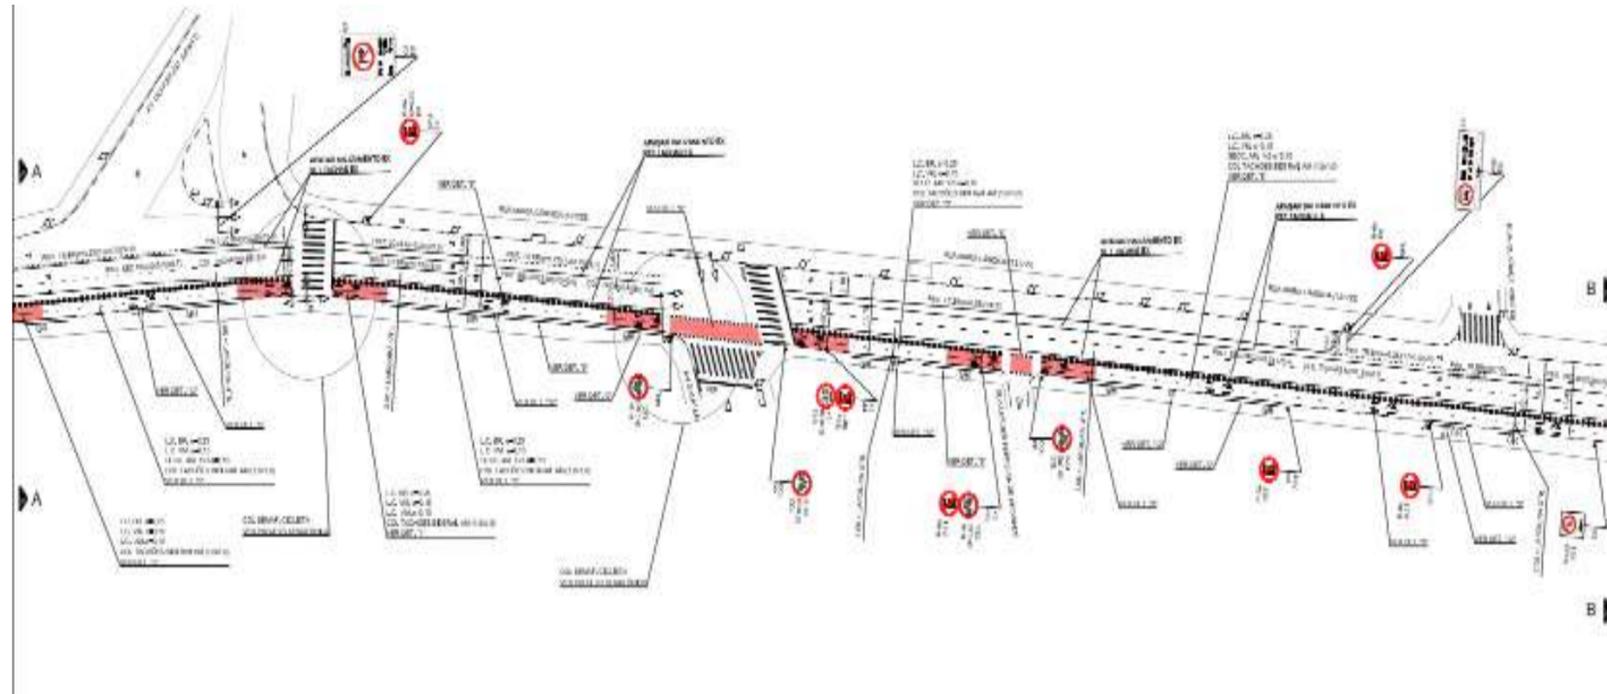

*Local Rua Maria Cândida
Foto Projeto Funcional
Nov/2022*

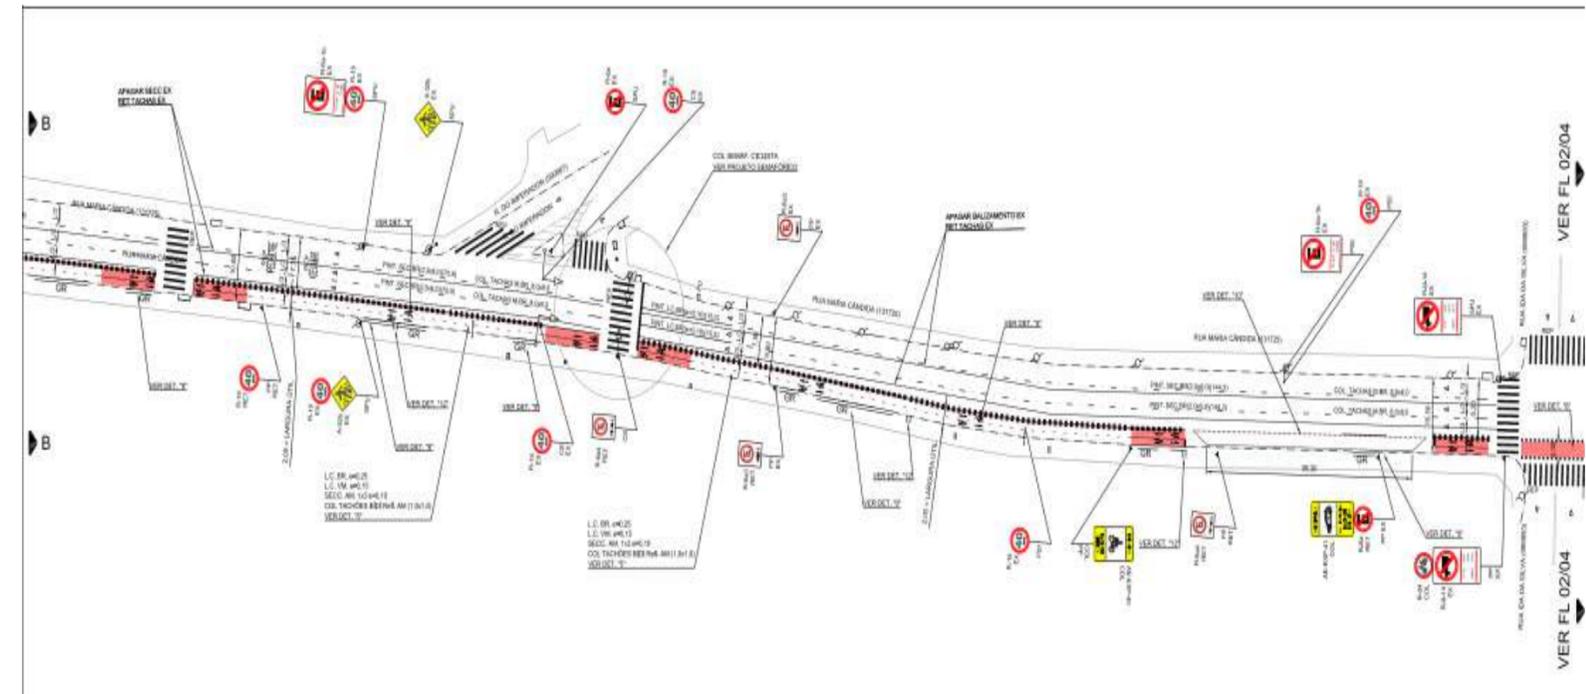


*Local Rua Maria Cândida
Foto Projeto Funcional
Nov/2022*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas José Maria Fernandes (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. José Maria Fernandes; Av. Amadeu Poli; Praça Novo Mundo / Vila Maria/Vila Guilherme
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038490-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

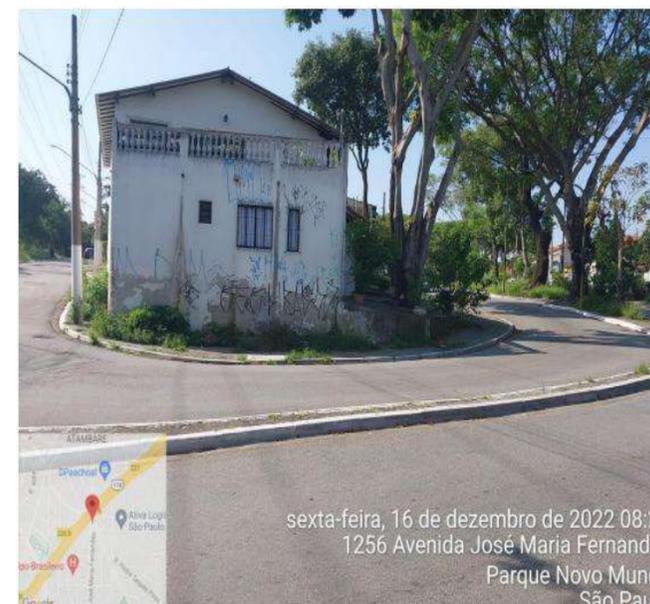


*Foto antes da Intervenção.
Dez/2022*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 3.551.421,75	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

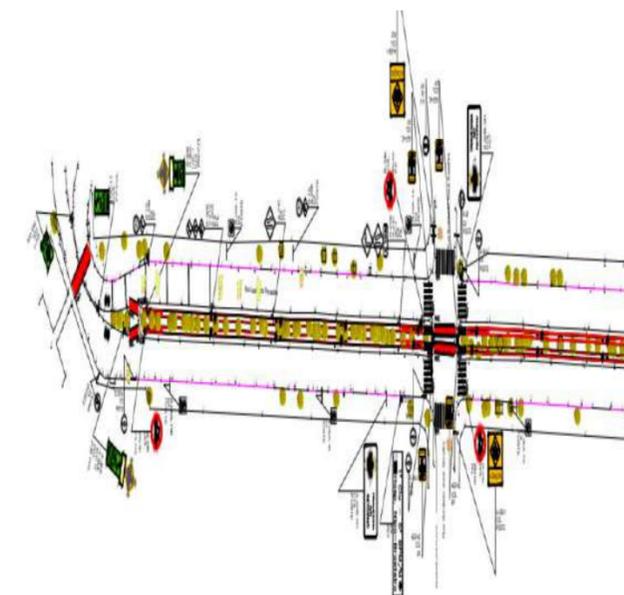

*Foto Projeto Funcional
Jun/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas José Maria Fernandes (**MOB**)

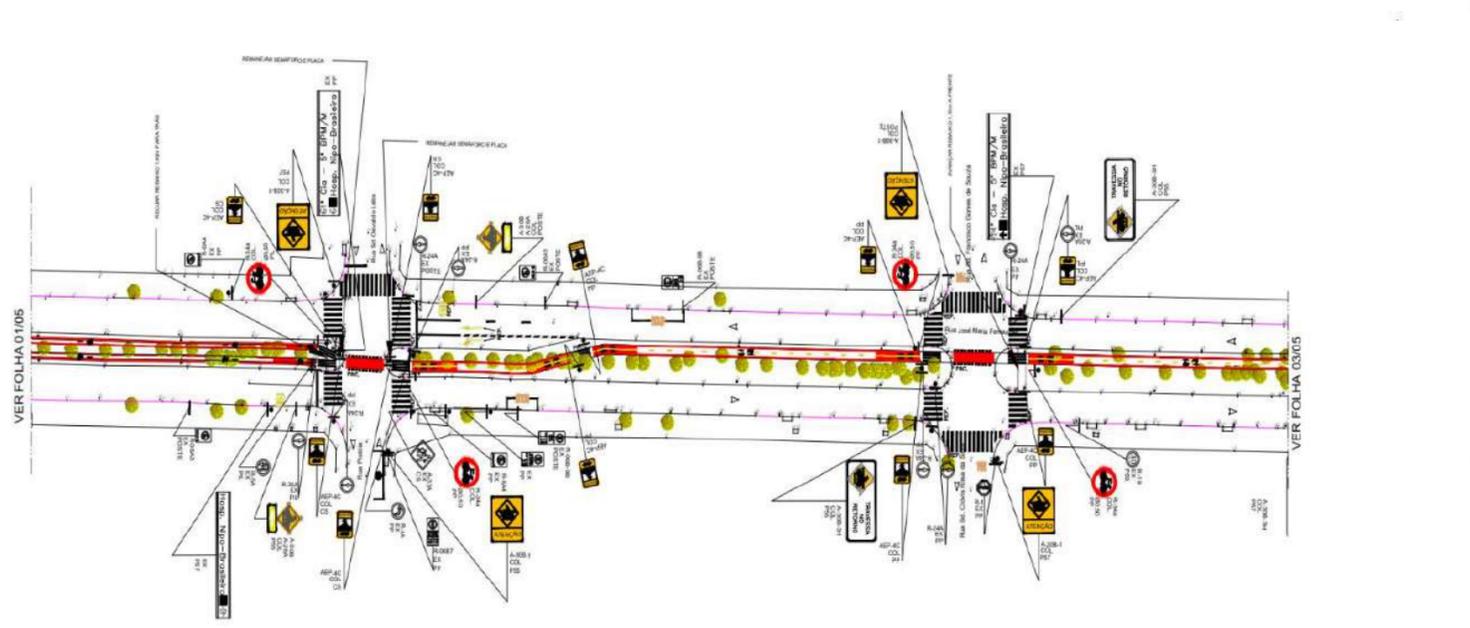

*Local Rua Sd. Francisco
Gomes de Souza
Foto Projeto Funcional
Jun/2023*



*Local Rua José Maria
Fernandes
Foto Projeto Funcional
Jun/2023*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Av. Guilherme (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Guilherme; Rua Maria Cândida; R. Chico Pontes/ Vila Mria/Vila Guilherme
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038490-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.116.974,84	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	






*Foto antes da Intervenção.
Out/2022*

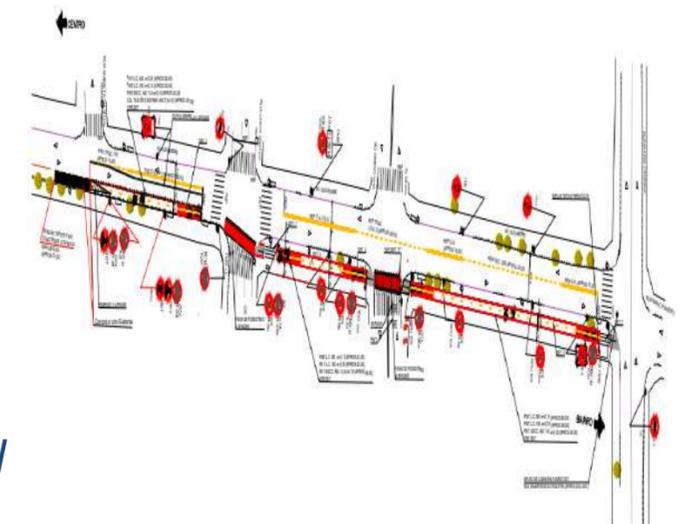

*Foto Projeto Funcional
Nov/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024
DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Av. Guilherme (MOB)

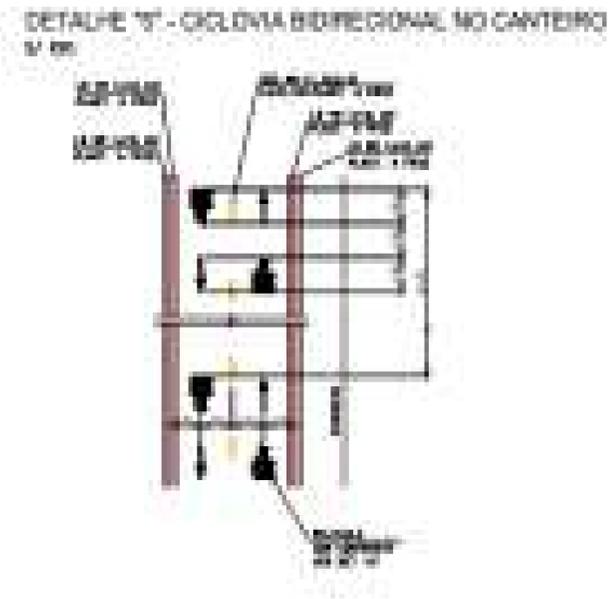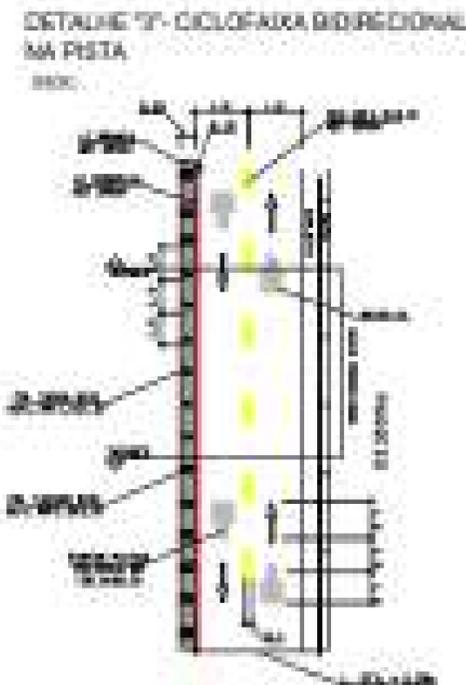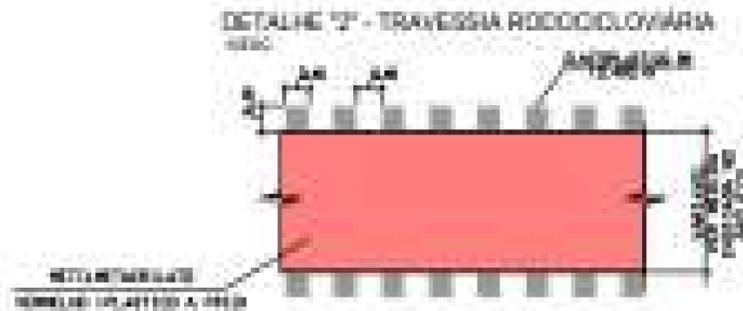

*Local Av. Guilherme
Foto Projeto Funcional
Nov/2022.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Alberto Byington (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Mere Amedea; R. Ararituaguaba; Av. Alberto Byington; Rua Mere Amedea; R. Canhoneira Mearim; R. Arisugawa; Pça Mikado; Av. Cerejeiras/ Vila Maria/Vila Guilherme
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038490-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim




*Foto antes da Intervenção.
Mar/2023*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 4.249.844,83	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

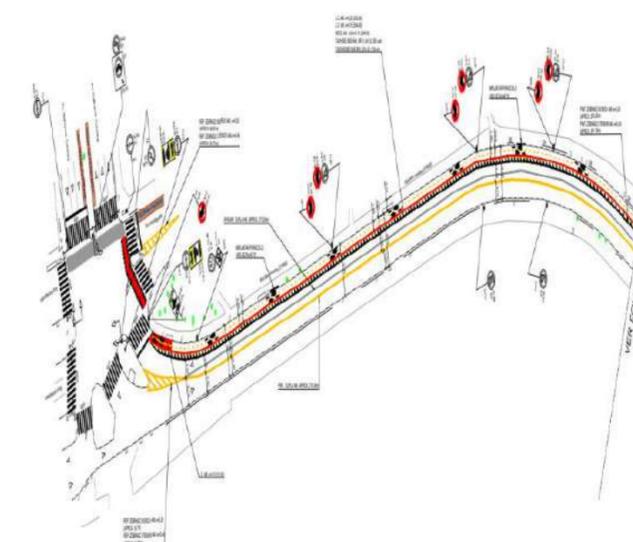


*Foto Projeto Funcional
Jul/2023.*


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Alberto Byington (**MOB**)

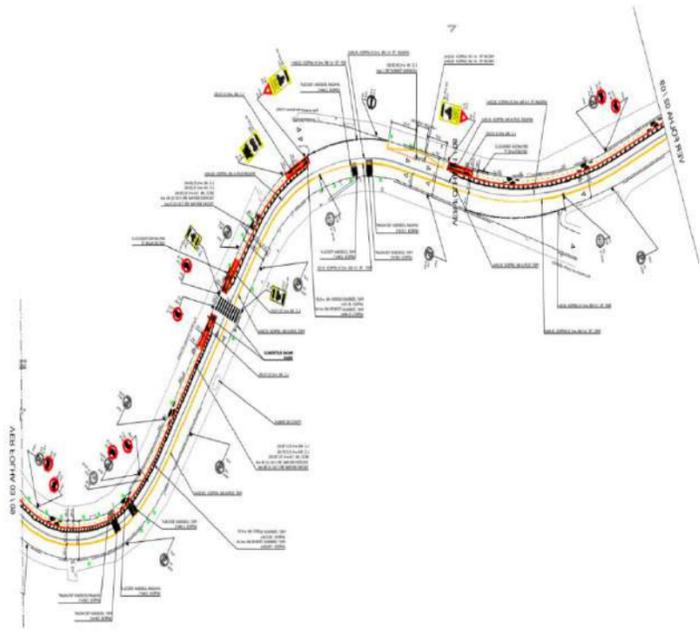


Local Rua Mere Amedea
Foto Projeto Funcional
Jul/2023.

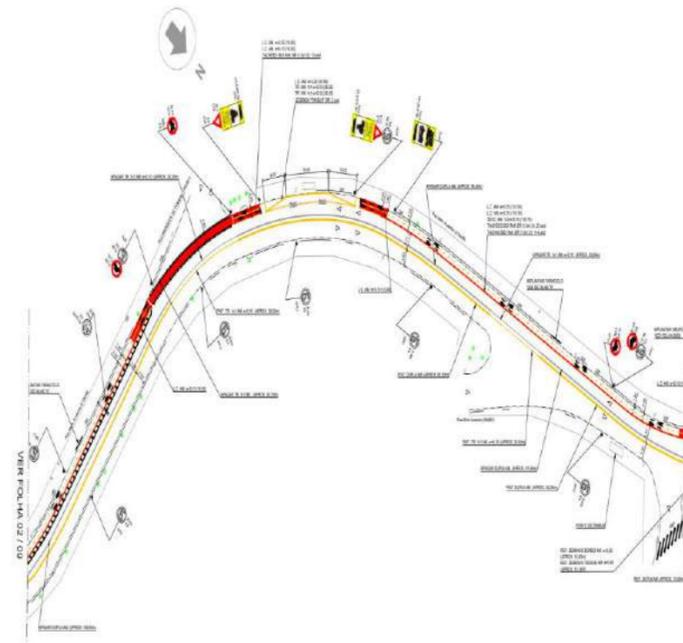

Local Rua Mere Amedea
Foto Projeto Funcional
Jul/2023.

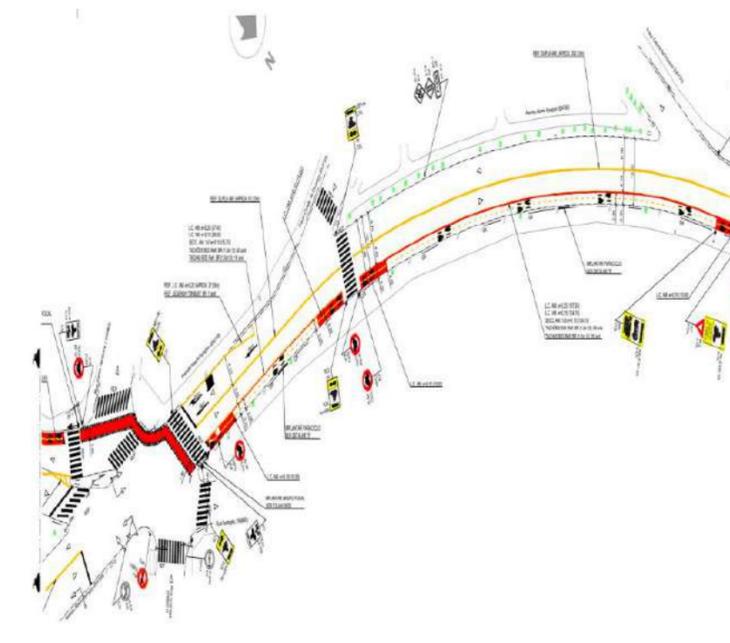

Local Rua Mere Amedea
Foto Projeto Funcional
Jul/2023.

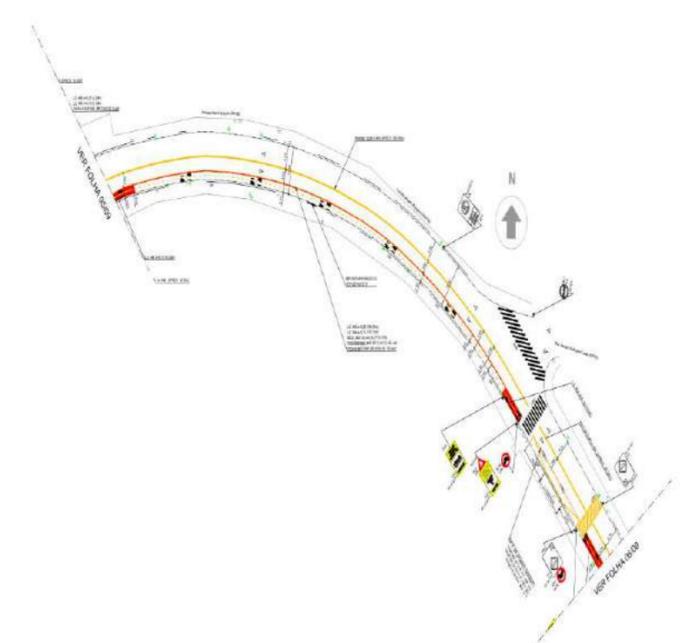

Local Av. Alberto Byington
Foto Projeto Funcional
Jul/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Amaro F. da Silveira (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Osaka; Av. Cerejeiras ; Av Sarg Miguel De Sousa Filho; Av Tte Amaro Felicissimo Da Silveira; Av Sarg Miguel De Sousa Filho; R Sold Rafael Pereira/ Vila Maria/Vila Guilherme
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038490-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 4.462.699,80	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	




*Foto antes da Intervenção.
Nov/2022*

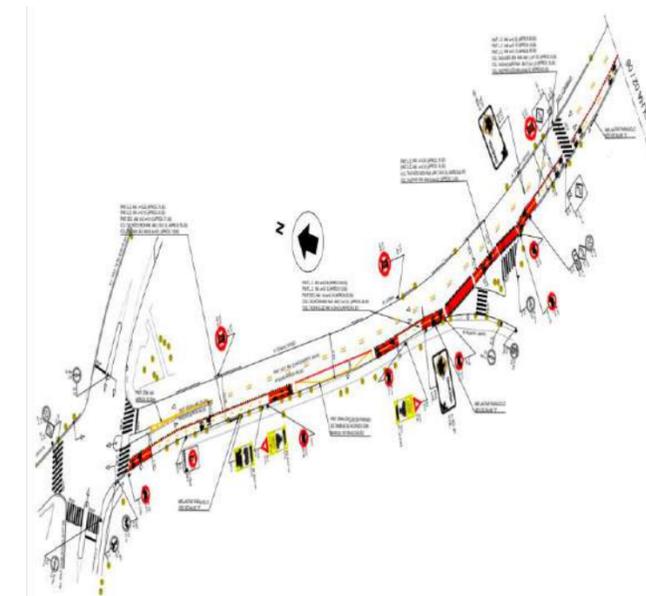


*Foto Projeto Funcional
Jun/2023.*


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Amaro F. da Silveira (**MOB**)

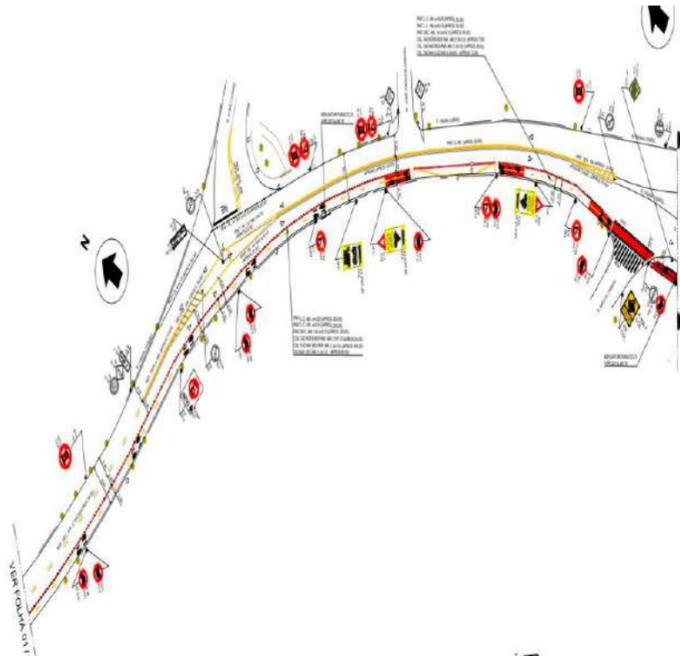


Local Rua Osaka
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.

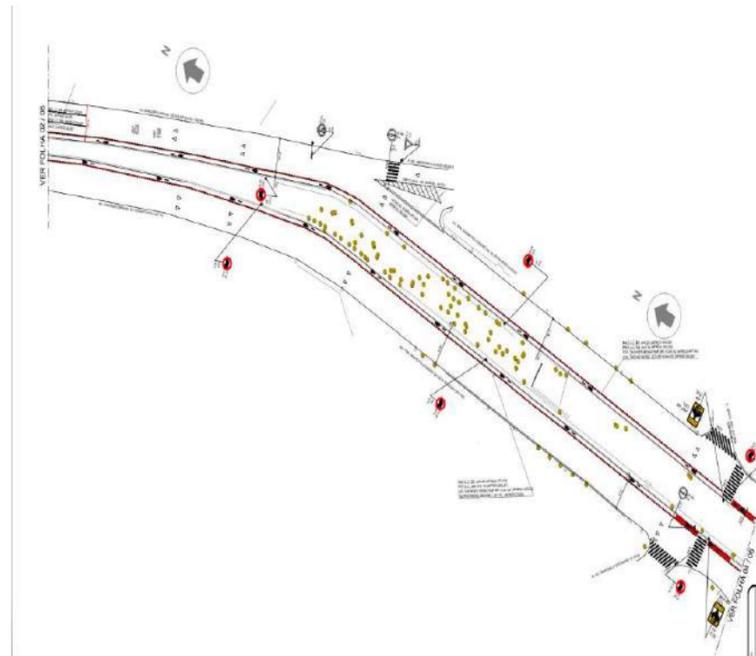

Local Av. Ten. Amaro F. da
Silveira
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.

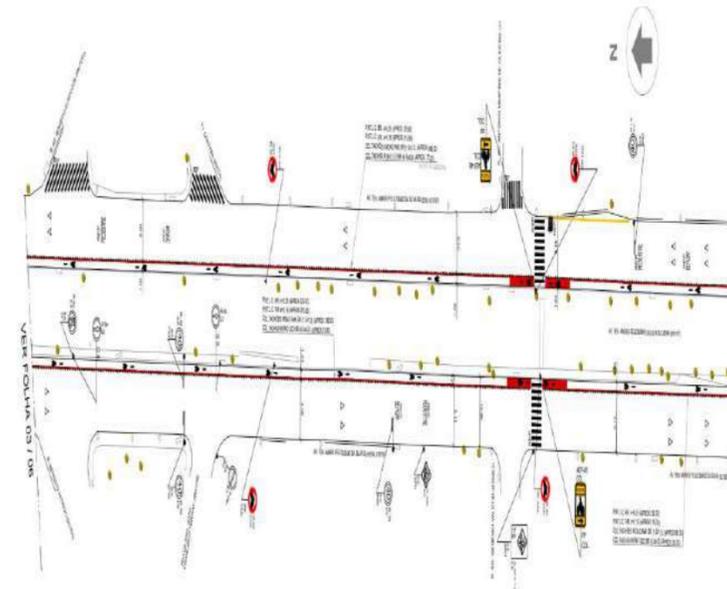

Local Av. Ten. Amaro F. da
Silveira
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.

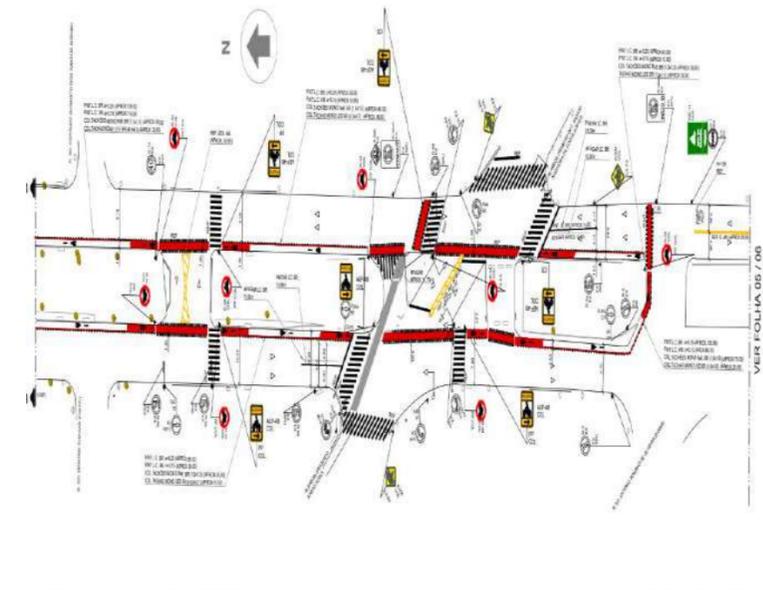

Local Av. Ten. Amaro F. da
Silveira
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Jardim Japão (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Jardim Japão; Av. João Simão de Castro; Av. Júlio Bueno/ Vila Maria/Vila Guilherme
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038490-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim




*Foto antes da Intervenção.
Out/2023*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.751.232,24	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

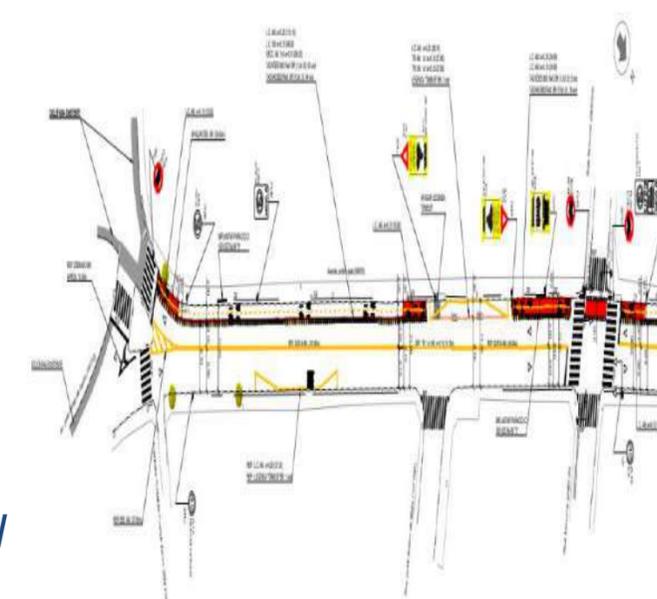


*Foto Projeto Funcional
Jul/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Jardim Japão(MOB)

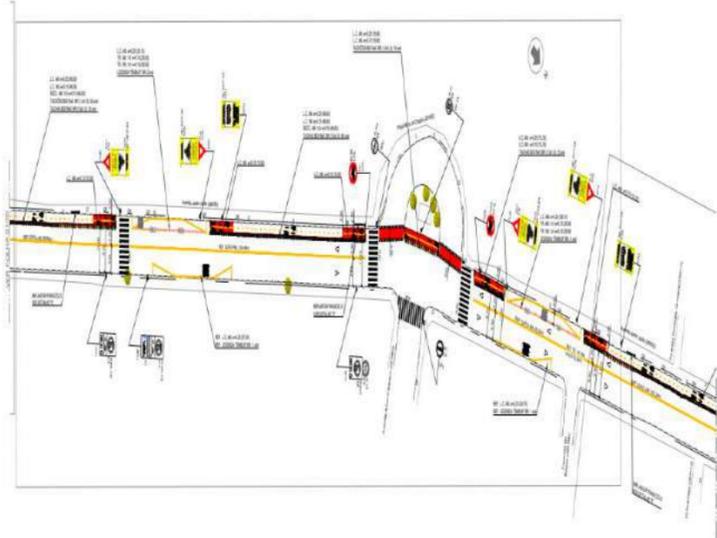

*Local Av. Jardim Japão
Foto Projeto Funcional
Jul/2023*

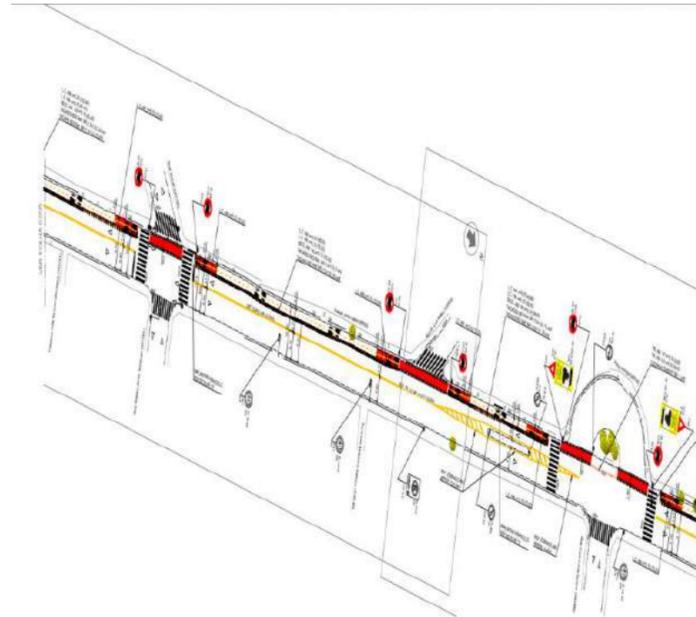

*Local Av. Jardim Japão
Foto Projeto Funcional
Jul/2023*



*Local Av. Jardim Japão
Foto Projeto Funcional
Jul/2023*



*Local Av. Jardim Japão
Foto Projeto Funcional
Jul/2023*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL/ 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Gueixas(MOB)


DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Yoritomo; Av. Cerejeiras; Av. das Gueixas; Passarela Rod. Pres. Dutra/ Vila Maria/ Vila Guilherme
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038490-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.228.116,90	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	




03 novembro 2022
26a Avenida das Cerejeiras
Jardim Japao
São Paulo

*Foto antes da Intervenção.
Nov/2022*

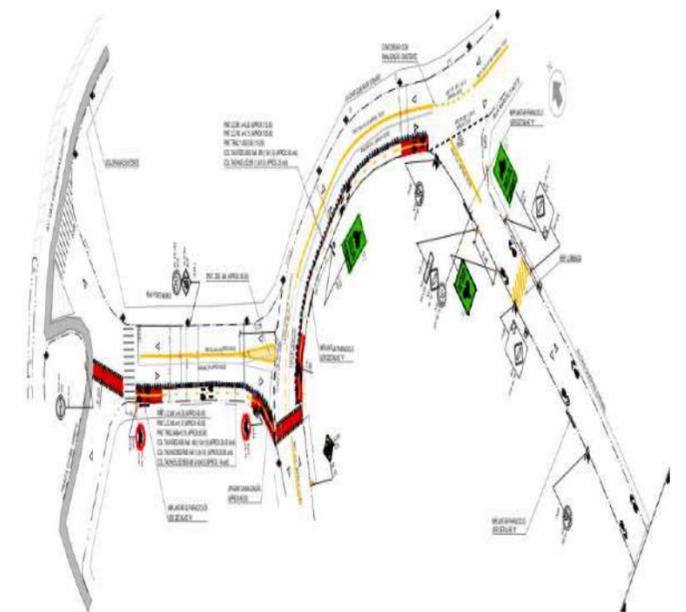


*Foto Projeto Funcional
Mar/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Gueixas (MOB)

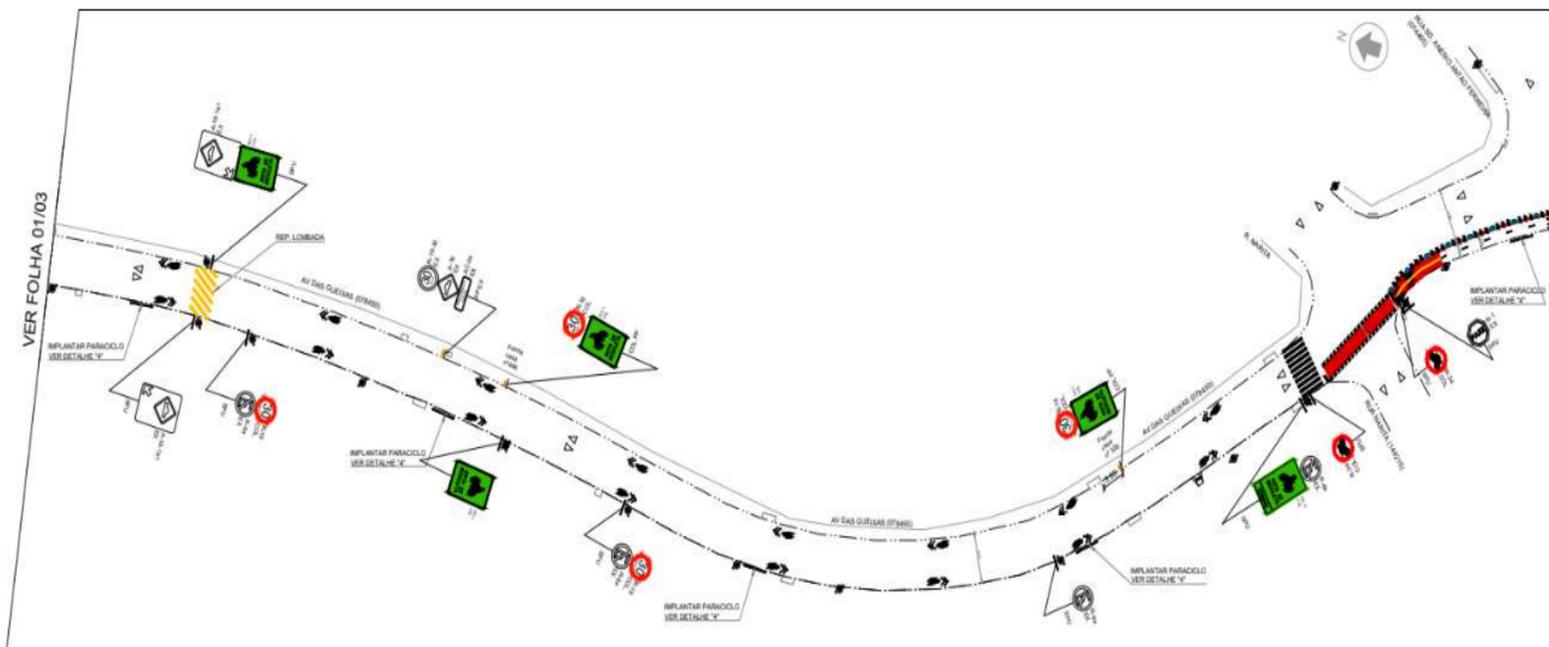

*Local Av. das Gueixas
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.*

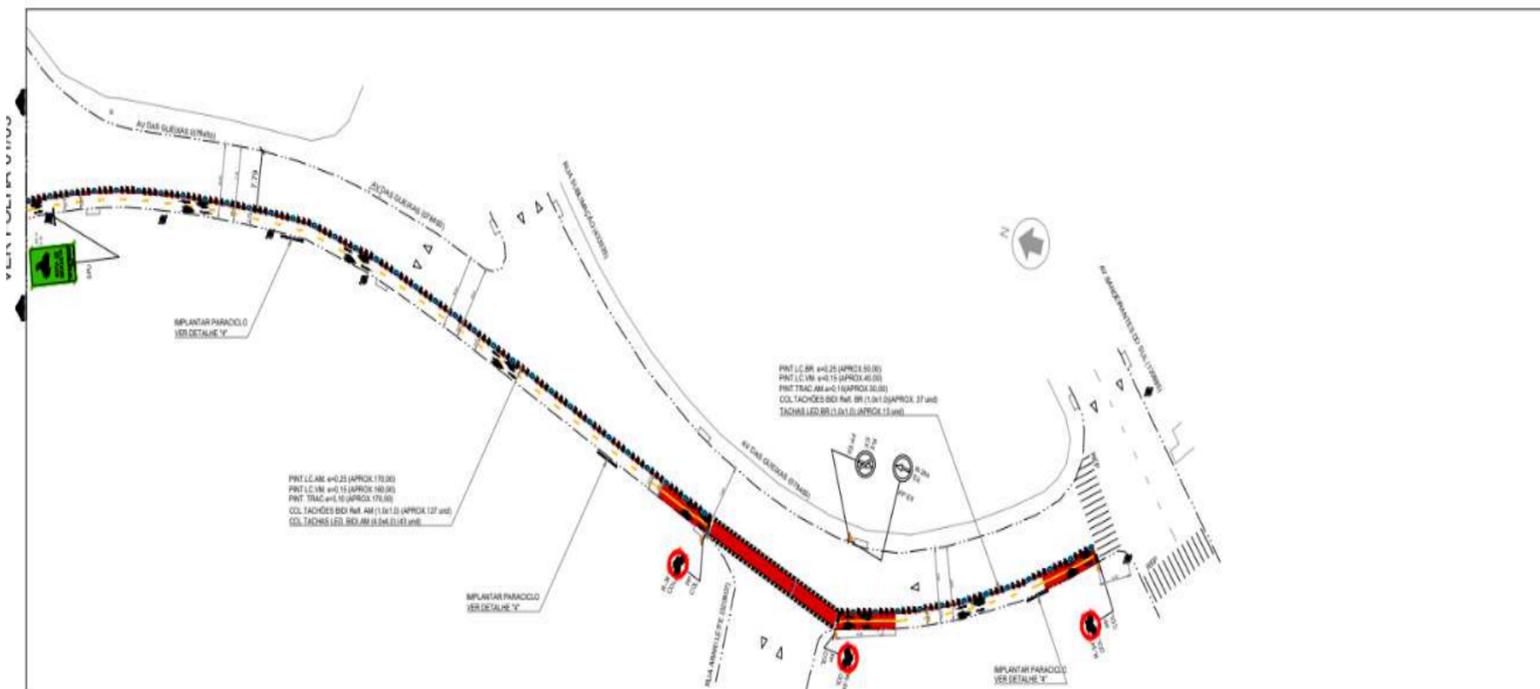

*Local Av. das Gueixas
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL/ 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Maria J.B. Fernandes (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Profª Maria José Barone Fernandes; Av.Nadir Dias de Figueiredo; Passarela Rod. Pres. Dutra ; R. Apinaco; R. Coronel Guilherme Rocha; R. Galileu Gaia; R. Apinaco; Viaduto Curuçá/ Vila Maria/Vila Guilherme
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038490-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 4.170.422,09	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



*Foto antes da Intervenção.
Out/2022*

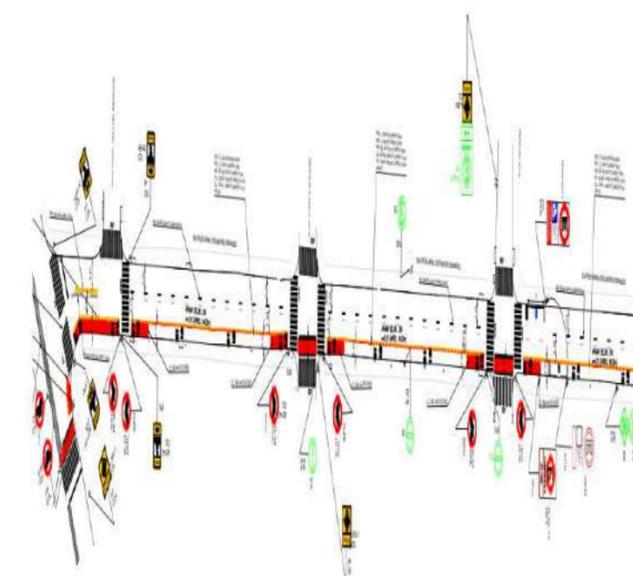


*Foto Projeto Funcional
Ago/2023.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Maria J.B. Fernandes (**MOB**)

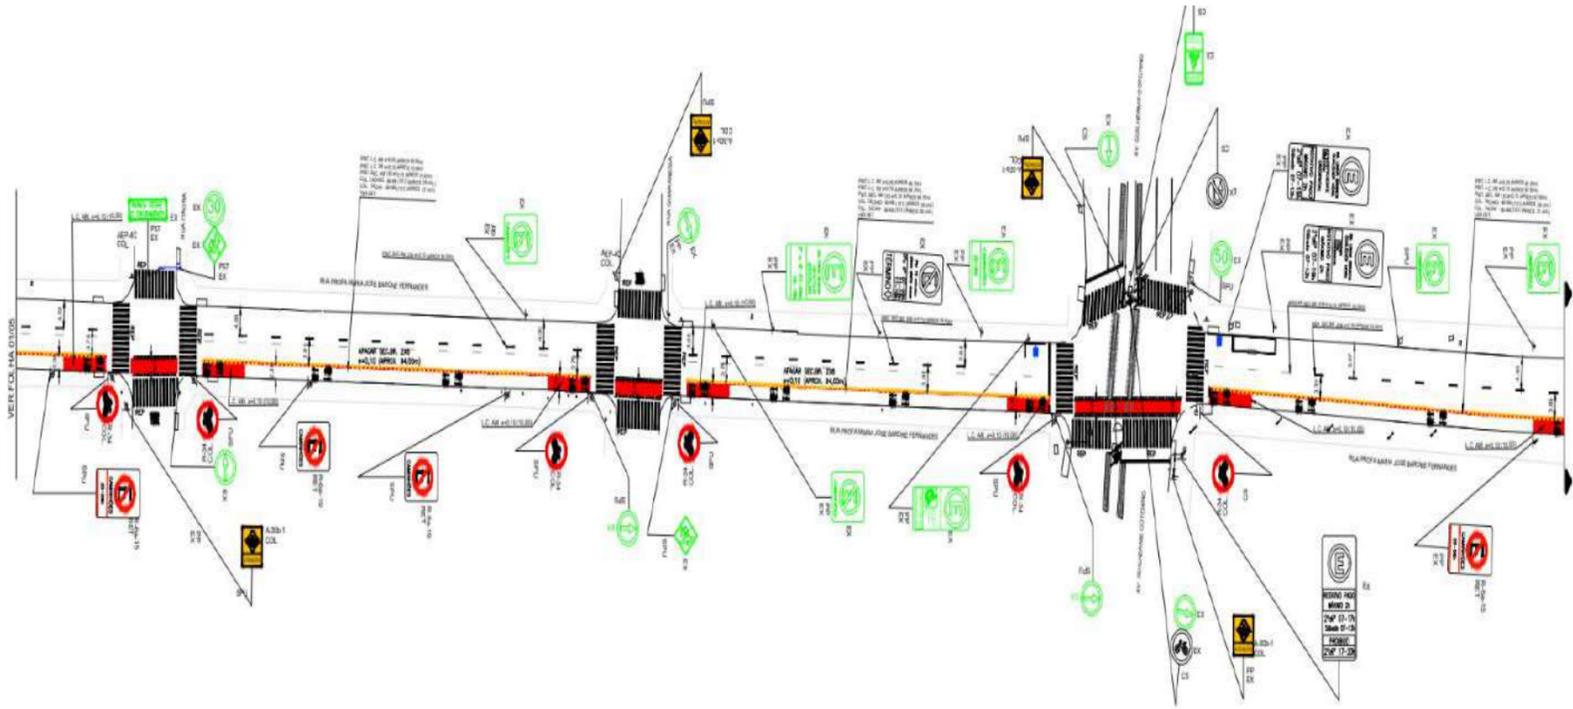

*Local Av. José M. Barone
Fernandes
Foto Projeto Funcional
Ago/2023.*

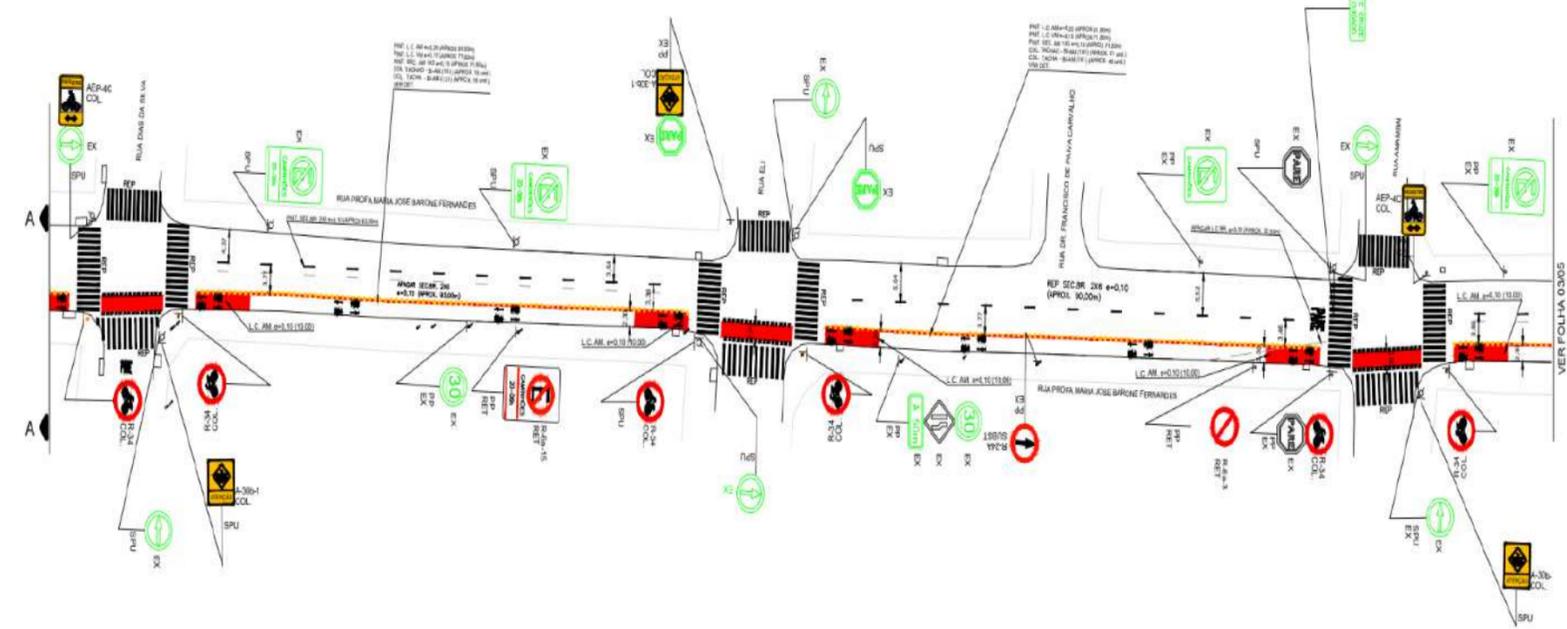

*Local Av. José M. Barone
Fernandes
Foto Projeto Funcional
Ago/2023.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL/ 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Conceição (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Conceicao; Av Cerejeiras; Al 2º Sarg Geraldo Berti; Pc Gal Milton Tavares De Souza; Av Tte Amaro Felicissimo Da Silveira; R. Cabo João Fagundes Machado; Passarela Rod. Pres. Dutra/ Vila Maria/Vila Guilherme
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038490-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.898.920,11	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$	
Valor Pago	R\$	



*Foto antes da Intervenção.
Nov/2022*

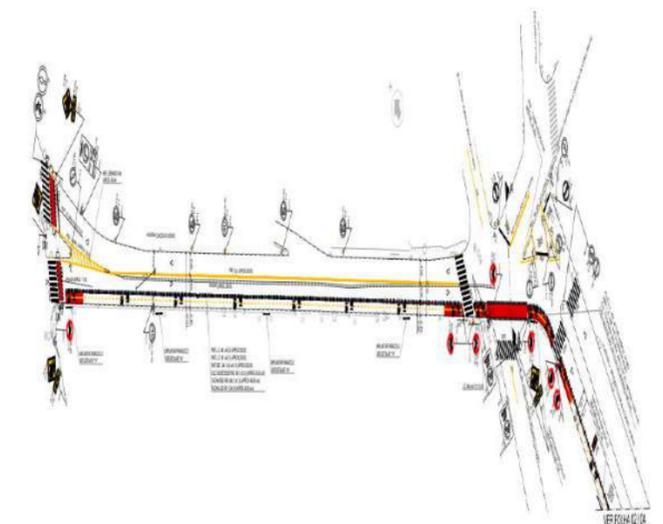


*Foto Projeto Funcional
Abr/2023.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Conceição (**MOB**)

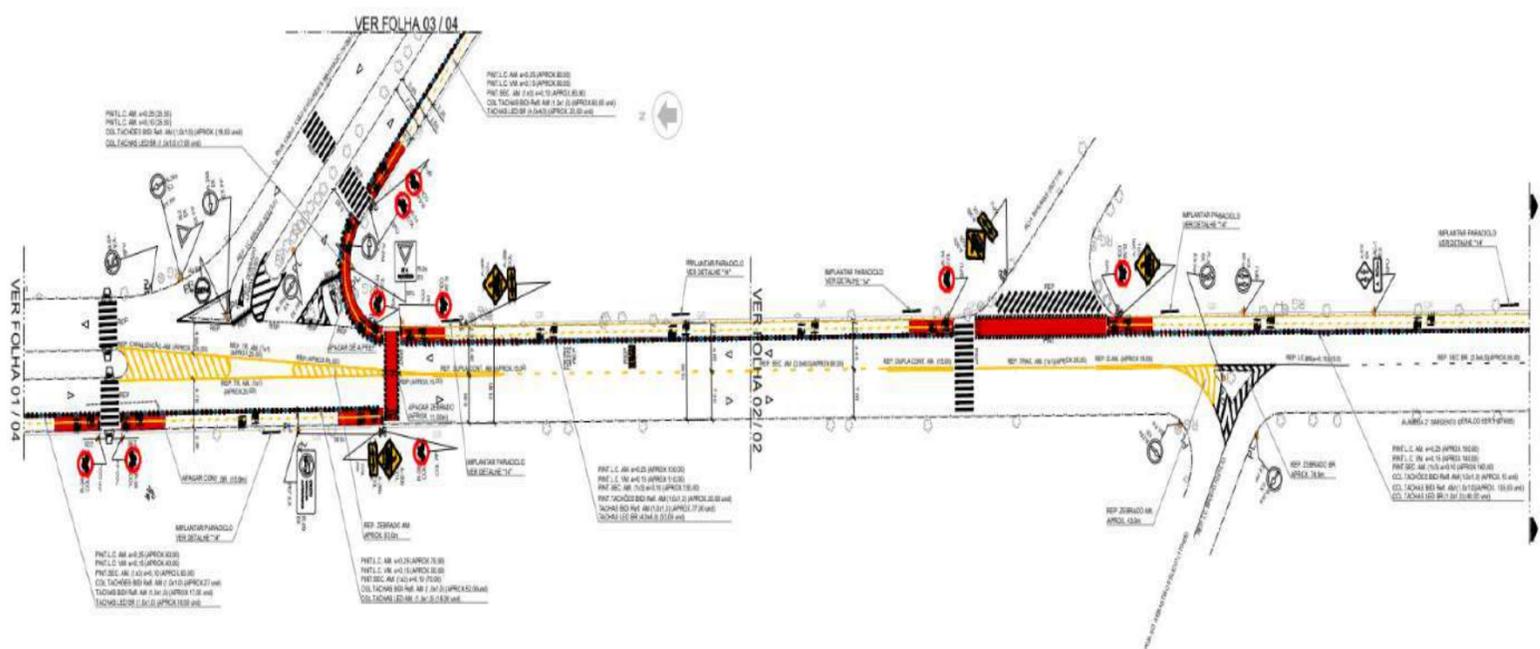

*Local Av. Alameda 2º Sargento
Geraldo Berti
Foto Projeto Funcional
Abr/2023.*

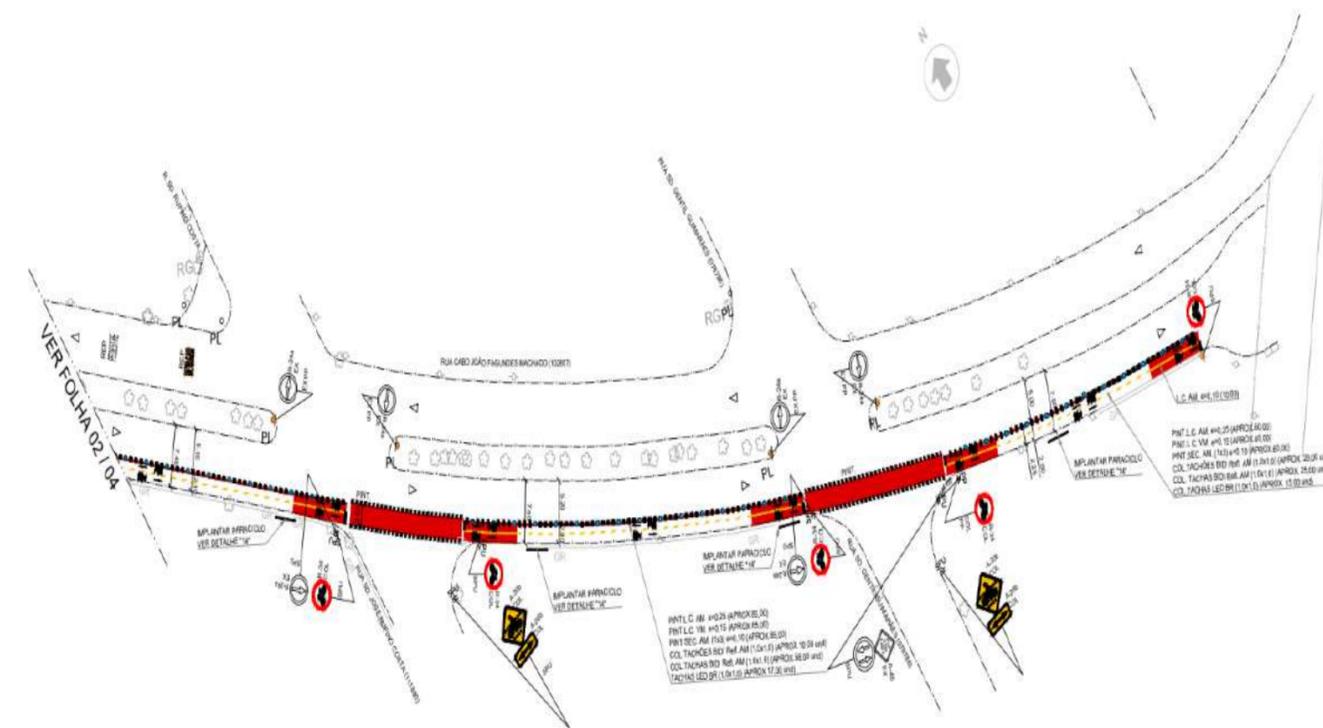

*Local Rua Cabo João
Fagundes Machado
Foto Projeto Funcional
Abr/2023.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Roland Garros (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Roland Garros; Av. Edu Chaves; Av. Jardim Japão/ Vila Maria/Vila Guilherme
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038490-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Jan/2023*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 2.130.643,85	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$	
Valor Pago	R\$	

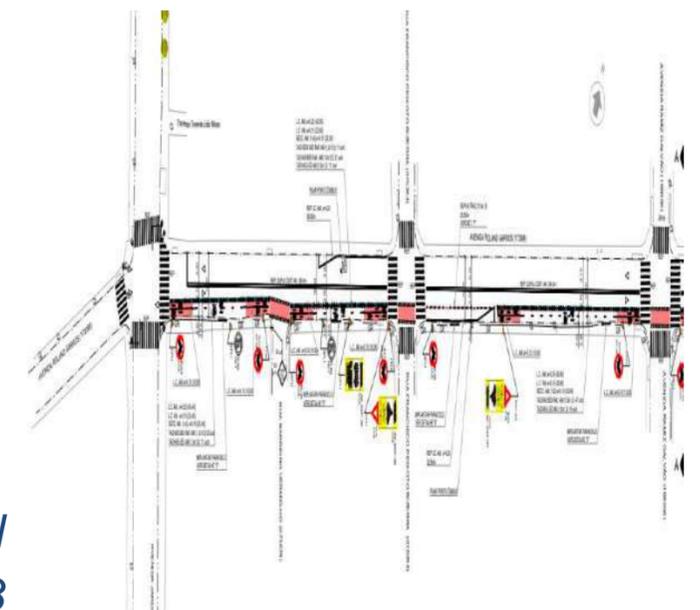


*Foto Projeto Funcional
Mar/2023*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Roland Garros (**MOB**)

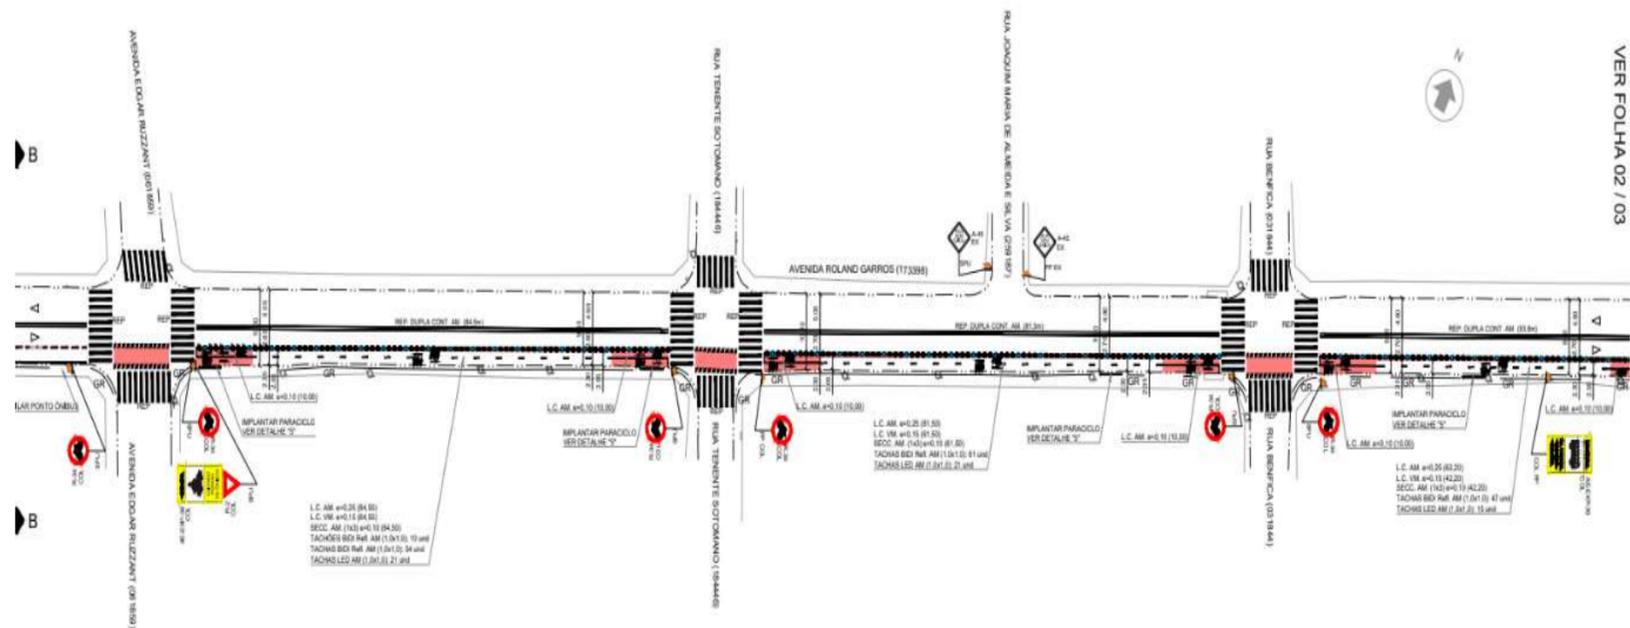

Local Av. Roland Garros
Foto Projeto Funcional
Mar/2023

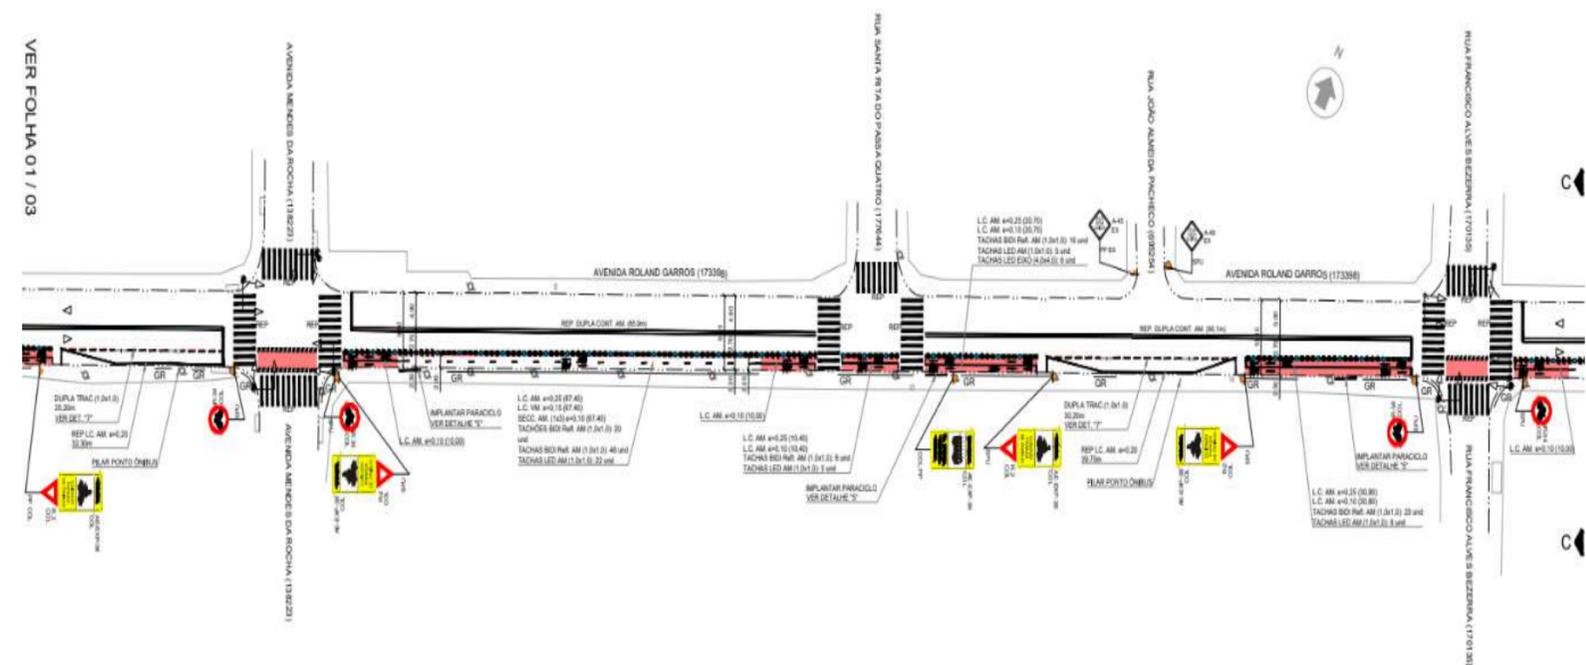

Local Av. Roland Garros
Foto Projeto Funcional
Mar/2023


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Camargo(MOB)


DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Pça. Vicente Rodrigues/ Butantã
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	60202022/0038491-5
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.199.977,30	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

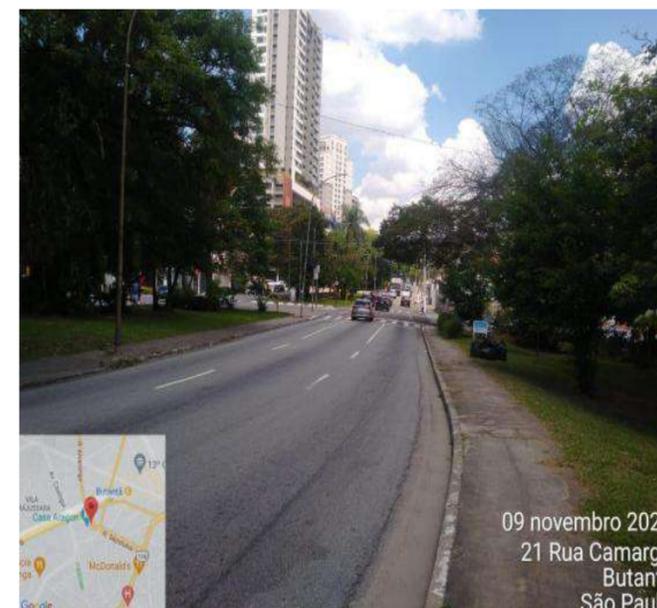


09 novembro 2022
21 Rua Camargo
Butantã
São Paulo

*Foto antes da Intervenção.
Nov/2022*

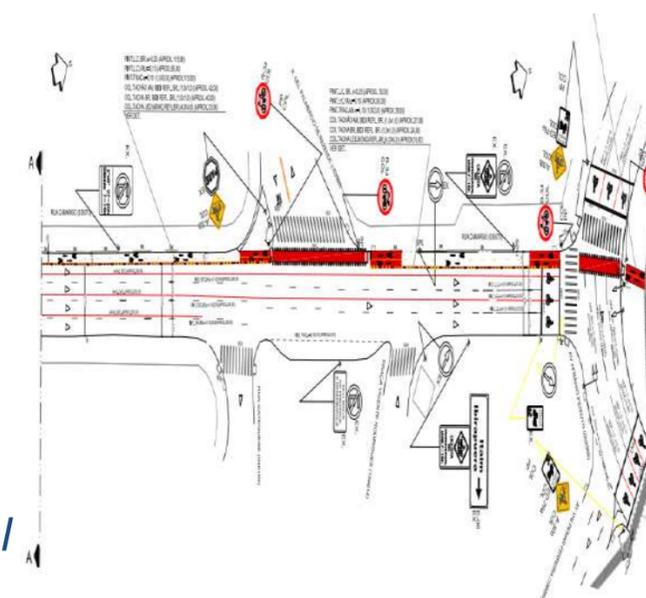

*Foto Projeto Funcional
Abr/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Camargo (**MOB**)

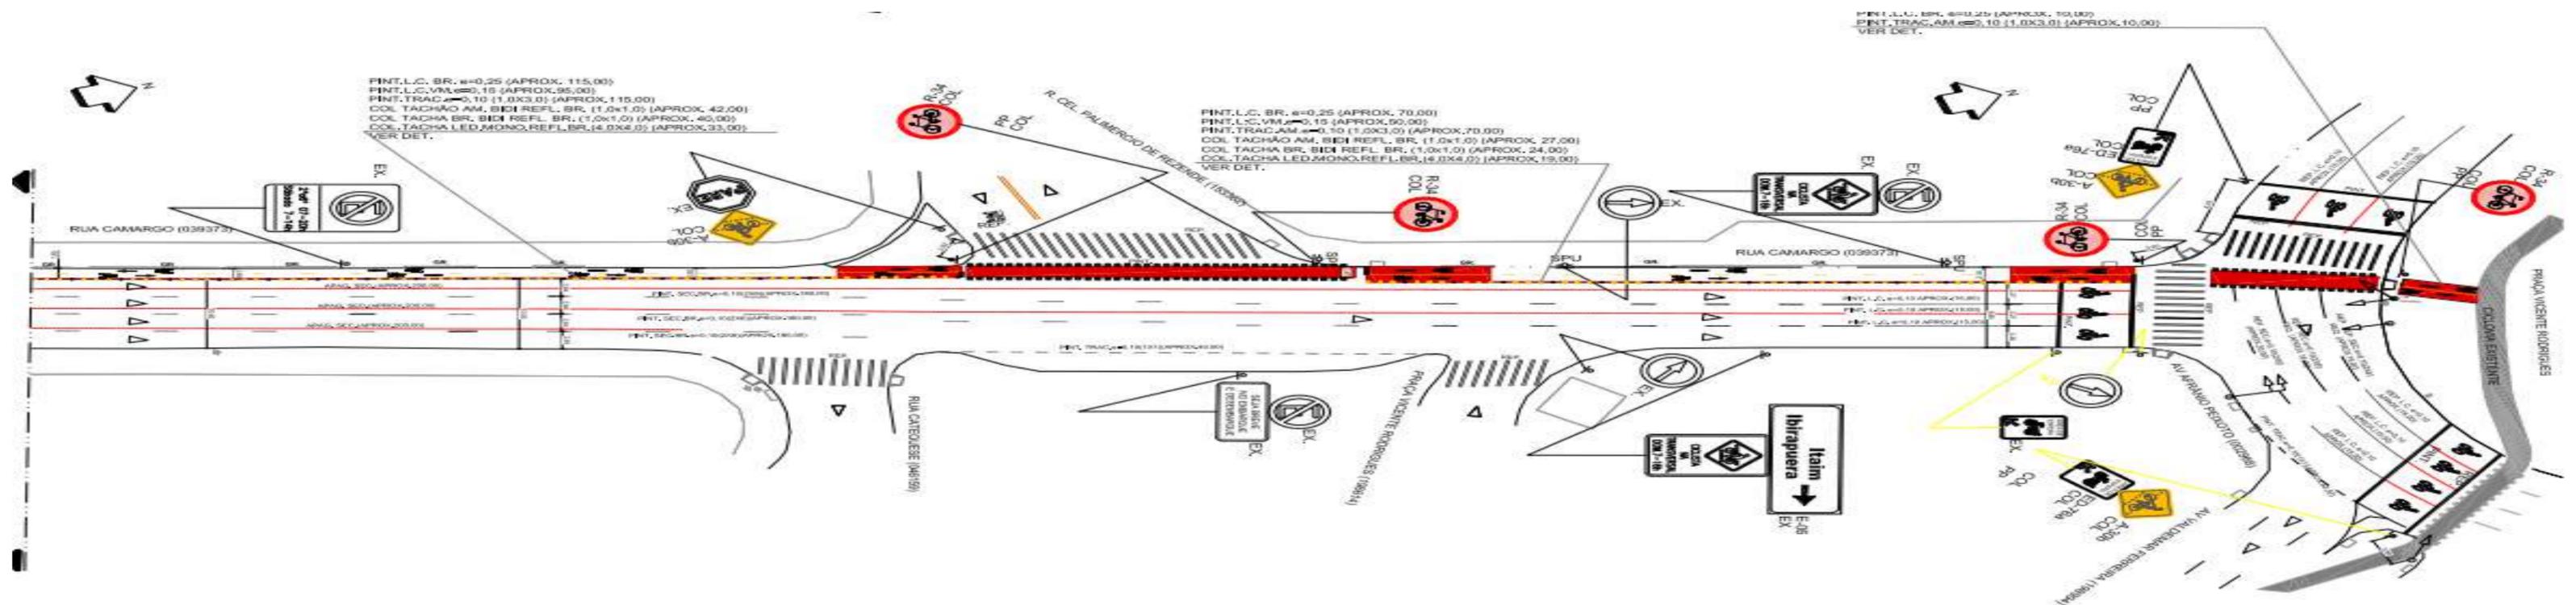


Local Rua Camargo
Foto Projeto Funcional
Abr/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Gal. Asdrúbal da Cunha (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Gal. Asdrúbal da Cunha; R. Eudoro Lincoln Berlinck/ Lapa
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	60202022/0038491-5
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

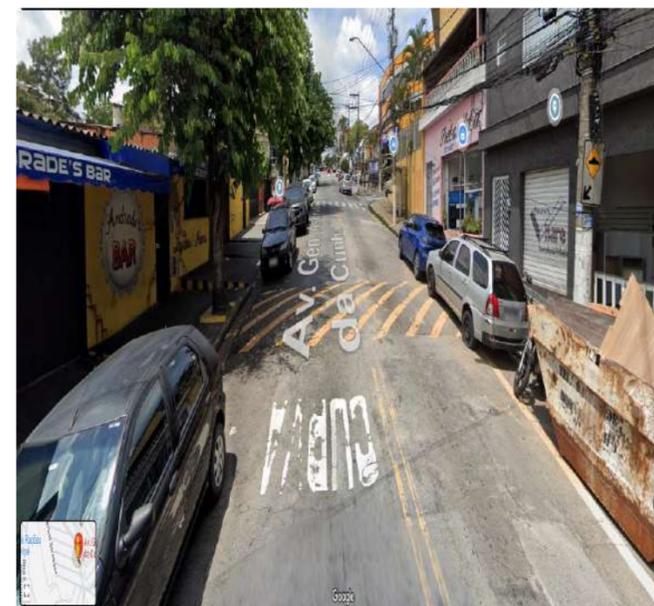


*Foto antes da Intervenção.
Mar/2022*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 441.954,19	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$	
Valor Pago	R\$	

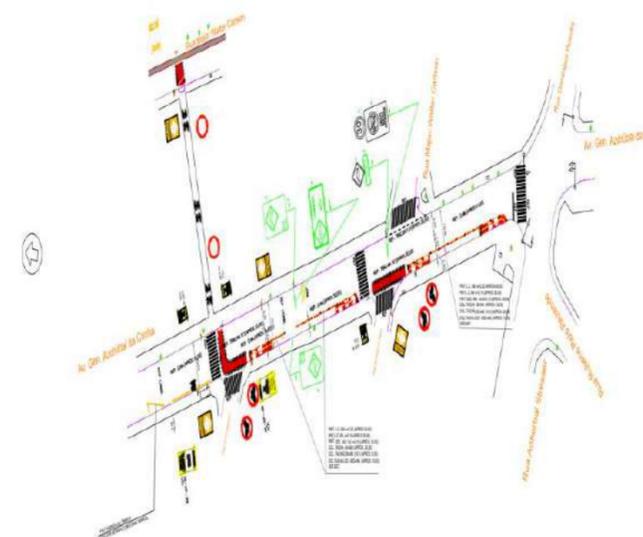

*Foto Projeto Funcional
Mai/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Gal. Asdrúbal da Cunha (MOB)

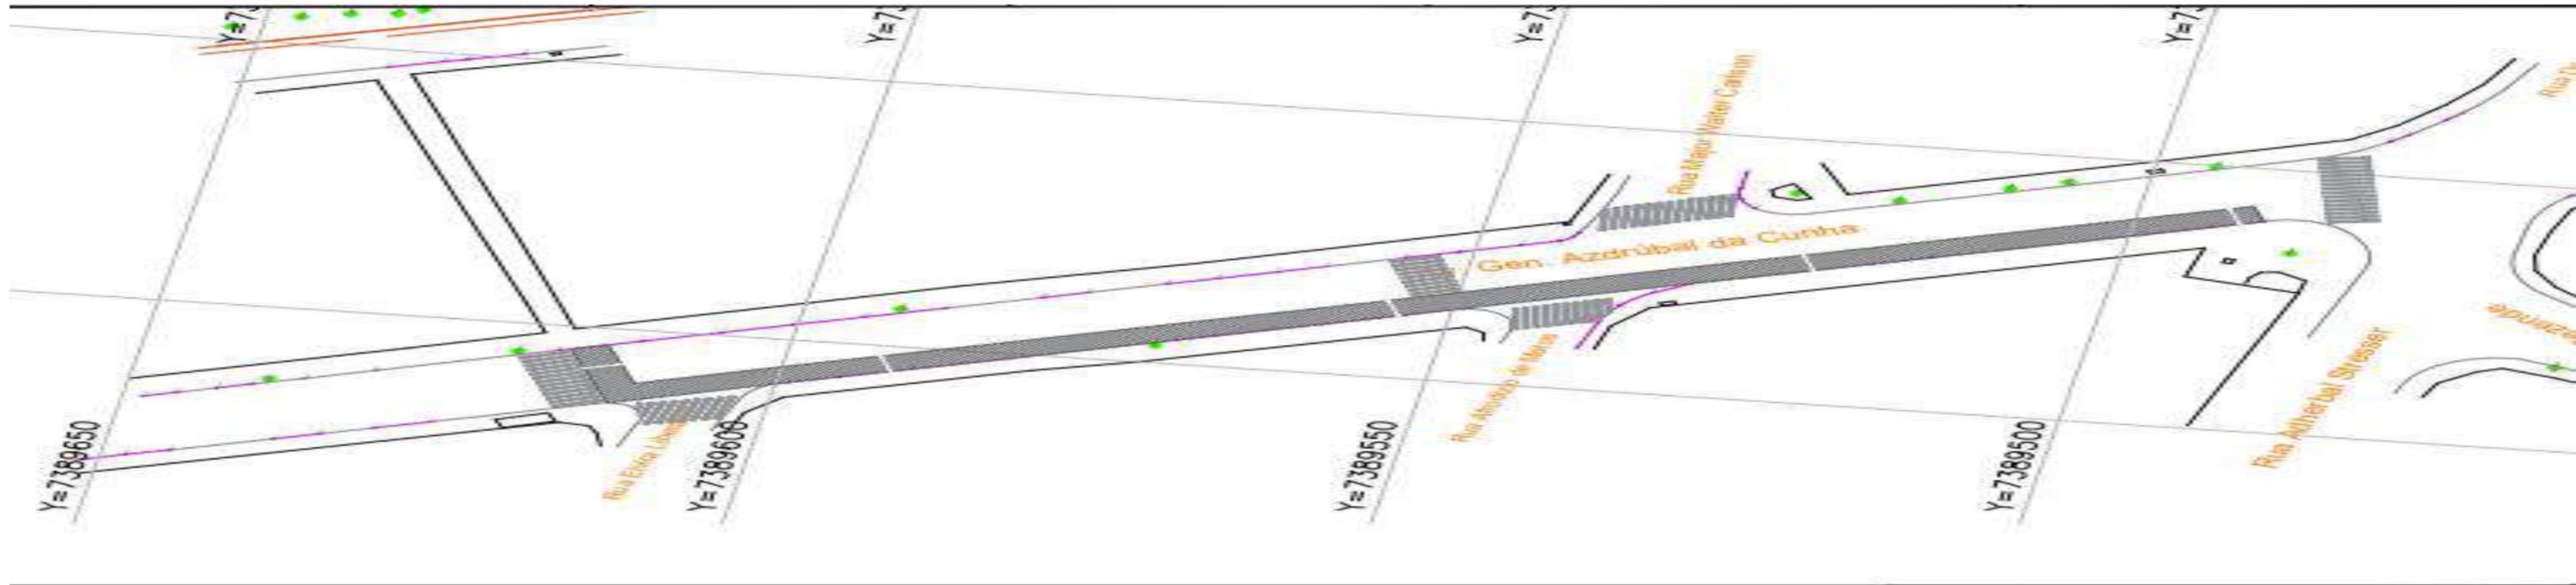


*Local Av. Gen. Asdrúbal da
Cunha
Foto Projeto Funcional
Mai/2023*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Adherbal Stresser (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Adherbal Stresser; R. Heidar Labre França/ Butantã
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	60202022/0038491-5
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

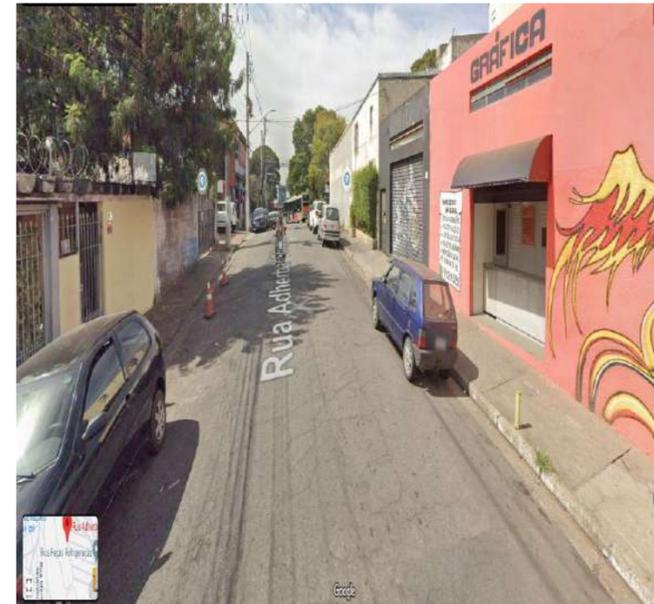


*Foto antes da Intervenção.
Mai/2024*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 292.923,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

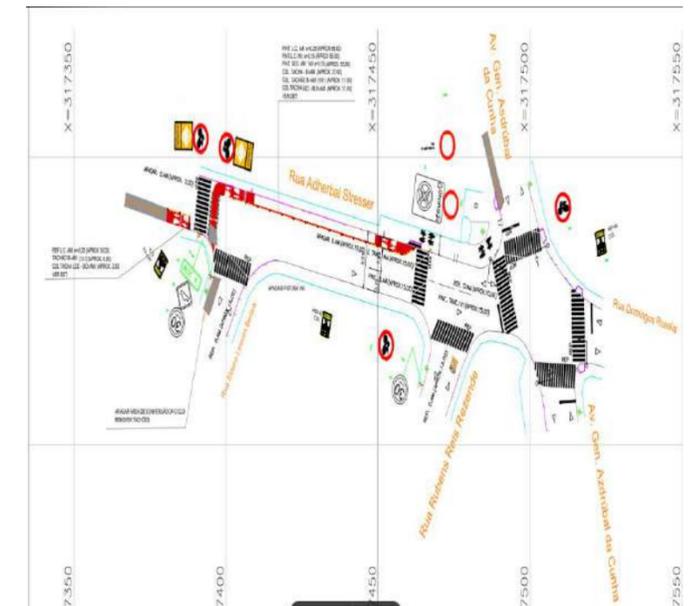

*Foto Projeto Funcional
Mai/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Adherbal Stresser (**MOB**)

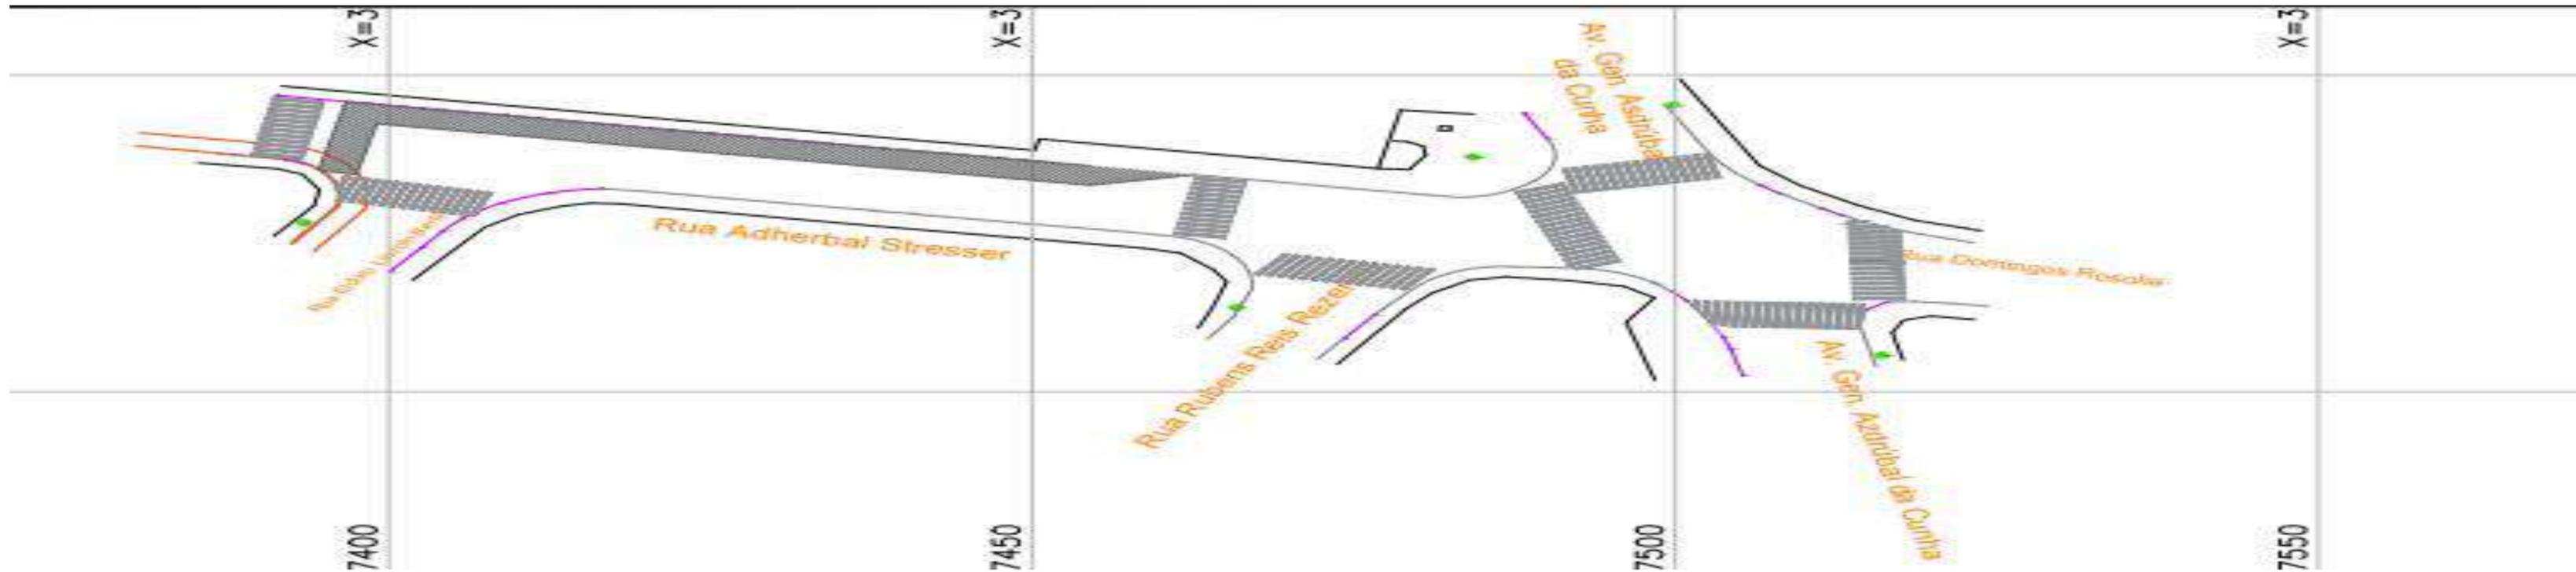

Local Rua Adherbal Stresser
Foto Projeto Funcional
Mai/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Sapetuba (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Sapetuba; R. Alvarenga; Av. Prof. Francisco Morato/ Butantã
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	60202022/0038491-5
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.604.791,95	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	




*Foto antes da Intervenção.
Nov/2022*

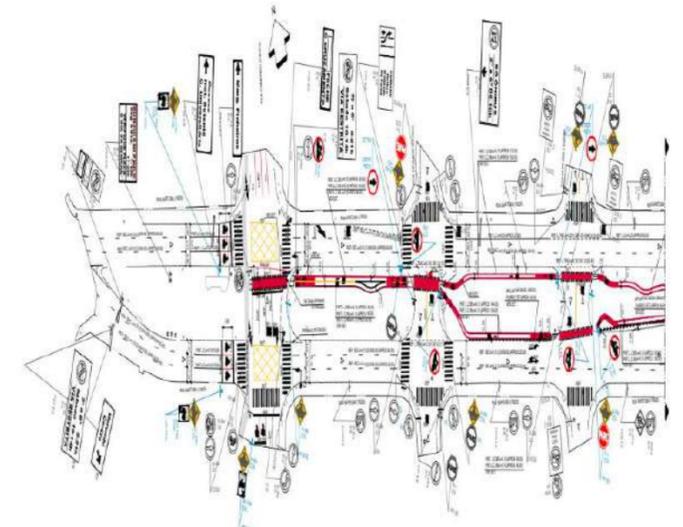

*Foto Projeto Funcional
Mar/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Sapetuba (**MOB**)

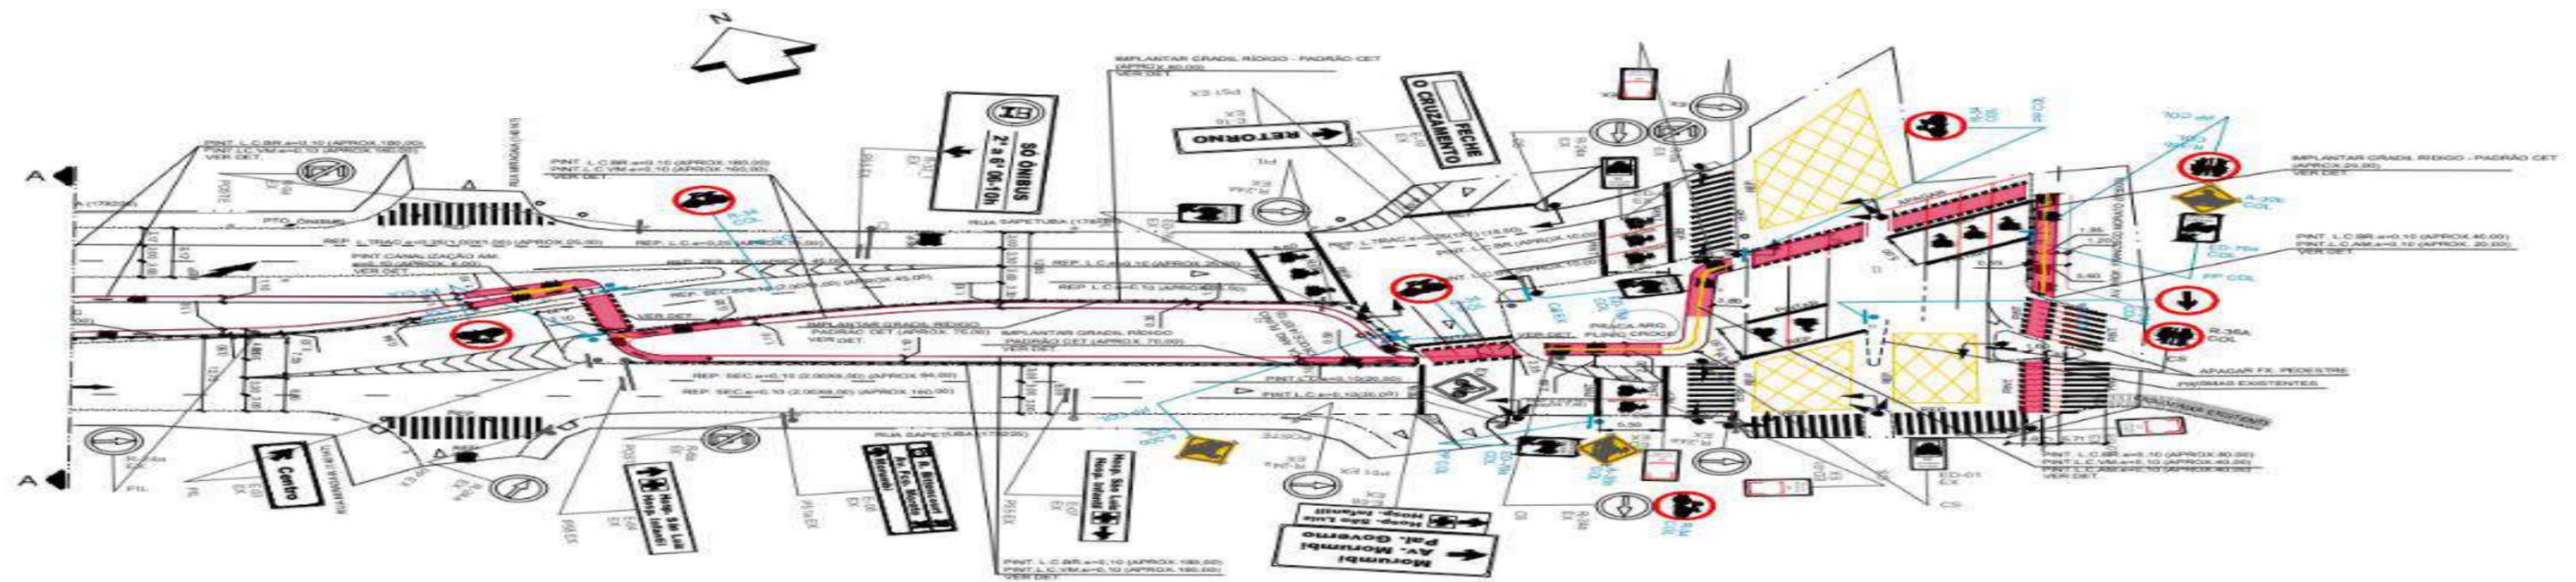

Local Rua Sapetuba
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Waldemar Roberto (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. do Rio Pequeno; Av. Escola Politécnica/Butantã
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	60202022/0038491-5
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 671.063,73	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



*Foto antes da Intervenção.
Nov/2022*

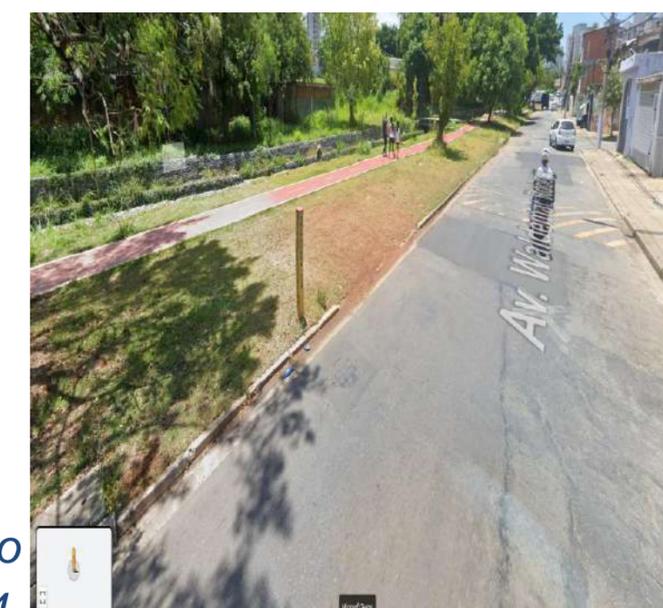

*Foto em execução
Jan/2024.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Waldemar Roberto (**MOB**)



*Local Rua Waldemar Roberto
Foto em execução
Jan/2024.*



*Local Dr. Bernardo
Guertzenstein
Foto em execução
Jan/2024.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Santa Marina (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Ermano Marchetti ; Estação Água Branca Cptm/ Lapa
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	60202022/0038491-5
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim




*Foto antes da Intervenção.
Jan/2023*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 894.699,17	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

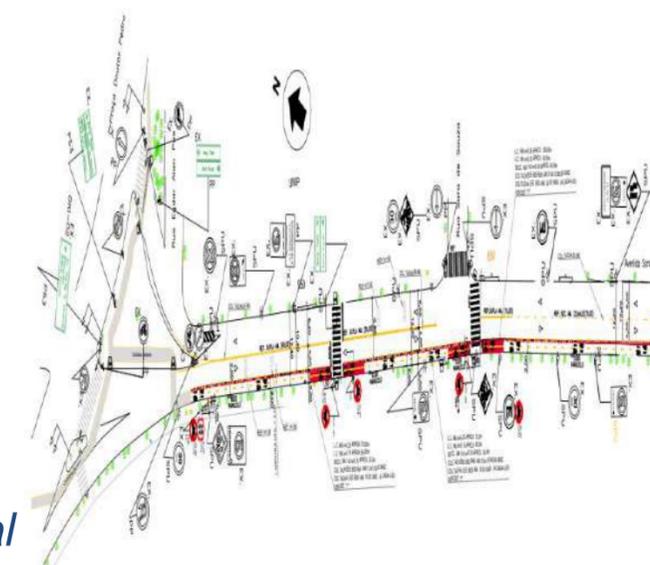


*Foto Projeto Funcional
Mar/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Santa Marina (MOB)

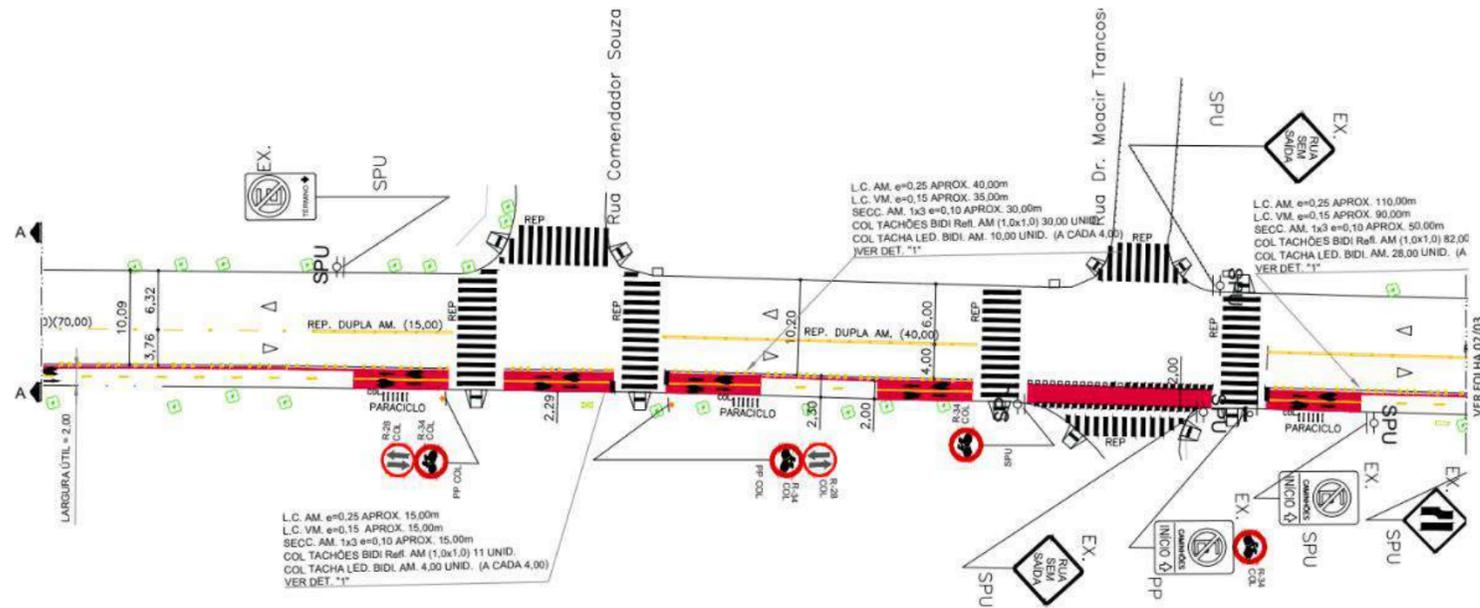

Local Av. Santa Marina
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

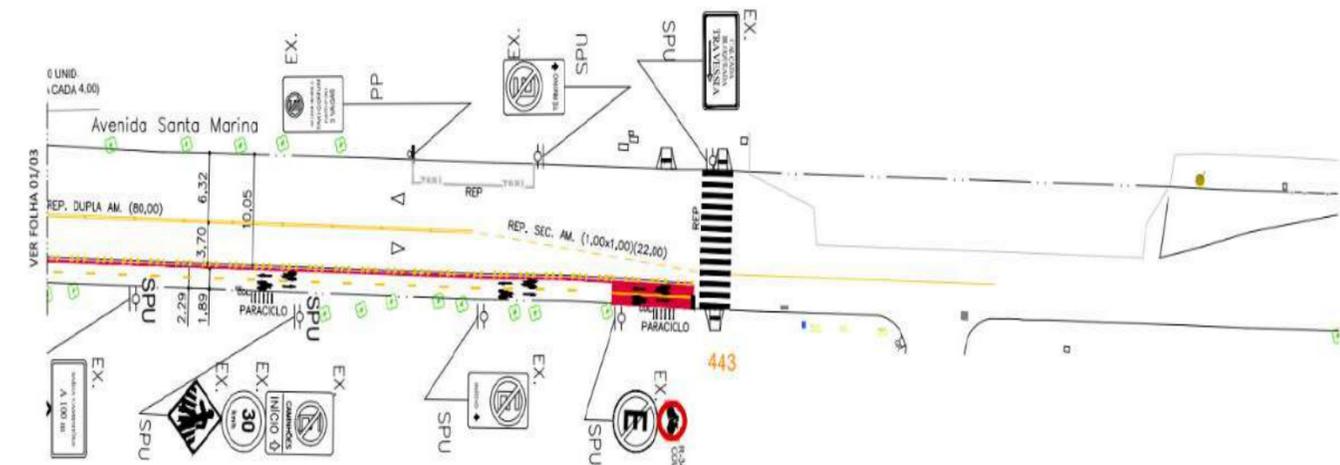

Local Av. Santa Marina
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Queiroz Filho (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Queiroz Filho;Praça Apecatu; R. Padre Pereira de Andrade/ Lapa
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038566-0
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 3.941.501,50	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	




*Foto antes da Intervenção.
Nov/2022*

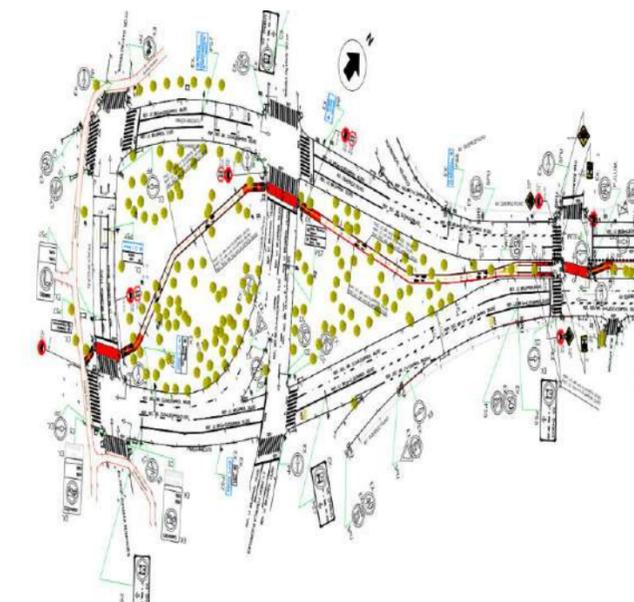


*Foto Projeto Funcional
Abr/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Queiroz Filho (**MOB**)

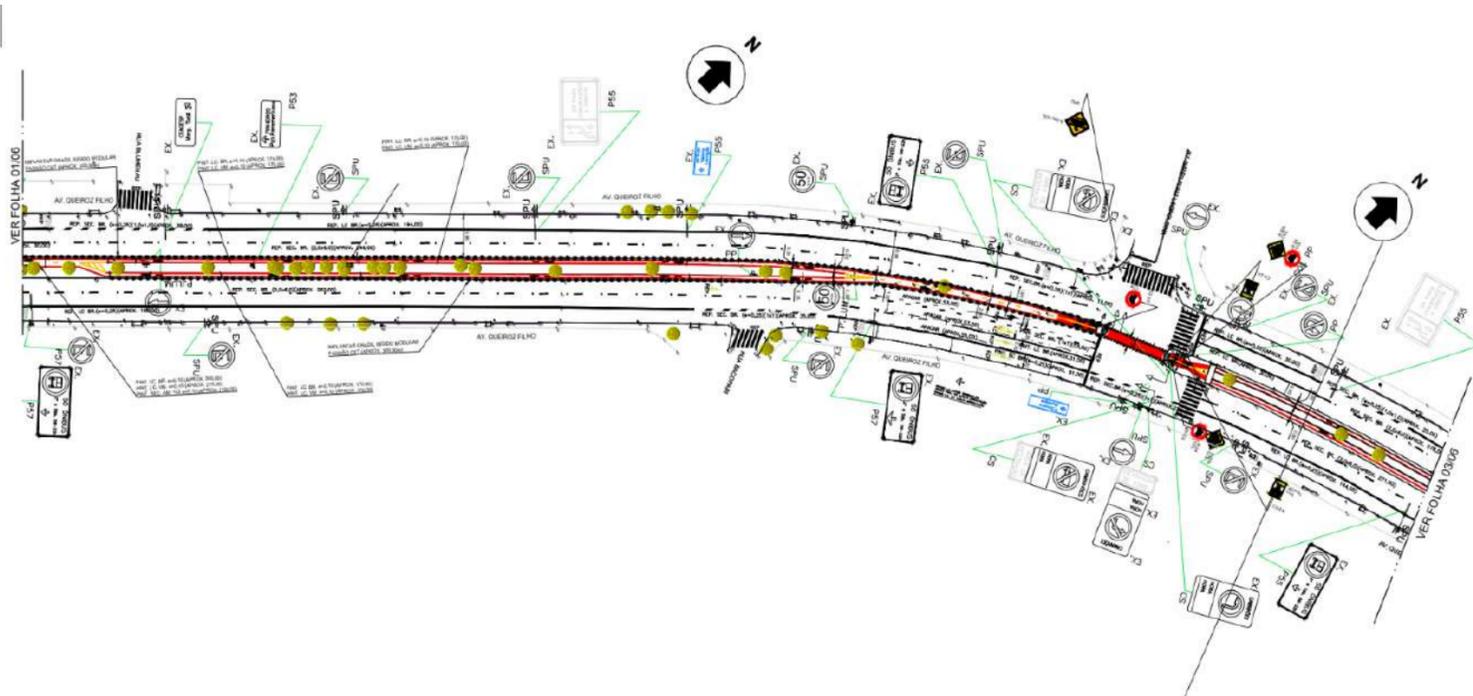

Local Av. Queiroz Filho
Foto Projeto Funcional
Abr/2023.

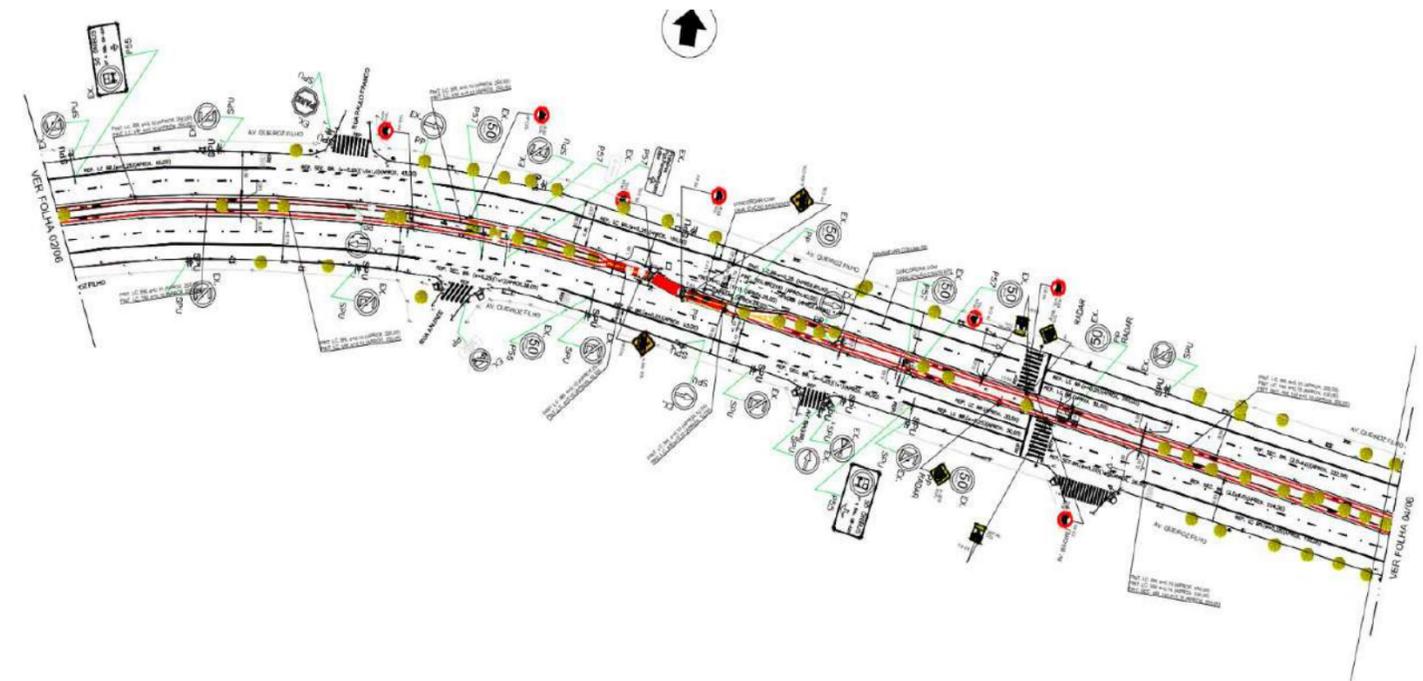

Local Av. Queiroz Filho
Foto Projeto Funcional
Abr/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Imperatriz Leopoldina (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Imperatriz Leopoldina; Av. Mofarrej; Estação Leopoldina CPTM/ Lapa
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038566-0
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 224.348,39	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



Foto antes da Intervenção.
Nov/2022



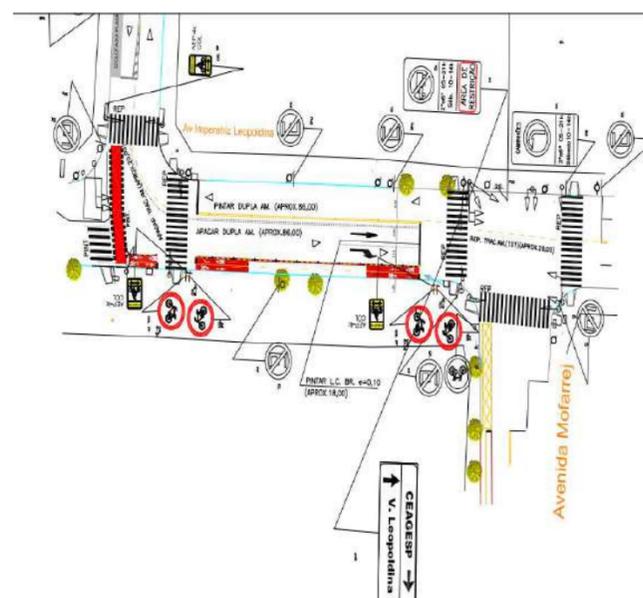


Foto Projeto Funcional
Abr/2023.

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Imperatriz Leopoldina (MOB)

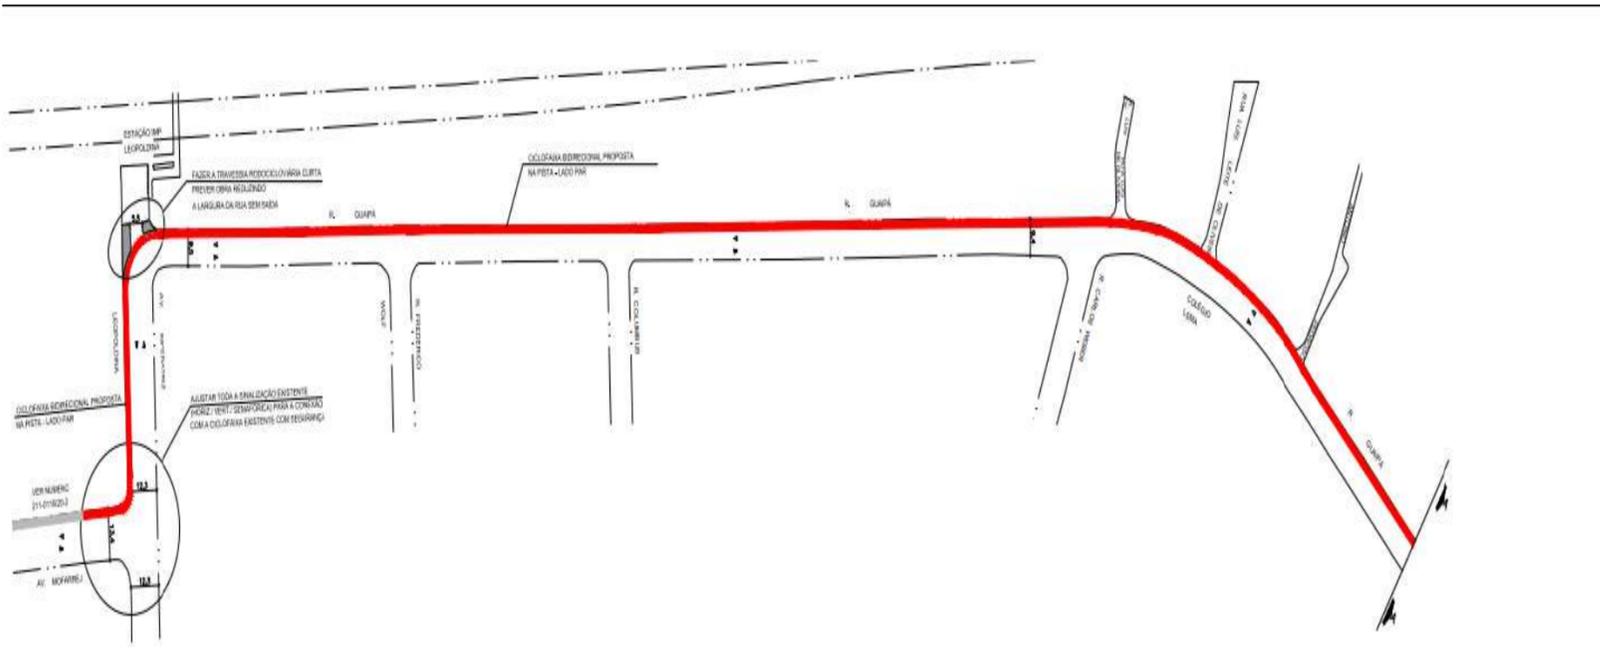

Local Av. Imperatriz Leopoldina
Foto Projeto Funcional
Jun/2021

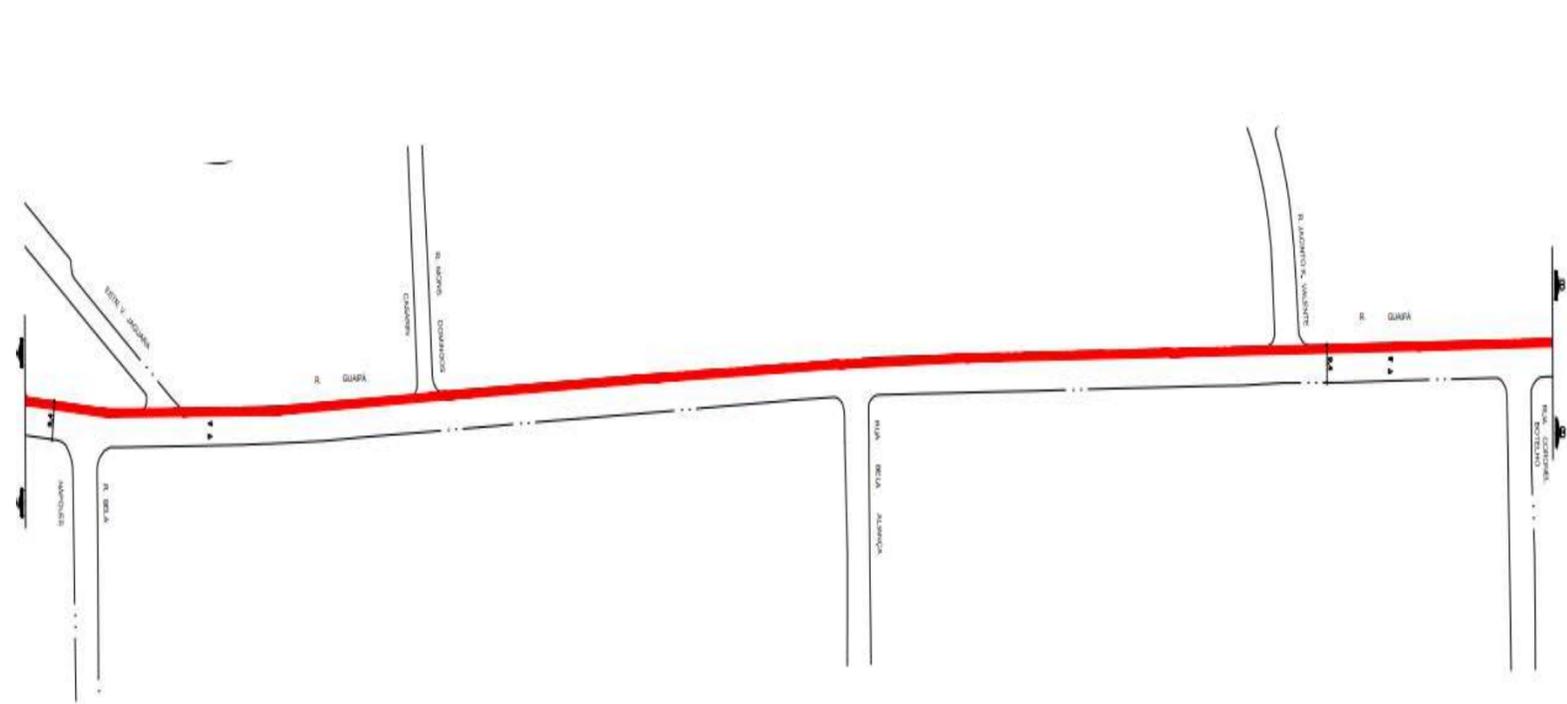

Local Av. Imperatriz Leopoldina
Foto Projeto Funcional
Jun/2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Major Paladino (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Major Paladino ; Av. Gastão Vidigal; Estação Leopoldina CPTM/ Lapa
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038566-0
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Fev/2023*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 809.806,53	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

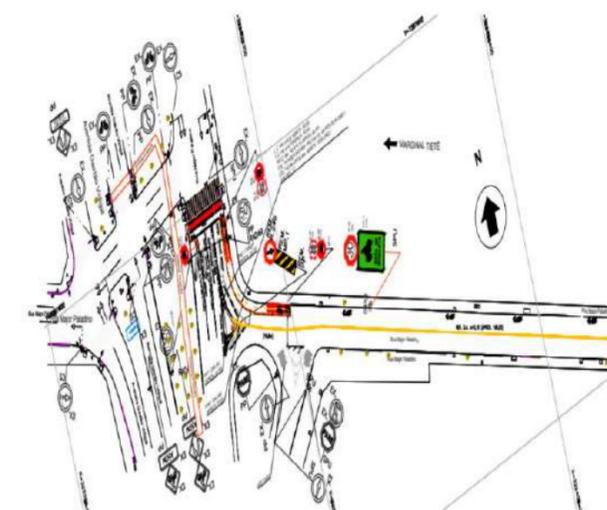


*Foto Projeto Funcional
Mar/2023.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Major Paladino (**MOB**)

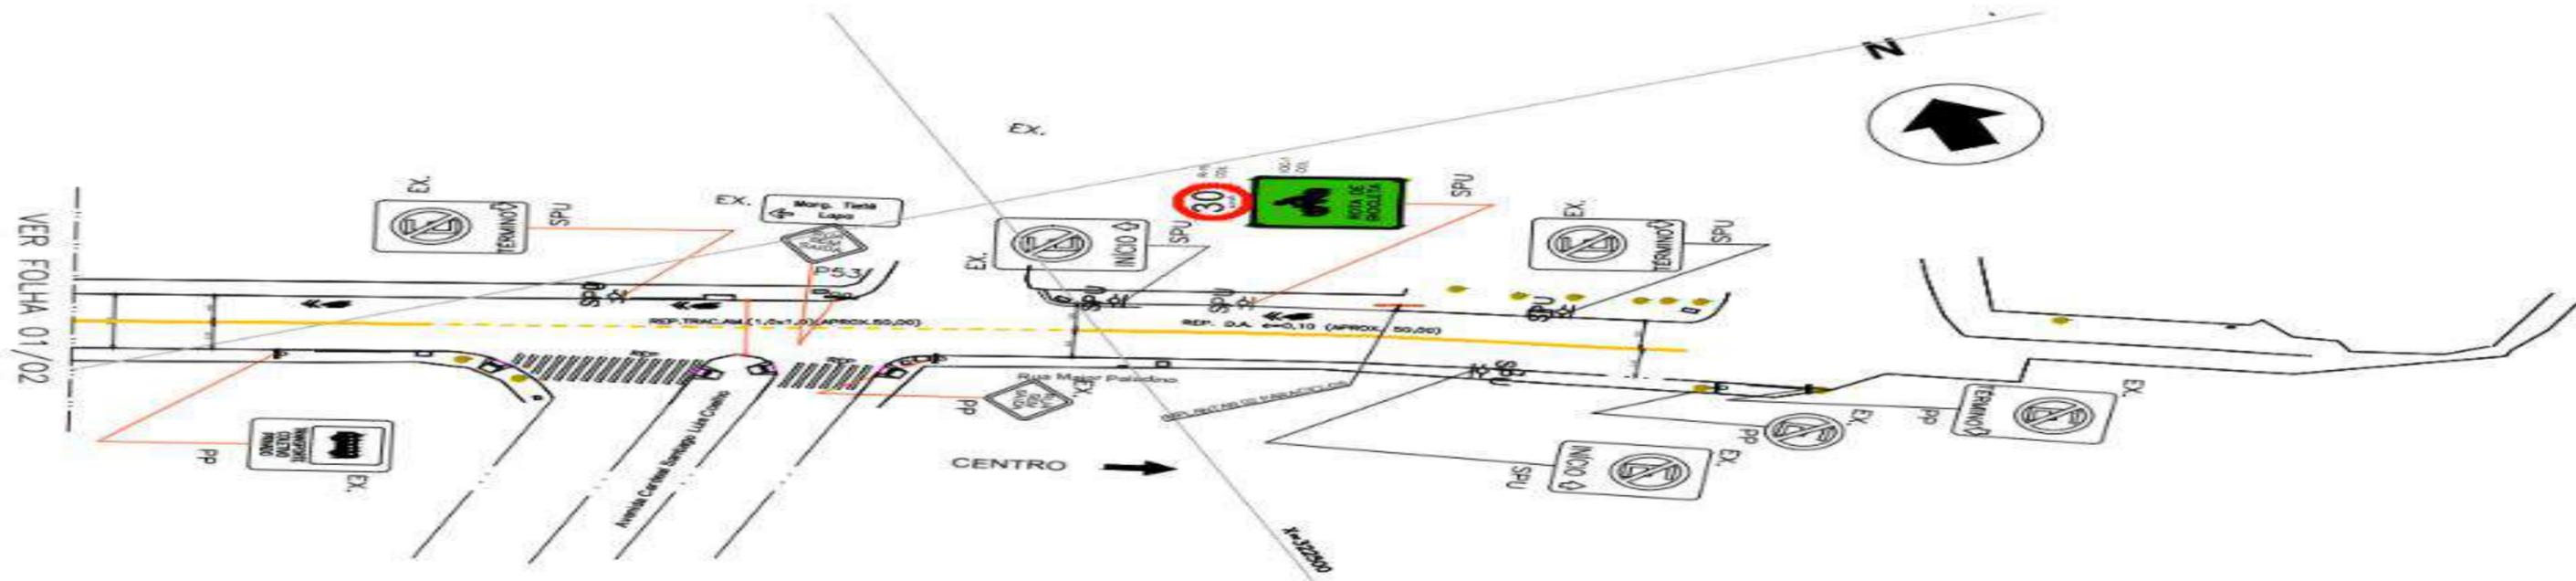

Local Rua Major Paladino
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Gastão Vidigal - Mergenthaler (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Dr. Gastão Vidigal; R. Mergenthaler; Av. Mofarrej/ Lapa
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038566-0
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 598.347,67	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

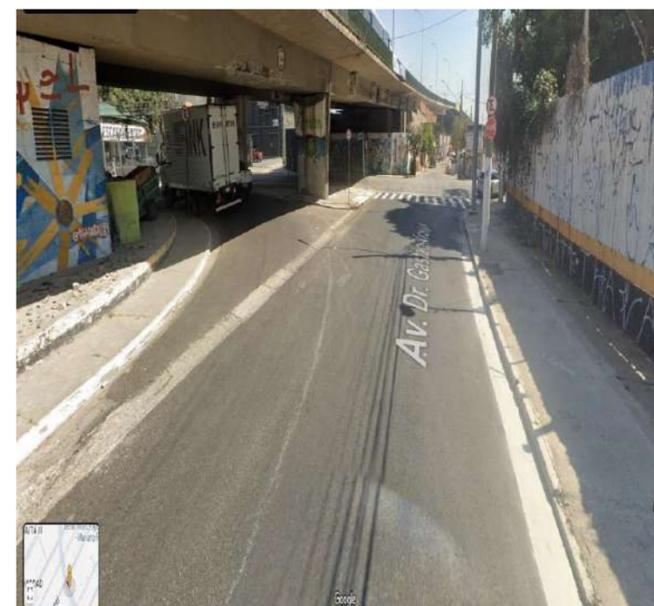


Foto antes da Intervenção.
Abr/2024


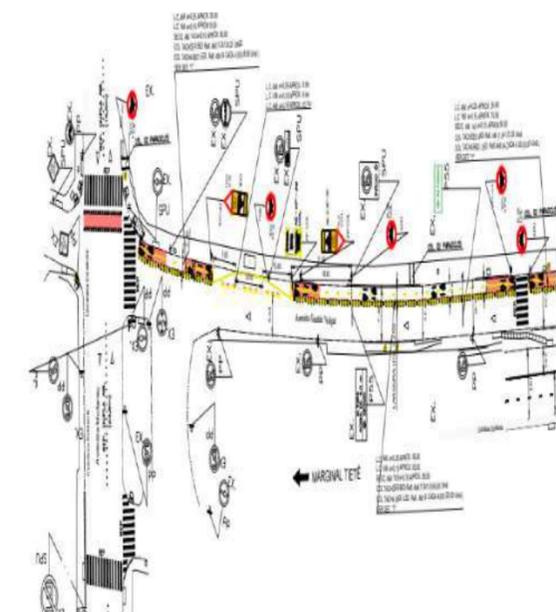


Foto Projeto Funcional
Mar/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Gastão Vidigal - Mergenthaler (MOB)

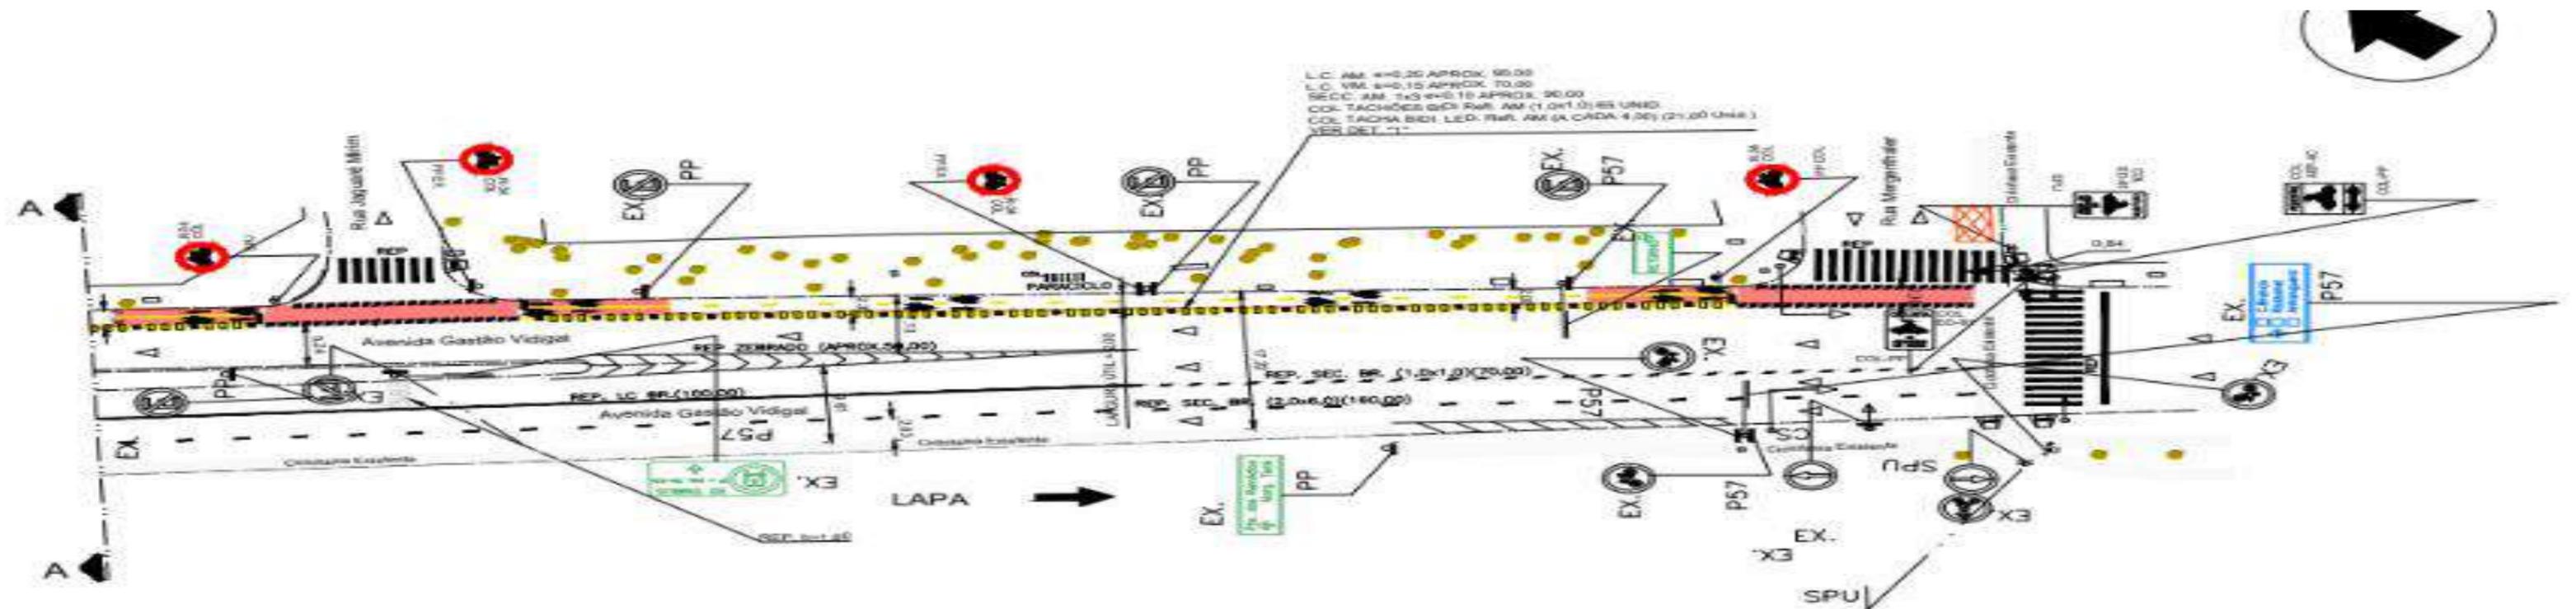

Local Av. Gastão Vidigal
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Potsdam(MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Potsdam; Av. Dr. Gastão Vidigal; Av. Imp. Leopoldina; R. Brentano; Av. Imp. Leopoldina; R. Passo da Pátria/ Lapa
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038566-0
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

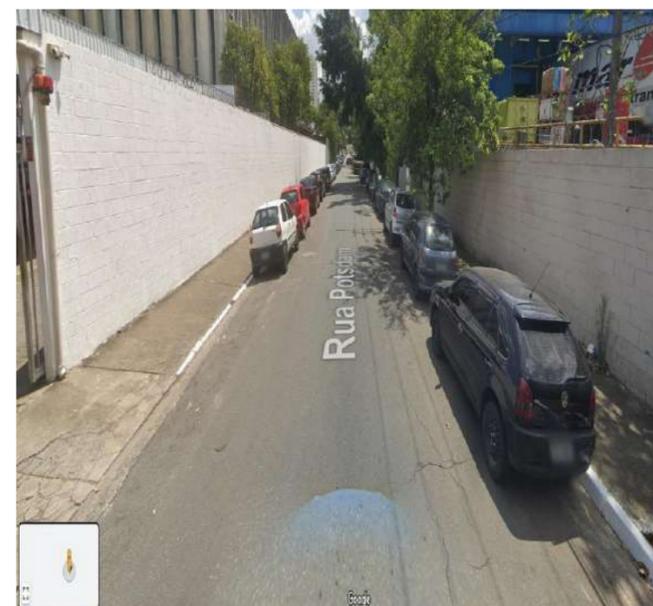


Foto antes da Intervenção.
Dez/2022

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.378.979,34	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	


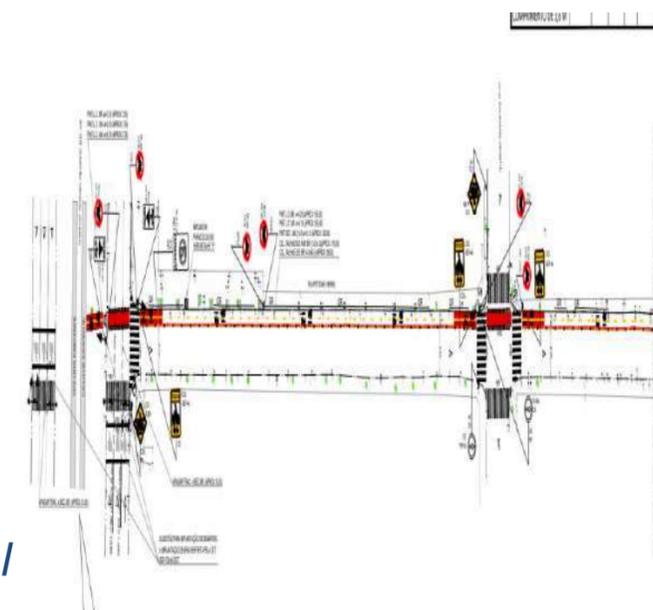


Foto Projeto Funcional
Mai/2023.


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Potsdam (**MOB**)

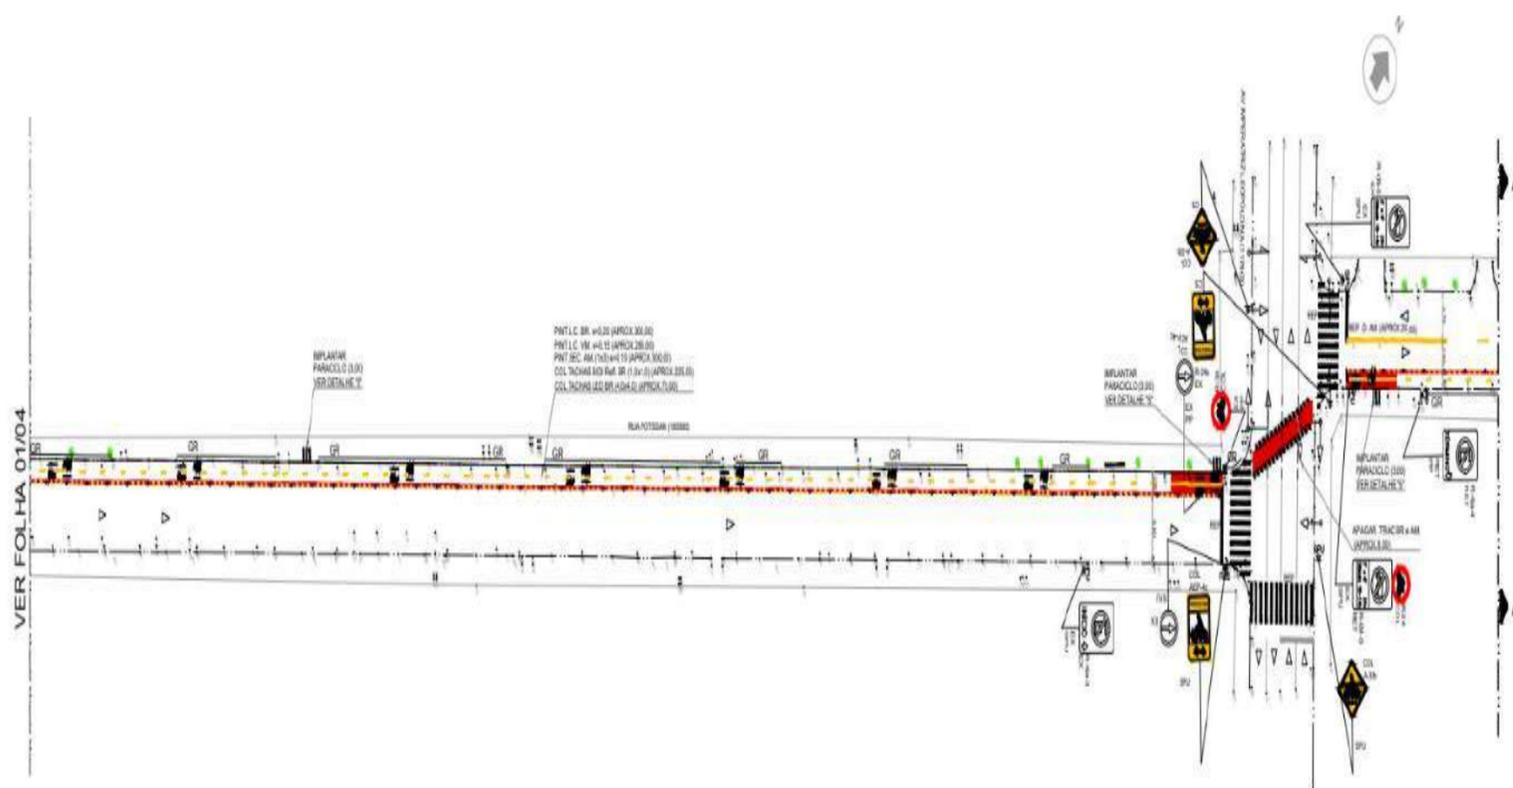

Local Rua Potsdam
Foto Projeto Funcional
Mai/2023

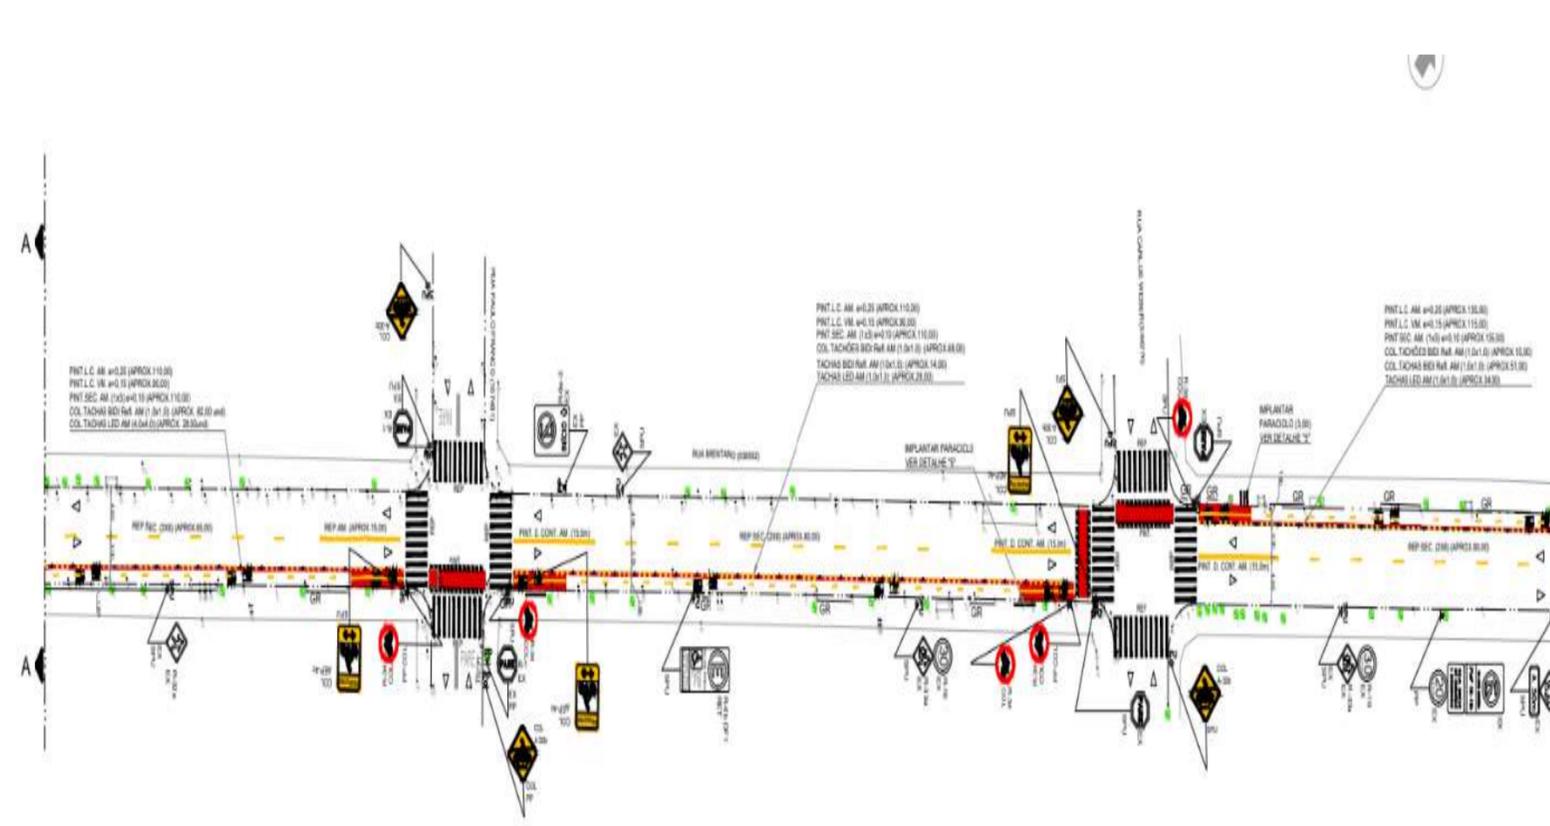

Local Rua Brentano
Foto Projeto Funcional
Mai/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Viaduto da Lapa (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Viaduto Elias Nagib Breim (Viaduto da Lapa); R Guaicurus; Av. Ermano Marchetti/ Lapa
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038566-0
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



Foto antes da Intervenção.
Mai/2024

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 2.780.007,21	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	


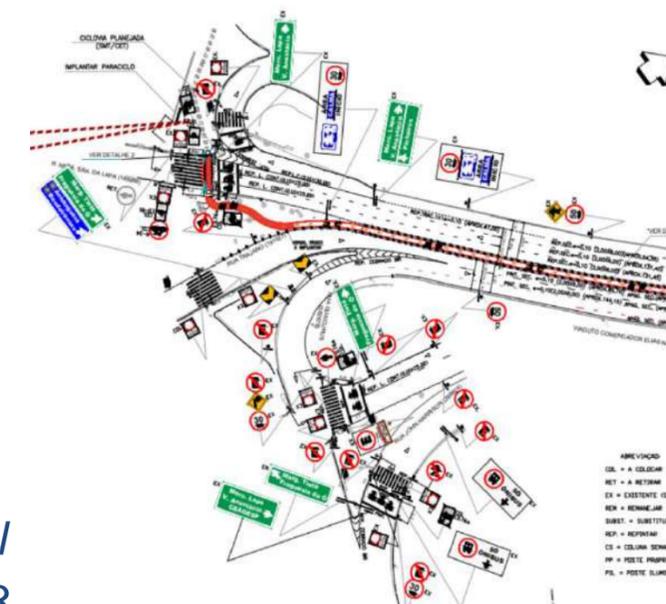


Foto Projeto Funcional
Jan/2023


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Viaduto da Lapa(MOB)

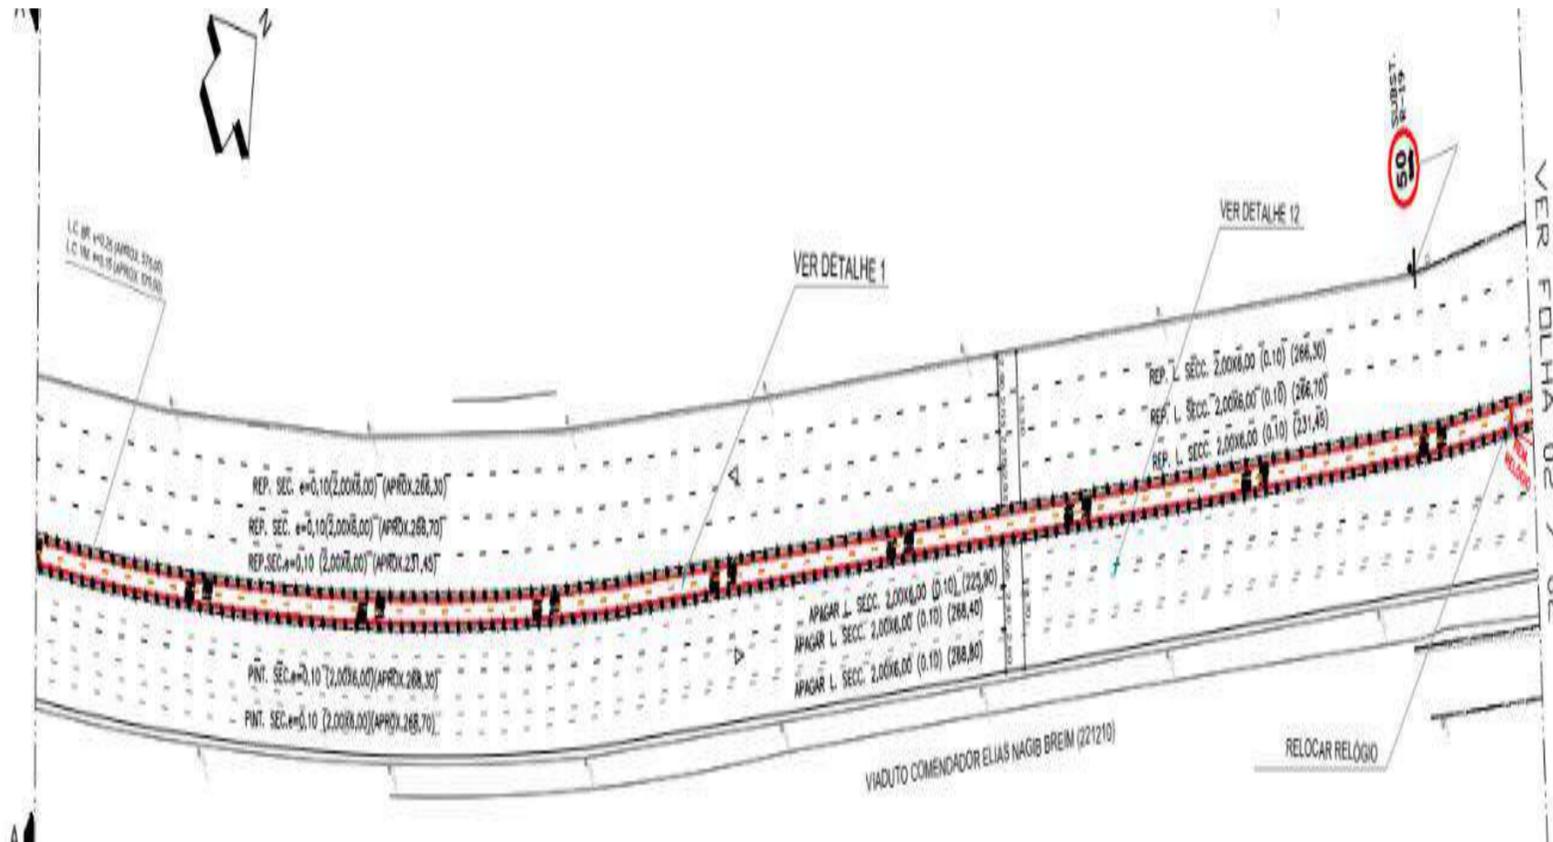

Local Av. Ermano Marchetti
Foto Projeto Funcional
Mai/2023.

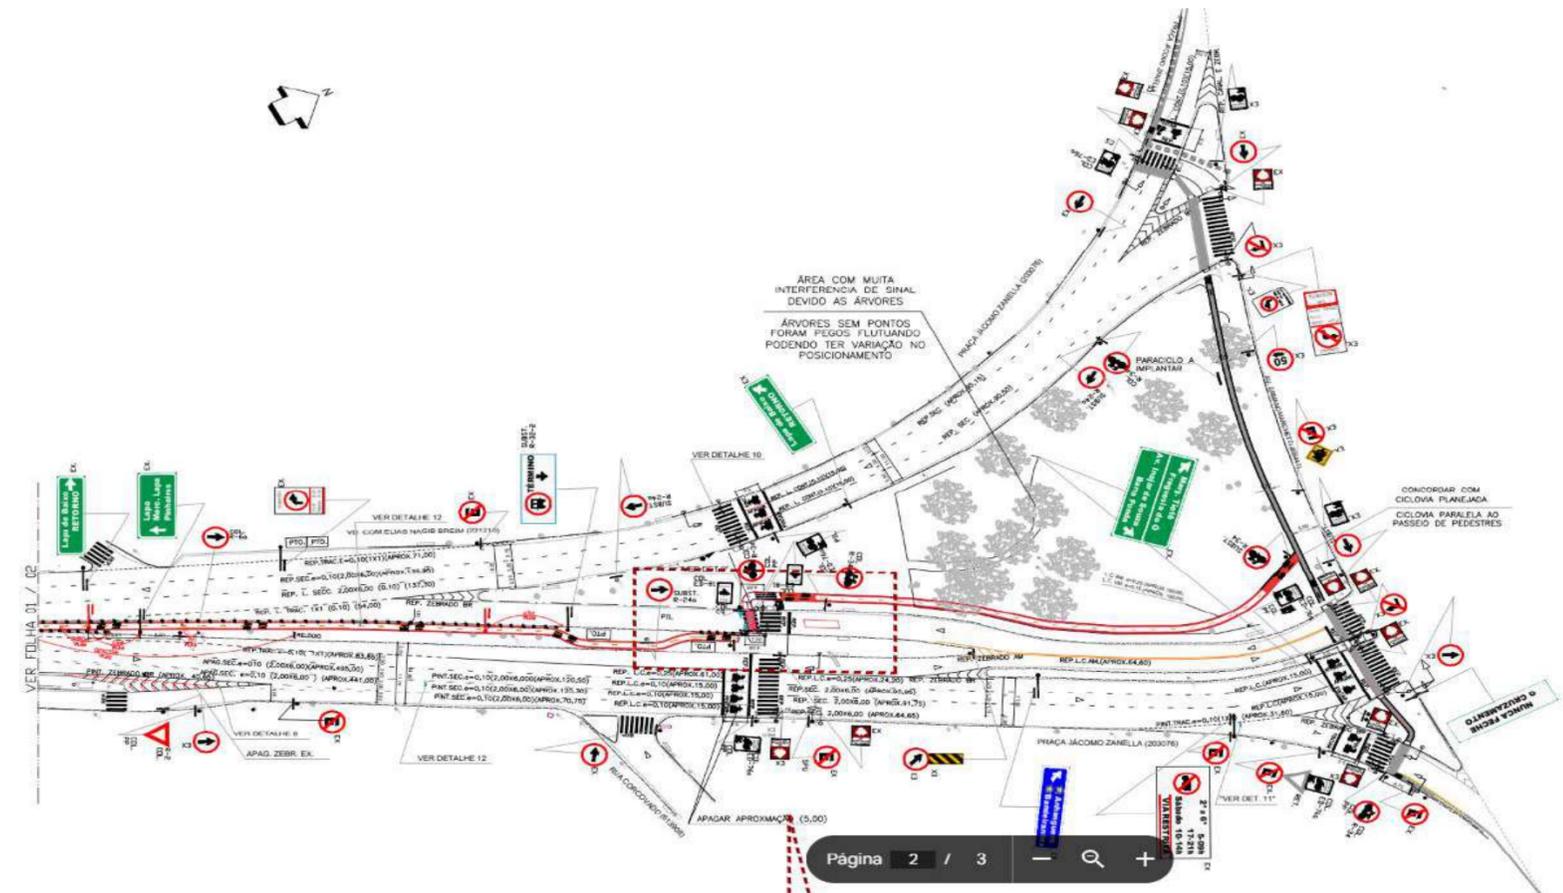

Local Viaduto Com. Elias Nagib
Breim
Foto Projeto Funcional
Mai/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Dronsfield(MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Gago Coutinho/D. João V/John Harrison/R. Dronsfield/Martim Tenório/Ciccinato Pamponet; Av. Mercedes; Viaduto da Lapa/Lapa
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038566-0
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



Foto antes da Intervenção.
Dez/2023

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 2.410.038,22	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



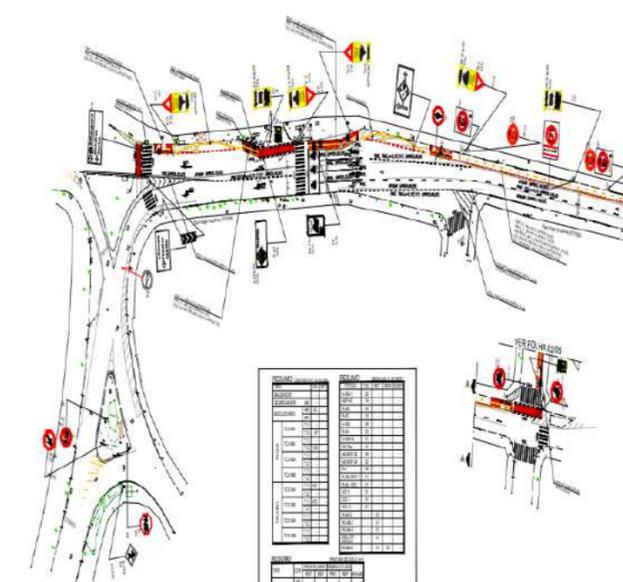


Foto Projeto Funcional
Mar/2020.

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Dronsfield(MOB)

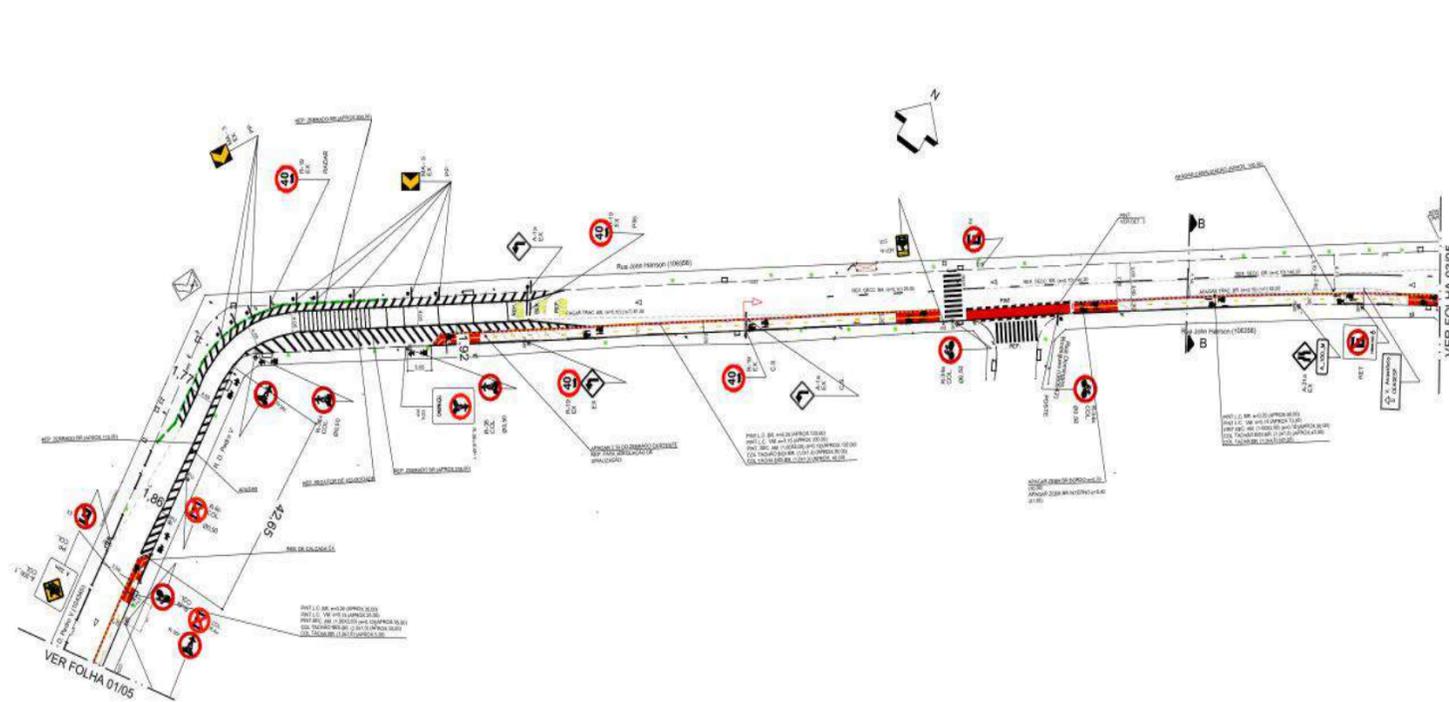

Local Rua John Harrison
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.

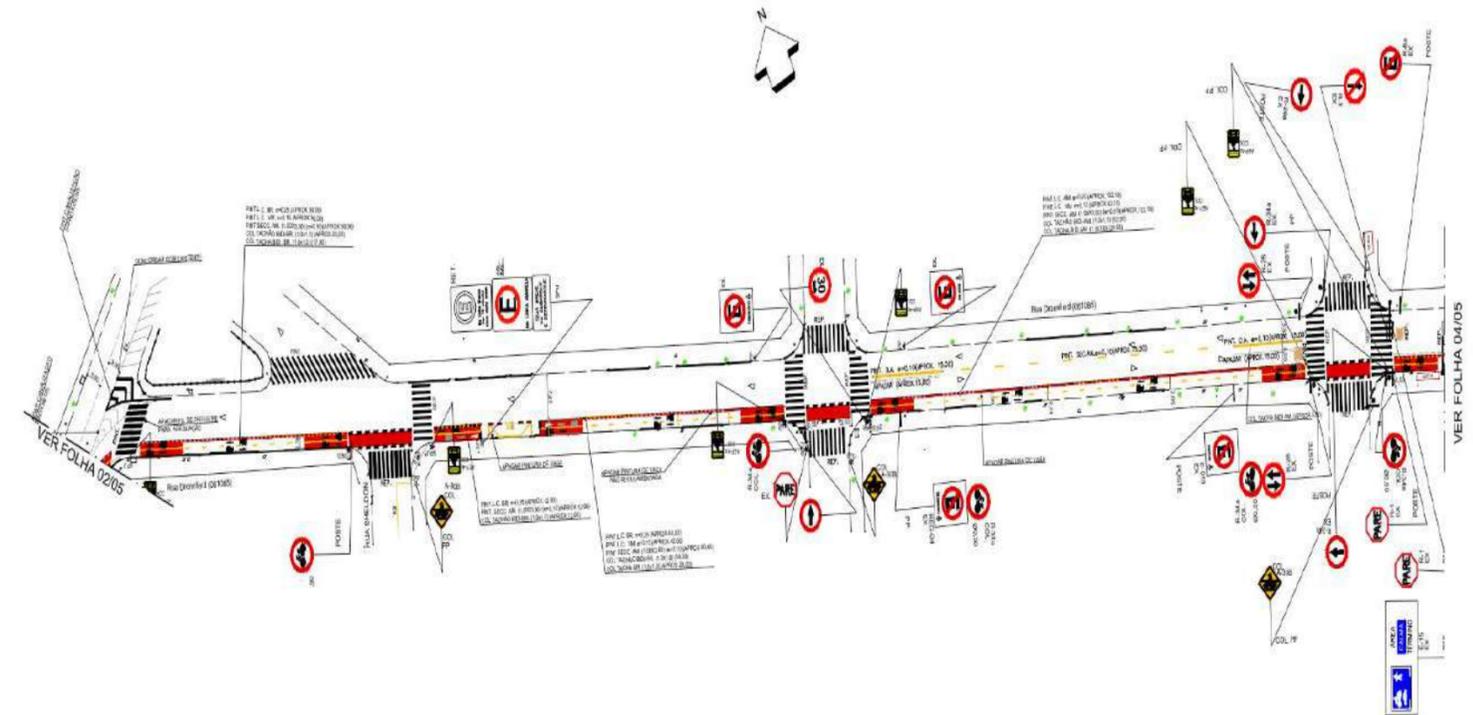


Local Rua Dronsfield
Foto Projeto Funcional
Jun2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Guaipá (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Guaipá; Av. Imperatriz Leopoldina; R. Belmonte / Lapa
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038566-0
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

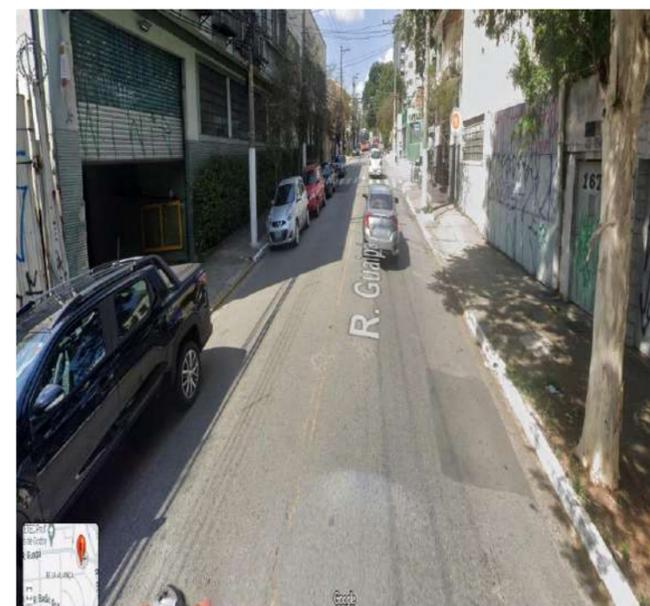

*Foto antes da Intervenção.
Abr/2024*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 2.212.529,19	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

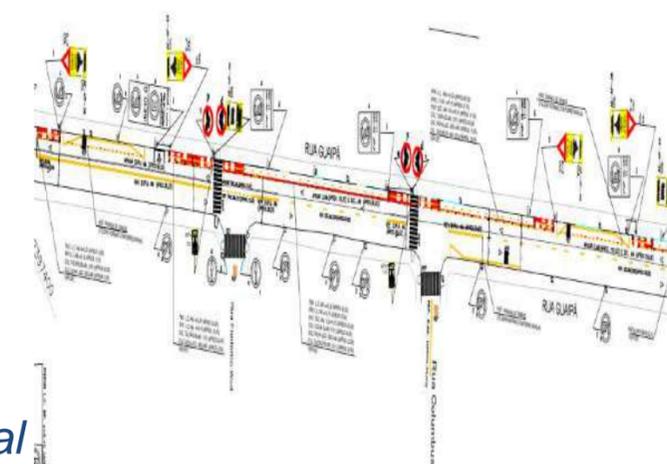


*Foto Projeto Funcional
Abr/2023.*


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Guaipá (MOB)

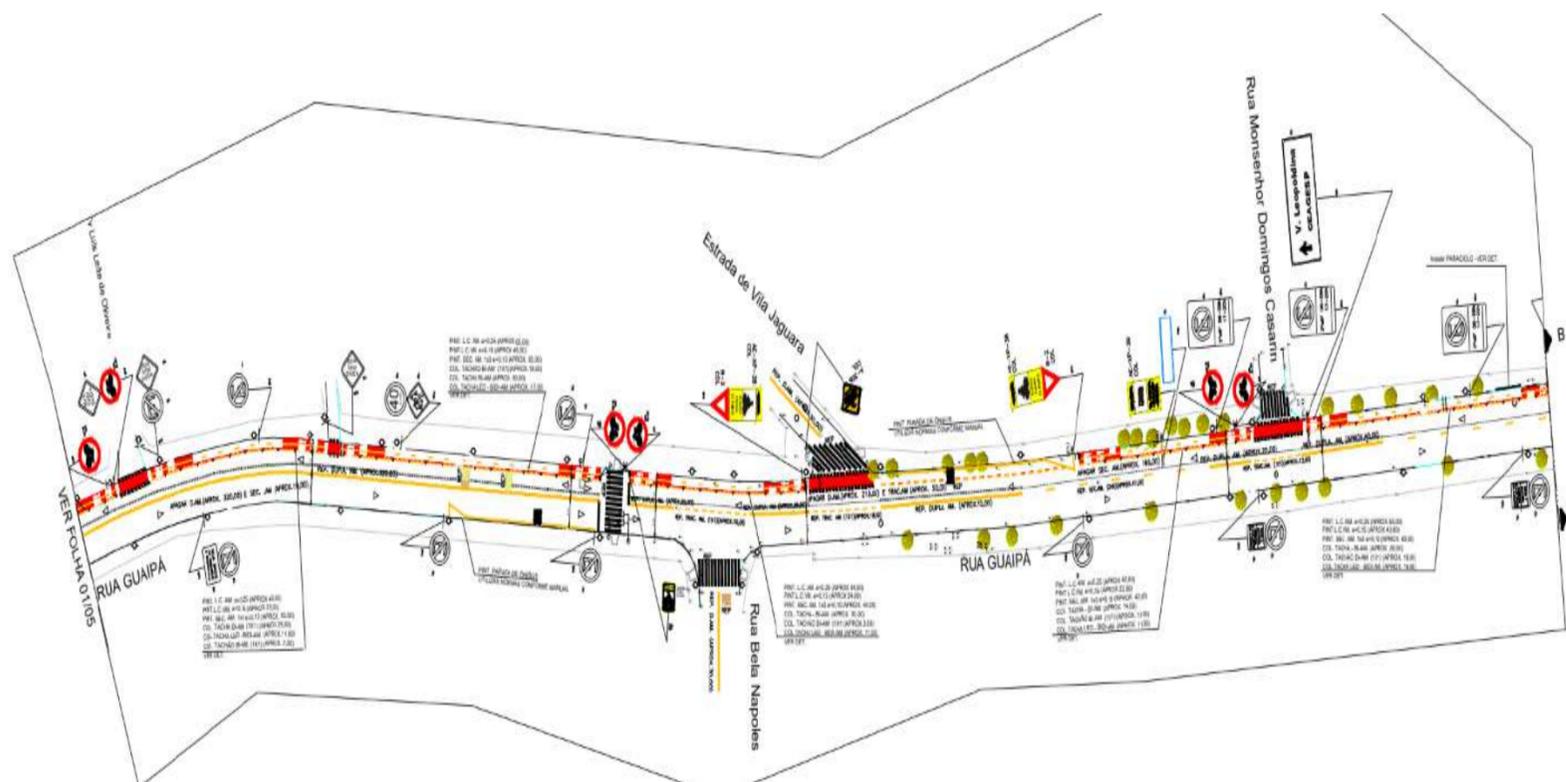

Local Rua Guaipá
Foto Projeto Funcional
Abr/2023

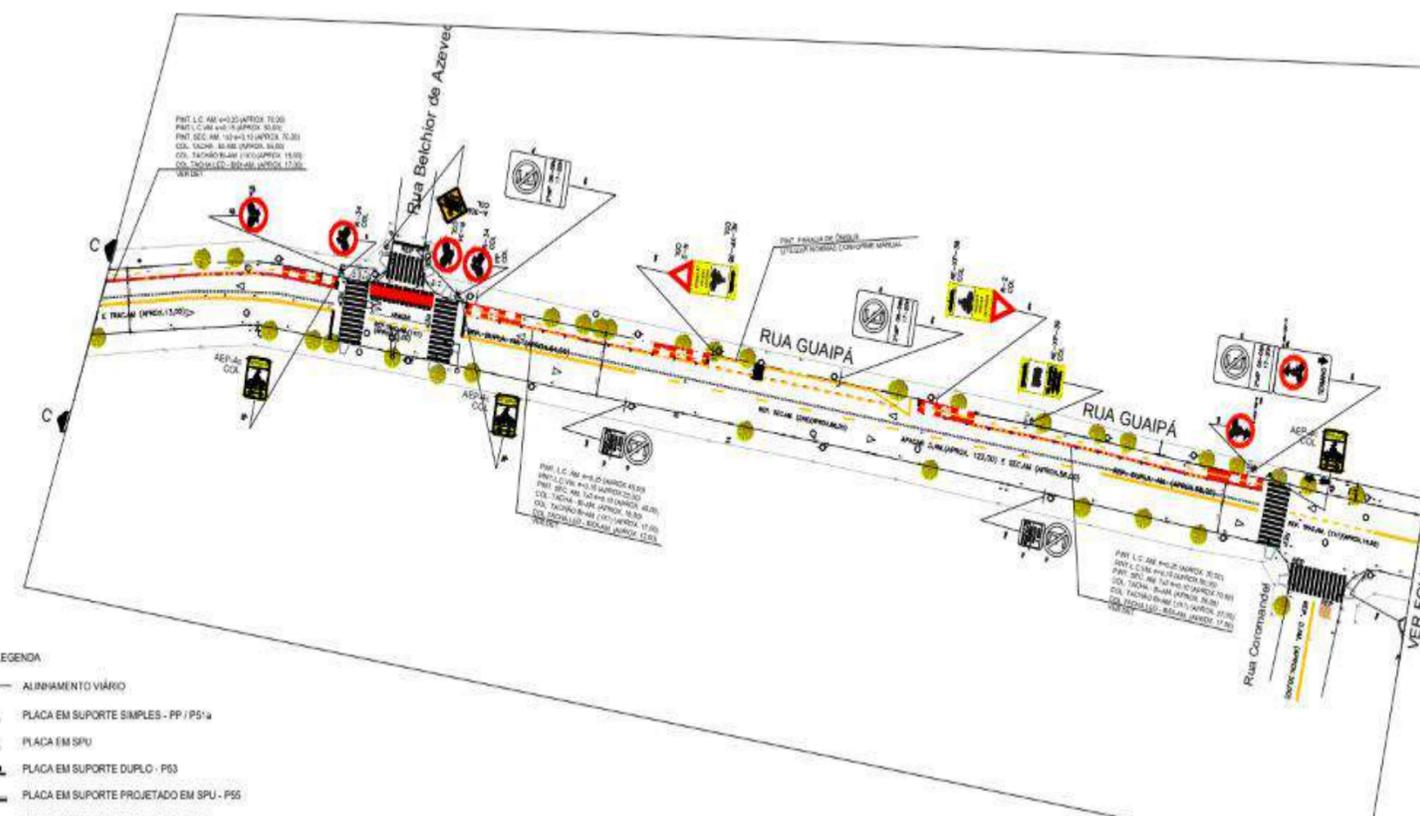


Local Rua Guaipá
Foto Projeto Funcional
Abr/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Duarte de Azevedo (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Duarte de Azevedo; Av. Luiz Dumont Vilares; Av. Cruzeiro do Sul/ Santana/Tucuruvi
Situação	Concluída – 100%
Processo Administrativo	6020.2022/0038571-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Jul/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

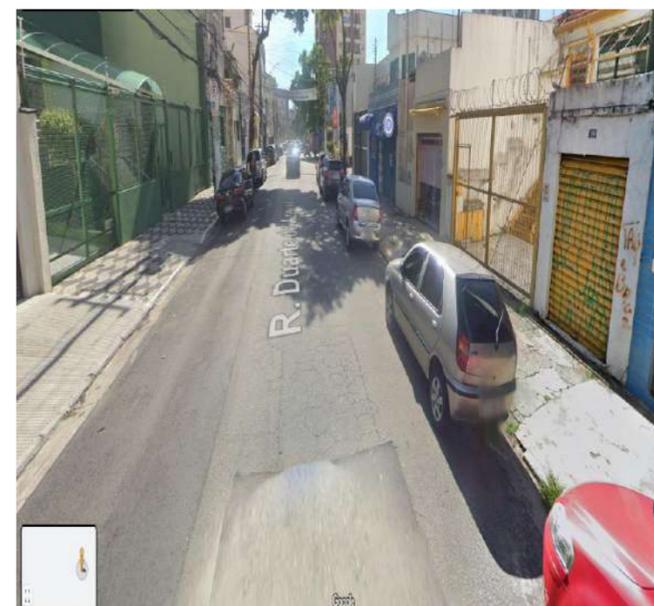

*Foto antes da Intervenção.
Jan/2024*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 383.711,85	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



*Foto em Execução
Jan/2024.*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Duarte de Azevedo(MOB)



*Local Rua Duarte de Azevedo
Foto em Execução
Jan/2024*



*Local Rua Duarte de Azevedo
Foto em Execução
Jan/2024*



*Local Rua Duarte de Azevedo
Foto em Execução
Jan/2024*



*Local Rua Duarte de Azevedo
Foto em Execução
Jan/2024*

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL/ 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Manuel Gaya (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Manuel Gaya; Av. Dr. Antonio Maria Laet; R. Maria Amália Lopes de Azevedo/ Jaçanã- Tremembé
Situação	Concluída – 100%
Processo Administrativo	6020.2022/0038571-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Jul/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 188.639,13	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



Foto antes da Intervenção.
Dez/2023


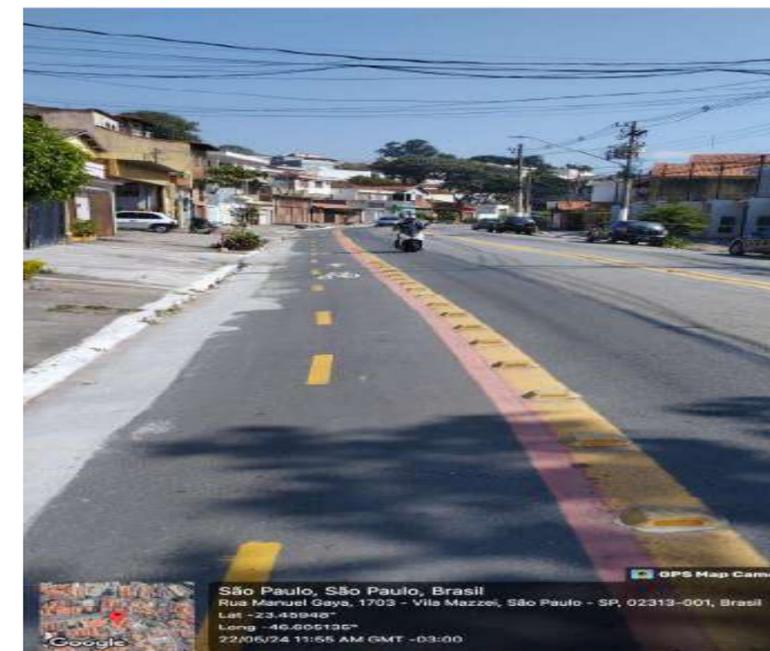


Foto em Execução
Jan/2024.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Manoel Gaya (**MOB**)

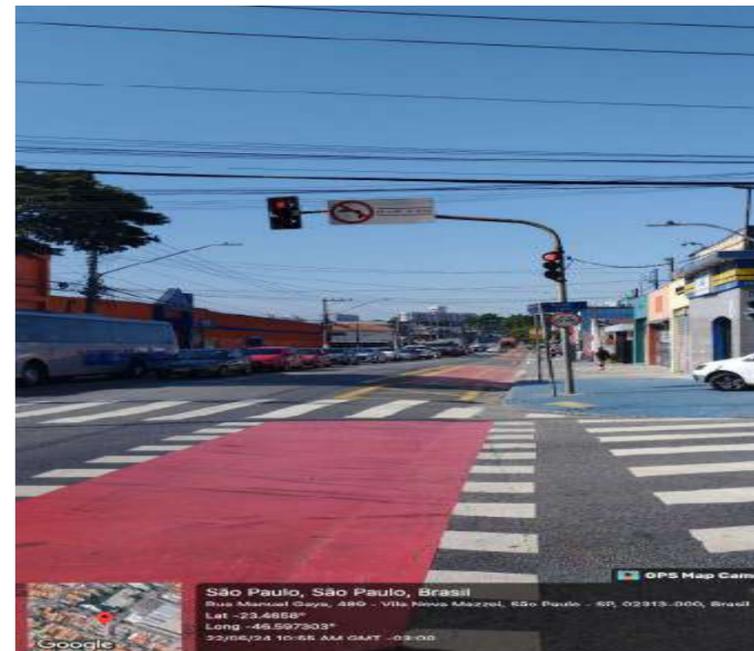

Local Rua Manoel Gaya
Foto em Execução
Mai/2024.

Local Rua Manoel Gaya
Foto em Execução
Mai/2024.

Local Rua Manoel Gaya
Foto em Execução
Mai/2024.

Local Rua Melo Freire
Foto Projeto Funcional
Mar/2020.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Antônio C.Netto (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Av. Antonio Cesar Neto; R. Maria Amália Lopes de Azevedo; R. Benjamin Pereira/Jaçanã-Tremembé
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038571-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



Foto antes da Intervenção.
Mai/2024

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.991.217,00	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



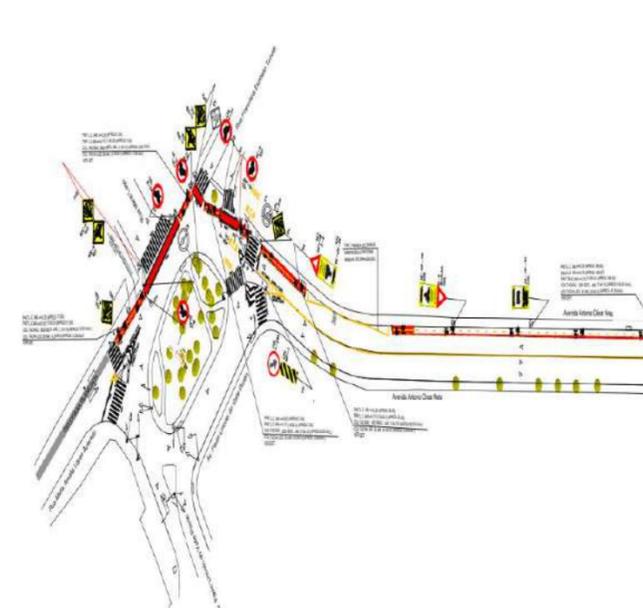


Foto Projeto Funcional
Abr/2023.

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Antônio C.Neto (**MOB**)

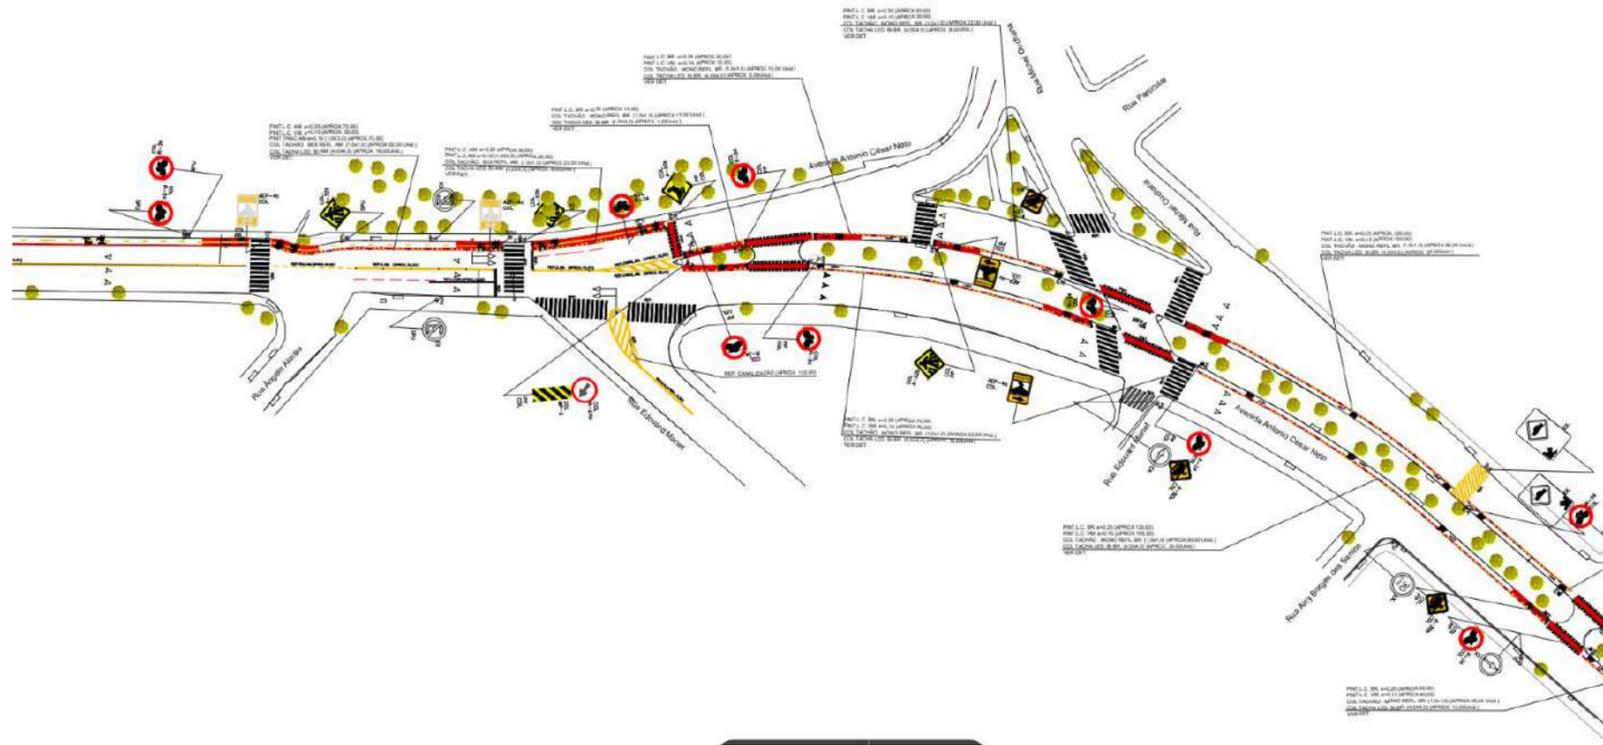

Local Av. Antonio Cesar Neto
Foto Projeto Funcional
Abr/2023.

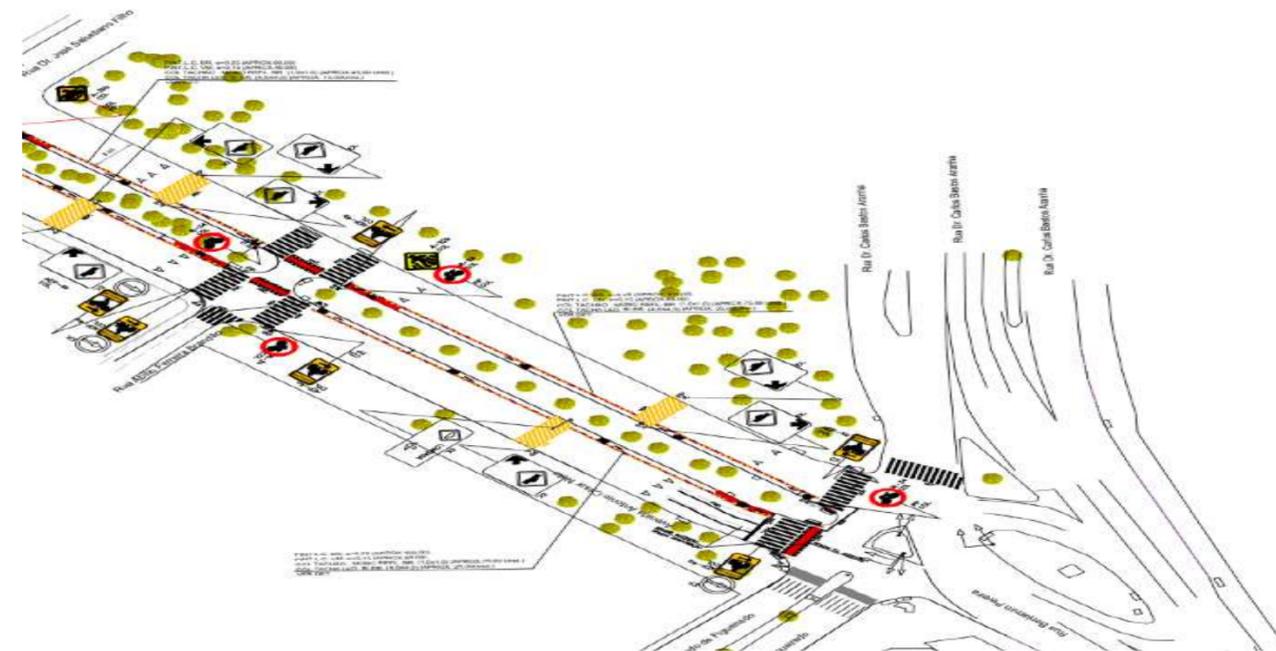

Local Av. Antonio Cesar Neto
Foto Projeto Funcional
Abr/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Benjamin Pereira (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Benjamin Pereira; Av. Antonio Cesar Neto; R. Calandra; R. Manuel Gaya; Av. Dr. Antonio Maria de Laet; Av. Luís Stamatis; Av. Guapira./ Jaçanã - Tremembé
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038571-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



*Foto antes da Intervenção.
Out/2022*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 3.453.120,10	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

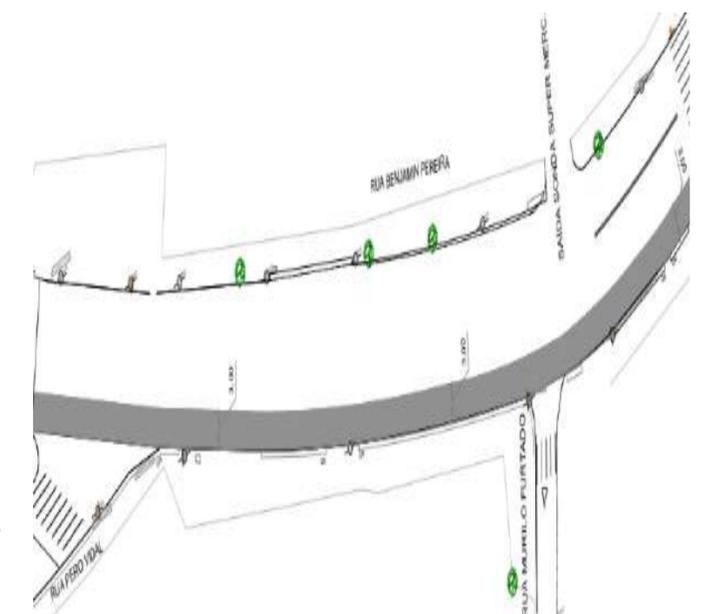

*Foto Projeto Funcional
Mar/2023.*


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Benjamin Pereira (**MOB**)




Local Rua Benjamin Pereira
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.



Local Rua Benjamin Pereira
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

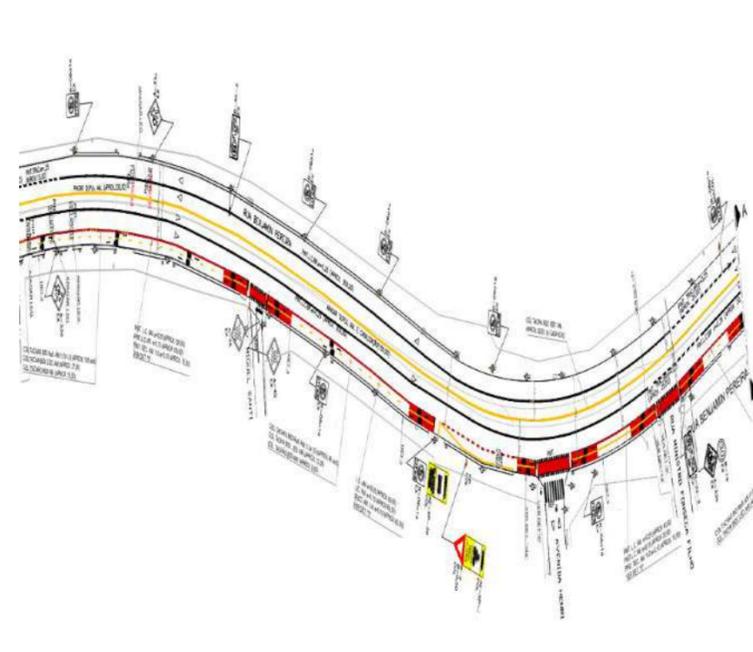

Local Rua Benjamin Pereira
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

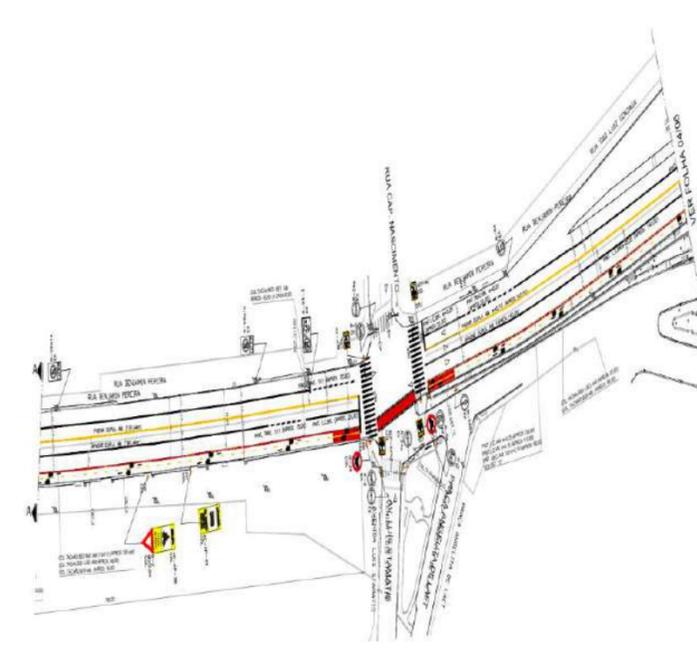

Local Rua Benjamin Pereira
Foto Projeto Funcional
Mar/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Virgílio Rodrigues A.C.Pinto (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Sena; R. Manuel Gaya; Av. Prof. Virgilia R. Alves C. Pinto; R. Alcino Bueno de Assis; R. Eduardo Vicente Nasser; R. Padre Leopoldo Brentano; Entrada Pq. Lions Club Tucuruvi; R. Luiz Augusto de Oliveira/ Santana-Tucuruvi
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0012312-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 2.795.319,84	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



Foto antes da Intervenção.
Mar/2023

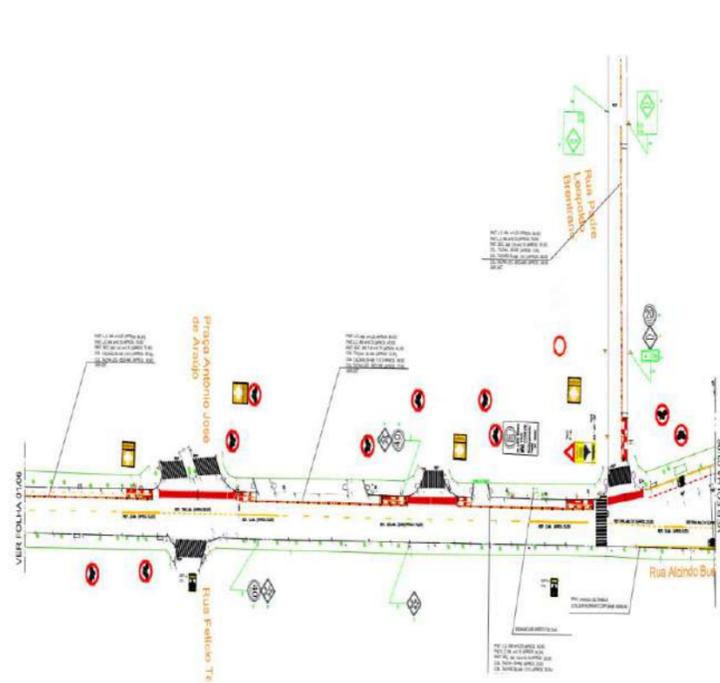


Foto Projeto Funcional
Mai/2023.


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Virgílio Rodrigues A.C.Pinto (MOB)



Local Rua Alcindo Bueno
Foto Projeto Funcional
Mai/2023

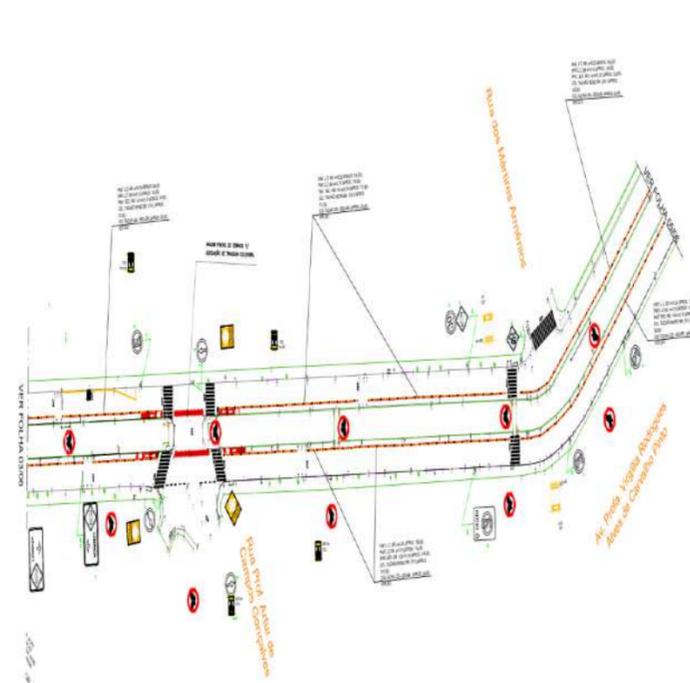

Local Virgílio Rodrigues A. C de
Carvalho Pinto
Foto Projeto Funcional
Mai/2023

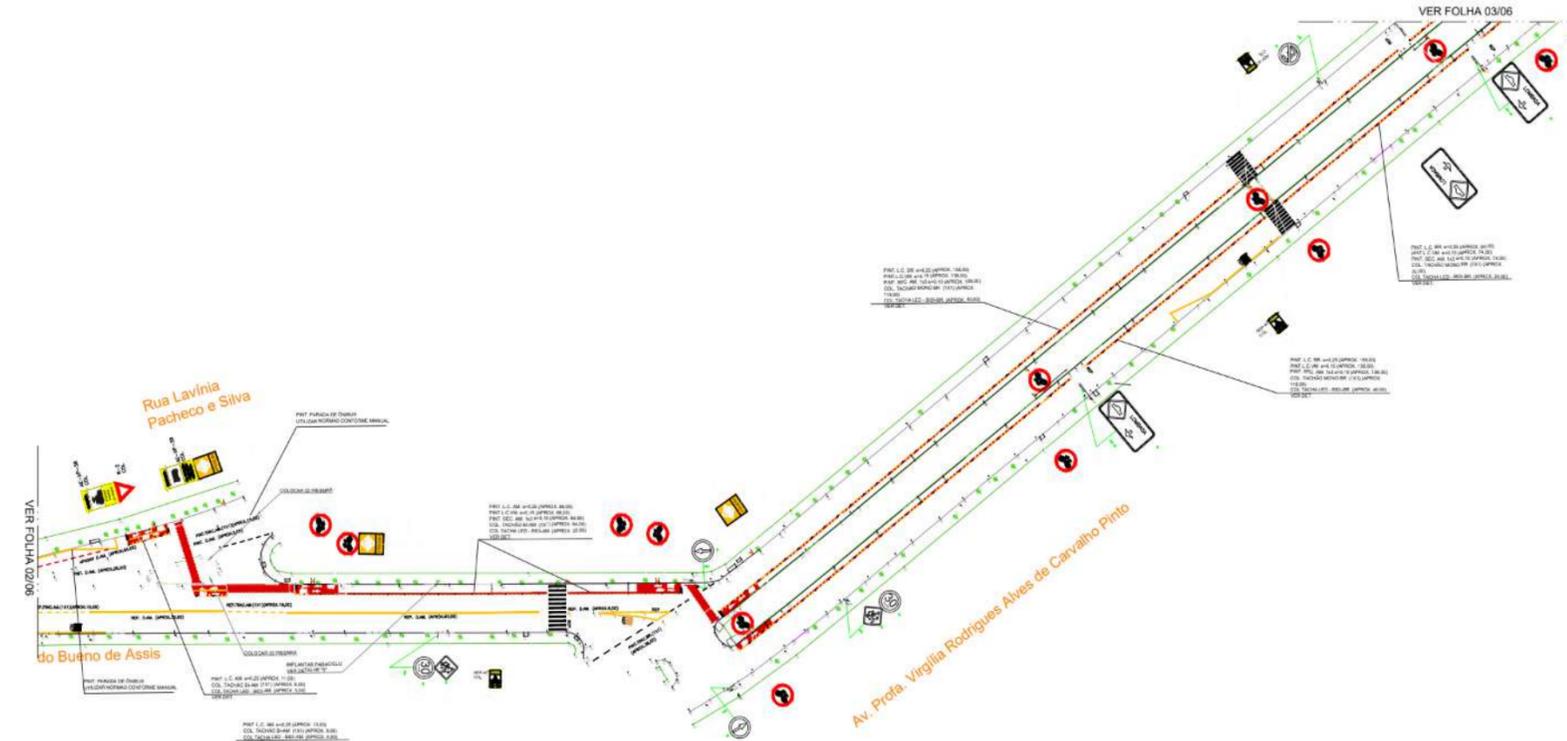

Local Virgílio Rodrigues A. C de
Carvalho Pinto
Foto Projeto Funcional
Mai/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Santa Inês (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Voluntarios da Pátria; Av. Eng. Caetano Alvares; Av. Santa Inês; R. Luis Carlos Gentile de Laet/ Santana-Tucuruvi
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038571-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



Foto antes da Intervenção.
Fev/2023

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 3.865.056,36	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	


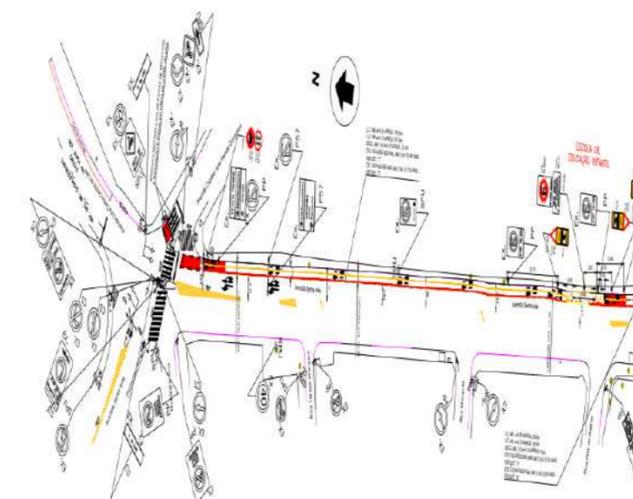


Foto Projeto Funcional
Ago/2023.


PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Santa Inês (MOB)

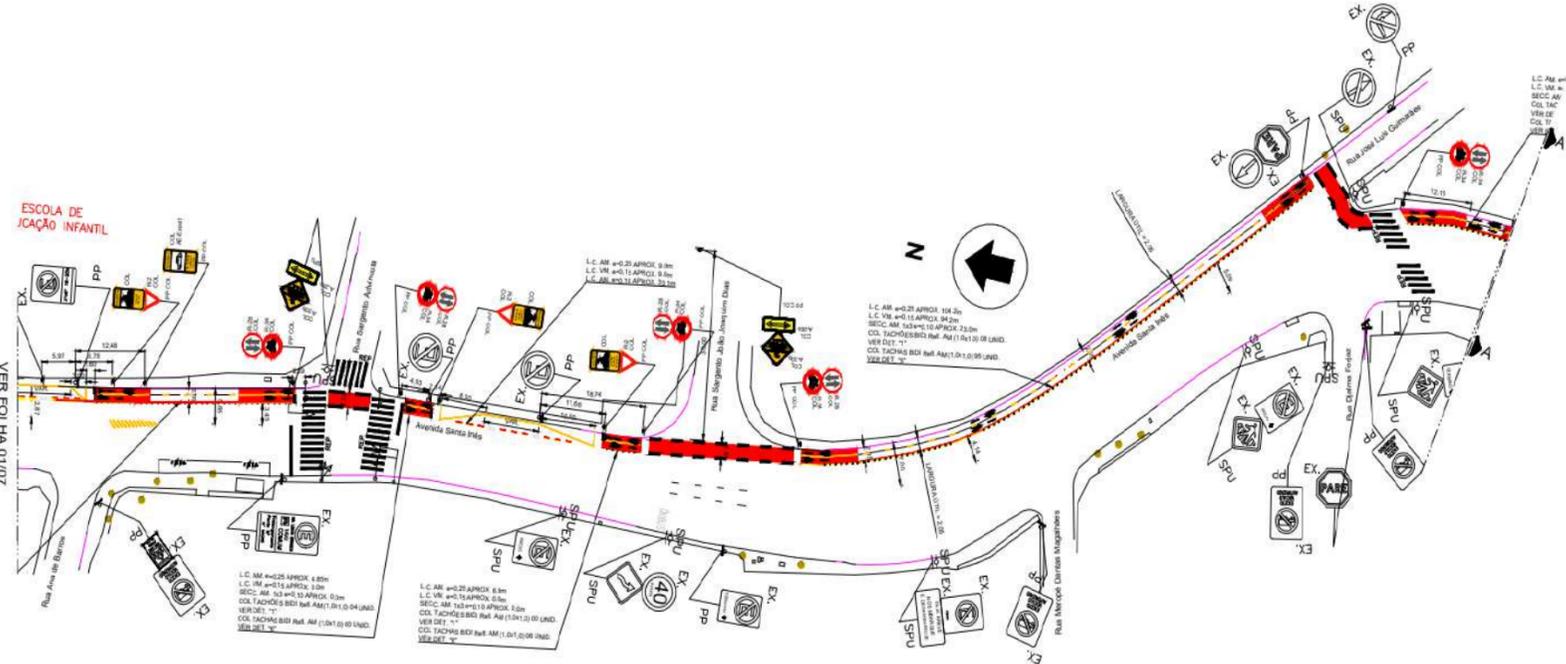

Local Av. Santa Inês
Foto Projeto Funcional
Ago/2023

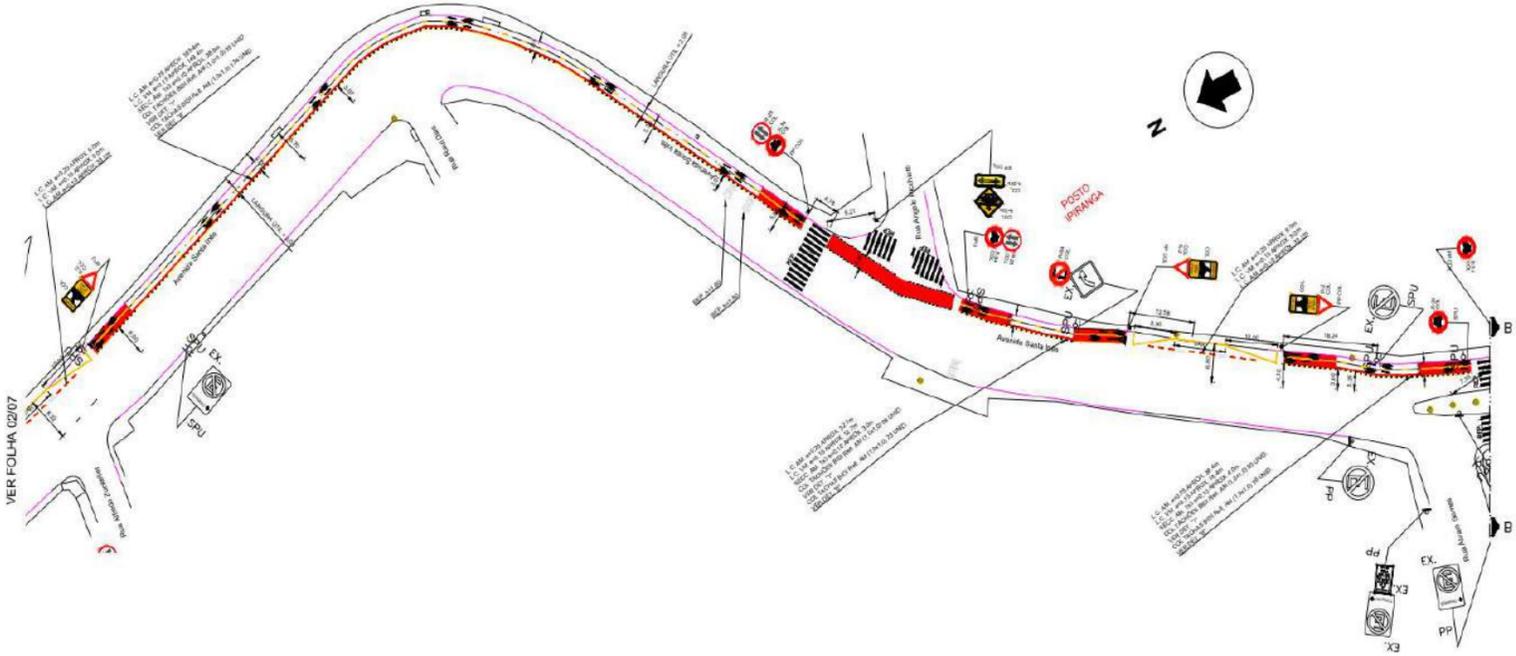

Local Av. Santa Inês
Foto Projeto Funcional
Ago/2023

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Av. José P. Gonçalves (MOB)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	Rua Irmão João Creffi; Av. Eng. Caetano Álvares; Rua Cadete Ruytemberg Rocha; Rua Soldado Advíncola; Av. Capitão José Parada Gonçalves; Av. Santa Inês/ Santana-Tucuruvi
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038571-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim



Foto antes da Intervenção.
Fev/2023

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 1.855.053,65	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	



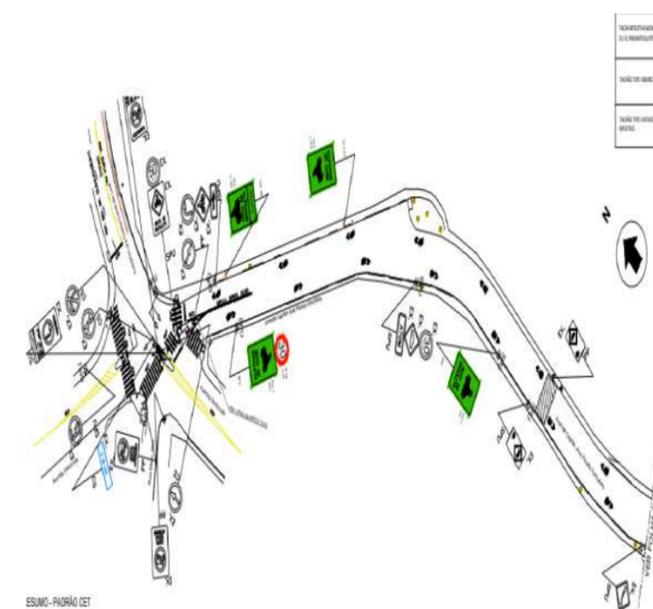


Foto Projeto Funcional
Jun/2023

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Av. José P. Gonçalves (MOB)

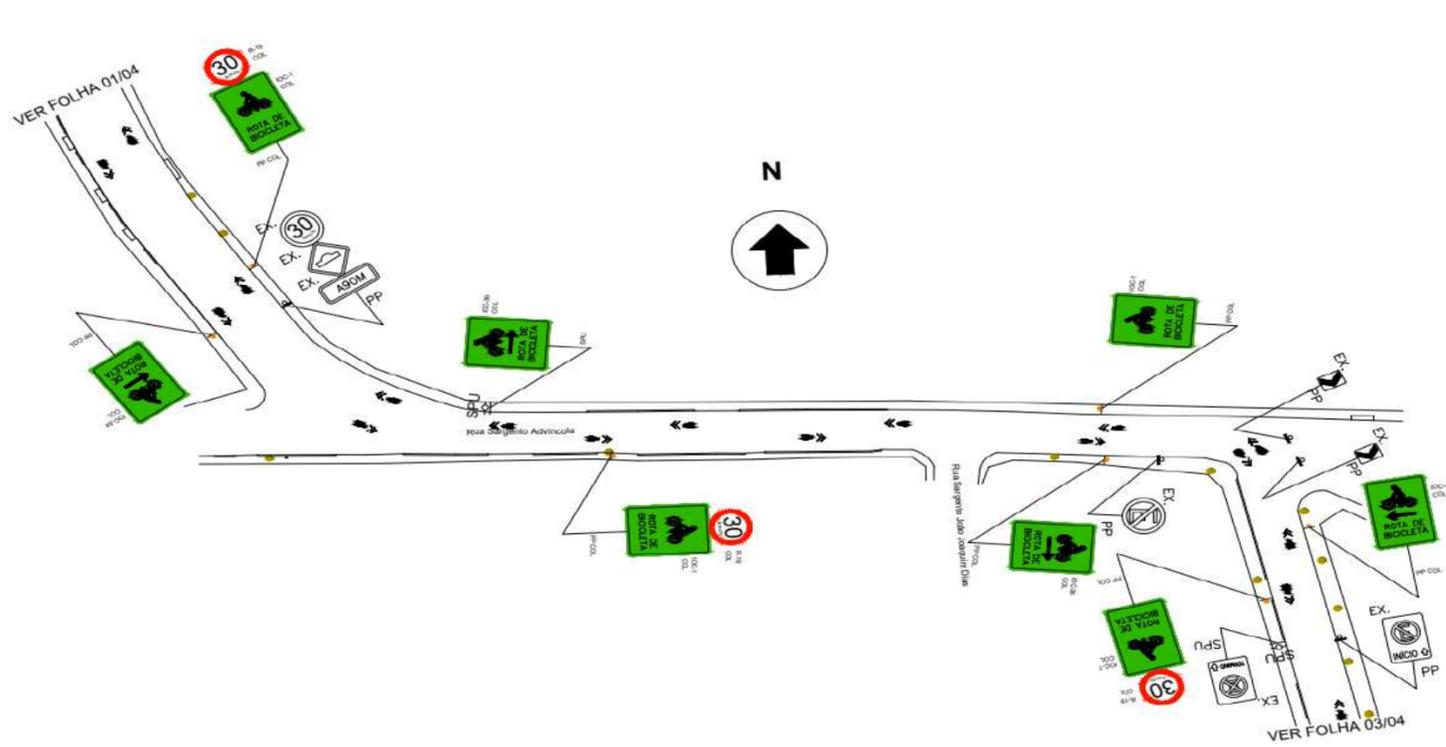

Local Rua Sargento Advíncola
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.

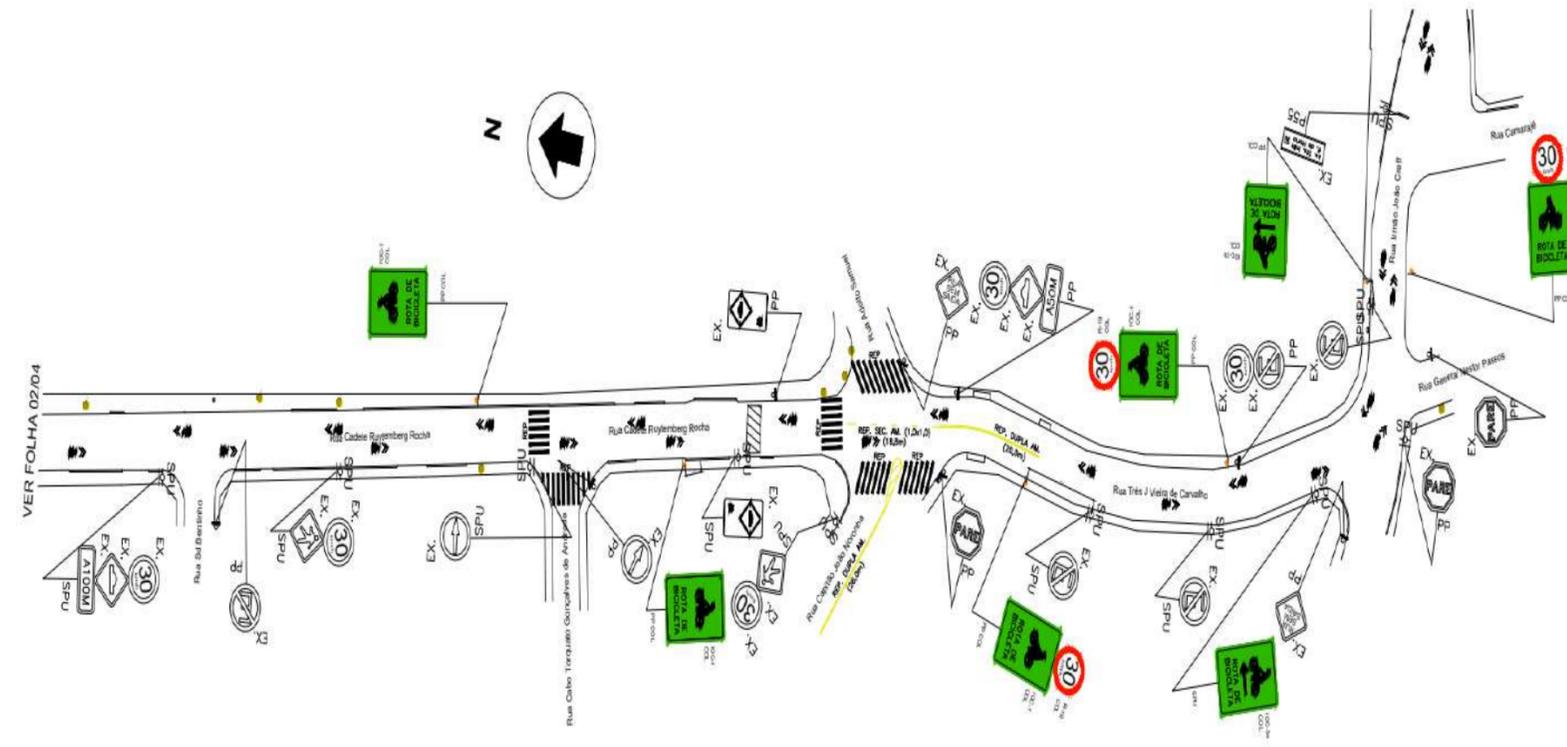


Local Rua Cadete Ruytemberg
Rocha
Foto Projeto Funcional
Jun/2023.

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL 2024

DESCRIÇÃO INDIVIDUAL


OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Maria Amália L. de Azevedo (**MOB**)

DESCRIÇÃO	
Ação	Construção de Ciclovias
Endereço/Distrito/Subprefeitura	R. Mamud Rahd; R. Icamagua ; Pça. Dona Mariquinha Sciascia; R. Maria Amália Lopes de Azevedo; Av. Antonio Cesar Neto (CEU)/ Santana-Tucuruvi
Situação	Em andamento – 0 % concluído
Processo Administrativo	6020.2022/0038571-7
Início da Obra	Mar/2022
Previsão de Término	Dez/2024
Unidade de Medida	Extensão, em metros, de ciclovias construídas
Possui mais de uma Fonte de Recurso	Sim

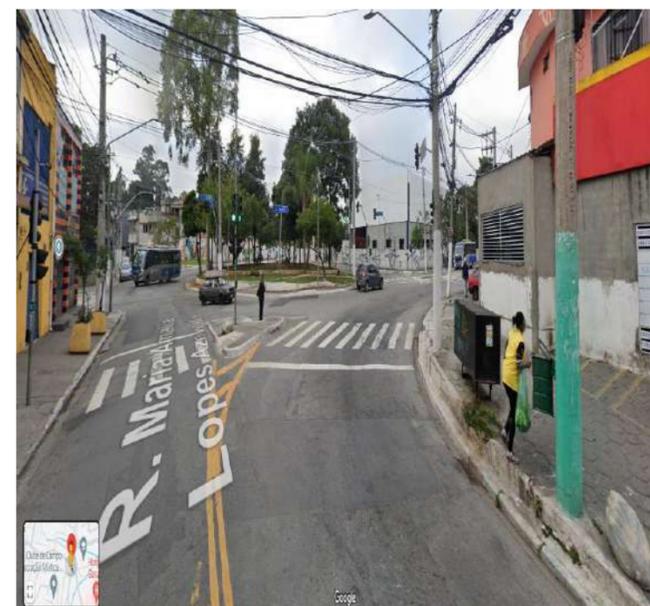


*Foto antes da Intervenção.
Jun/2023*

REMANESCENTE 2023		
Valor Aprovado	R\$ 10.875.243,50	Res. 019/2024
Valor Empenhado	R\$ 0,00	
Valor Pago	R\$ 0,00	

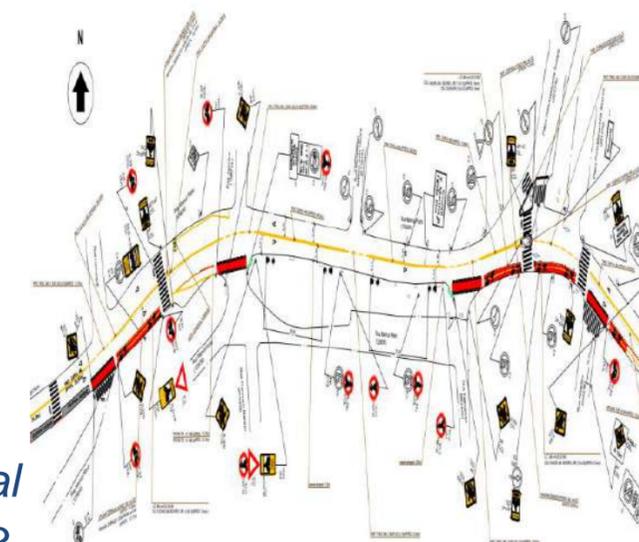


*Foto Projeto Funcional
Ago/2023.*

OBJETO – Construção de Ciclovias, Ciclofaixa e Ciclorrotas Maria Amália L. de Azevedo (MOB)

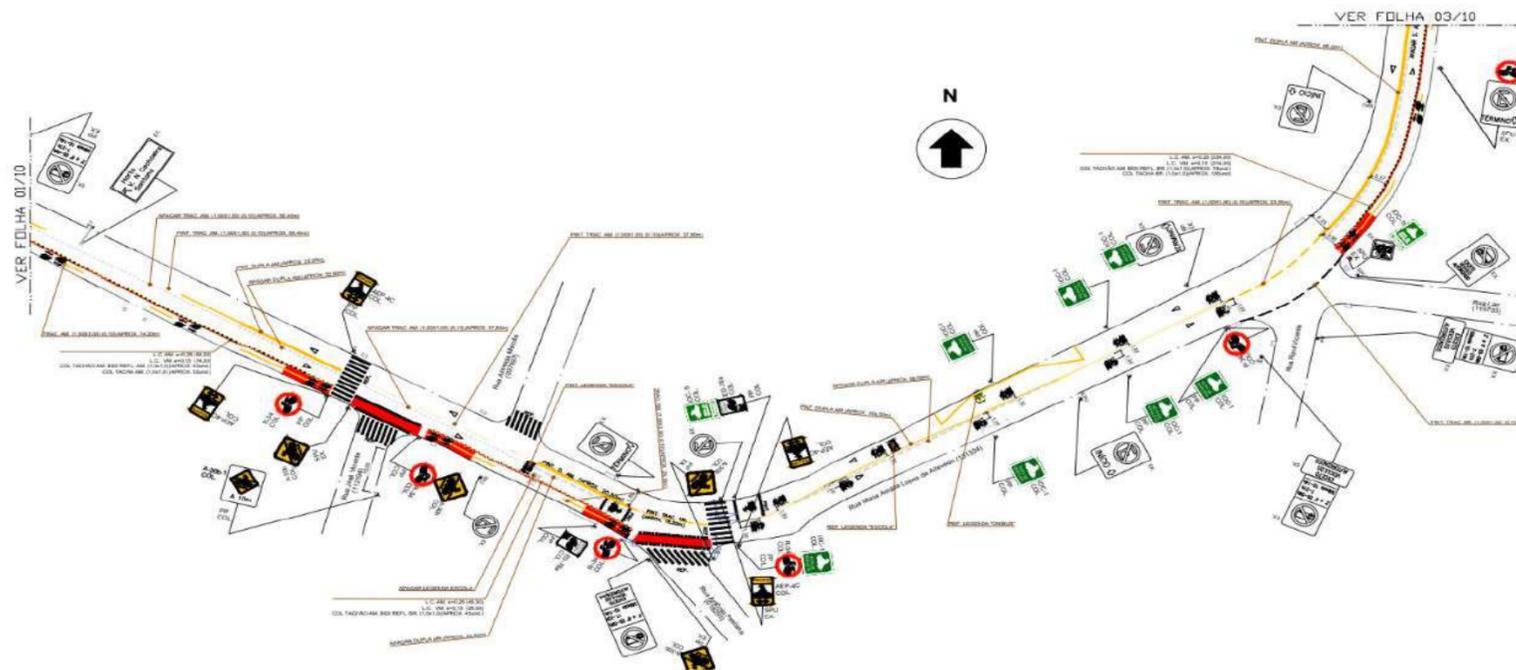

*Local Rua Maria Amália Lopes
de Azevedo
Foto Projeto Funcional
Ago/2023.*

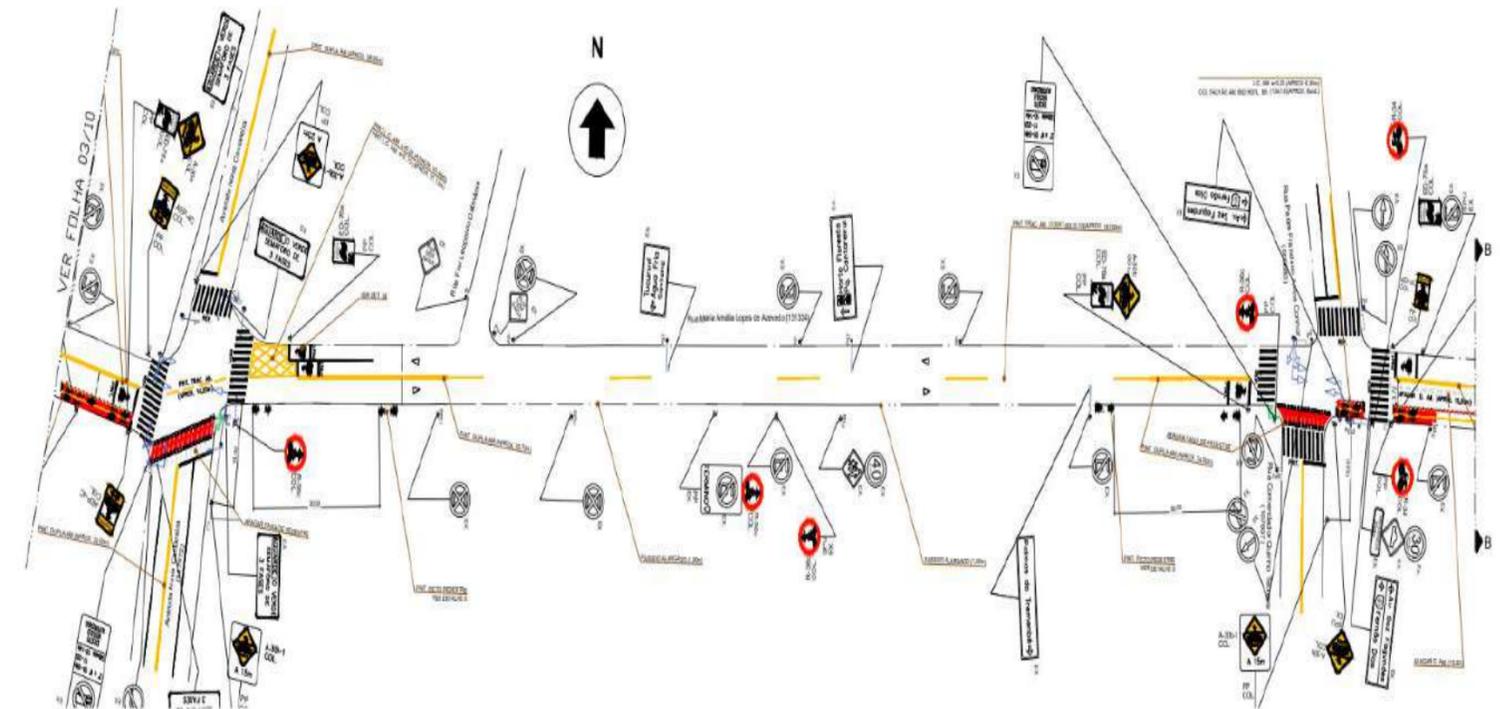

*Local Rua Maria Amália Lopes
de Azevedo
Foto Projeto Funcional
Ago/2023.*

Prestação de Contas Parcial do Plano de Aplicação 2024

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Processo SEI 6020.2023/0065744-1



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

OBJETO DO GASTO	APROVADO RES. 019/2024	LIQUIDADADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Projetos de redesenho urbano para segurança viária (3757)	R\$ 4.060.303,67	R\$ 441.248,5	10,9%	MOB 2024
Obras de redesenho urbano para segurança viária (3757)	R\$ 43.664.340,33	R\$ 3.256.937,83	7,5%	MOB 2024
Construção de Ciclovias (1097)	R\$ 183.061.391,33	R\$ 380.870,83	0,2%	MOB 2024/2023
Implantação de Corredores de Ônibus (1099)	R\$ 15.325.424,00	R\$ 8.928.499,44	58,3%	MOB 2024
Implantação de Transporte Público Hidroviário (5362)	R\$ 4.062.432,00	R\$ 79.078,22	1,9%	MOB 2024
Construção de Terminais de Ônibus (1095)	R\$ 24.706.144,00	R\$ 11.161.816,69	45,2%	MOB 2024
Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus (5394)	R\$ 27.300.000,00	R\$ 9.019.601,31	33,0%	MOB 2024
Dotações a manter	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	0%	MOB 2024
TOTAL	R\$ 302.184.035,33	R\$ 33.268.052,82	11%	MOB




IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES DE ÔNIBUS

OBJETO DO GASTO	APROVADO RES. 019/2024	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Implantação de Corredores de Ônibus (1099)	R\$ 15.325.424,00	R\$ 15.324.424,00	R\$ 8.928.499,44	58,3%	MOB 2024



CORREDOR ITAQUERA-LÍDER

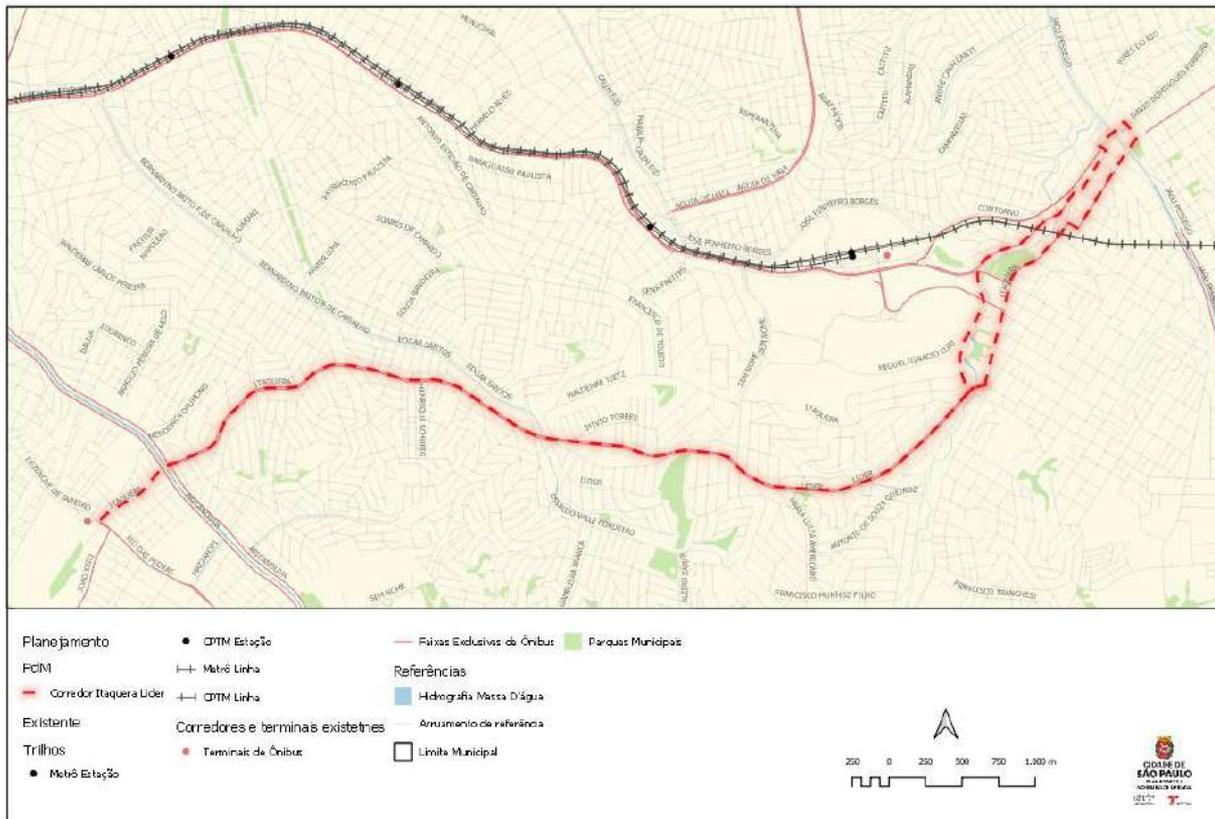

CORREDOR ITAQUERA – PARTE I:

Situação atual:

Concluído

CORREDOR ITAQUERA – PARTE II:

Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0311-01-00 - 11/06/2022
- Processo: 5010.2022/0017022-5
- Concluído 04/2023

Projetos básico, executivo e licenciamento ambiental:

- Contrato nº 2022/0185-01-00 - 22/07/2022
- Processo: 5010.2021/0010259-7
- Previsão conclusão: 1º semestre 2024

Valor aprovado:

R\$ 1.321.175,84

Valor liquidado:

R\$ 994.242,08

CORREDOR ITAQUERA-LÍDER (PARTE I)



PARADA E PRAÇA FRANCISCO DANIEL LOPES



PARADA ALFREDO DE TOLEDO




PARADA ARICANDUVA



CRUZAMENTO - AV. ITAQUERA X CÓRREGO GAMELINHA

Julho/2024

CORREDOR CELSO GARCIA

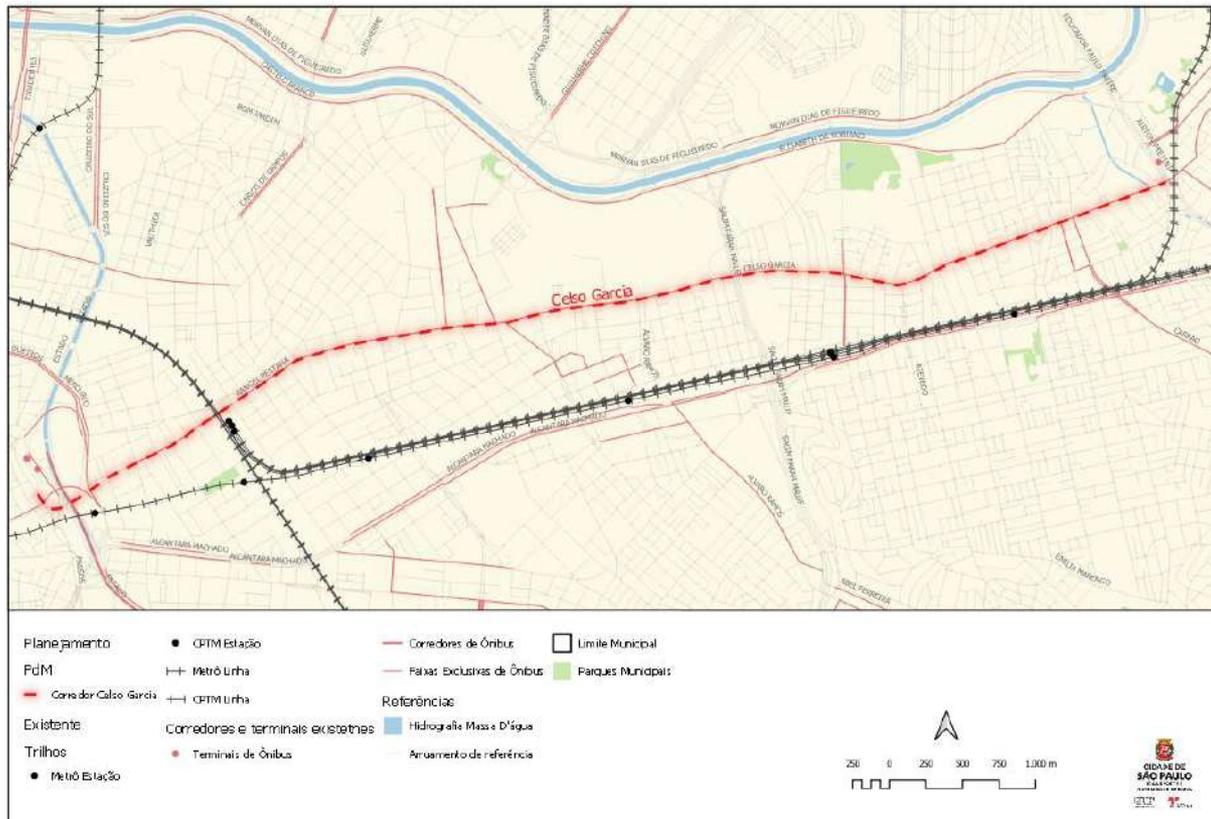

CORREDOR CELSO GARCIA:

Situação atual:

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2021/0551-01-00 - 12/04/2022
- Processo: 5010.2021/0006795-3
- Previsão conclusão: 1º semestre 2024

Obras - Trecho 1:

- Contrato nº 2023/0461-01-00 - 06/11/2023
- Processo: 5010.2023/0013612-6
- Previsão conclusão: 2º semestre 2025

Supervisão Obras - Trecho 1:

- Contrato nº 2023/0484-01-00
- Processo: 5010.2023/0013653-3
- Previsão conclusão: 2º semestre 2025

Valor aprovado:

R\$ 5.121.930,26

Valor liquidado:


R\$ 4.136.761,33

CORREDOR CELSO GARCIA



FOTOS OBRAS -
ABRIL-MAIO-
Jul/2024

CORREDOR MIGUEL YUNES

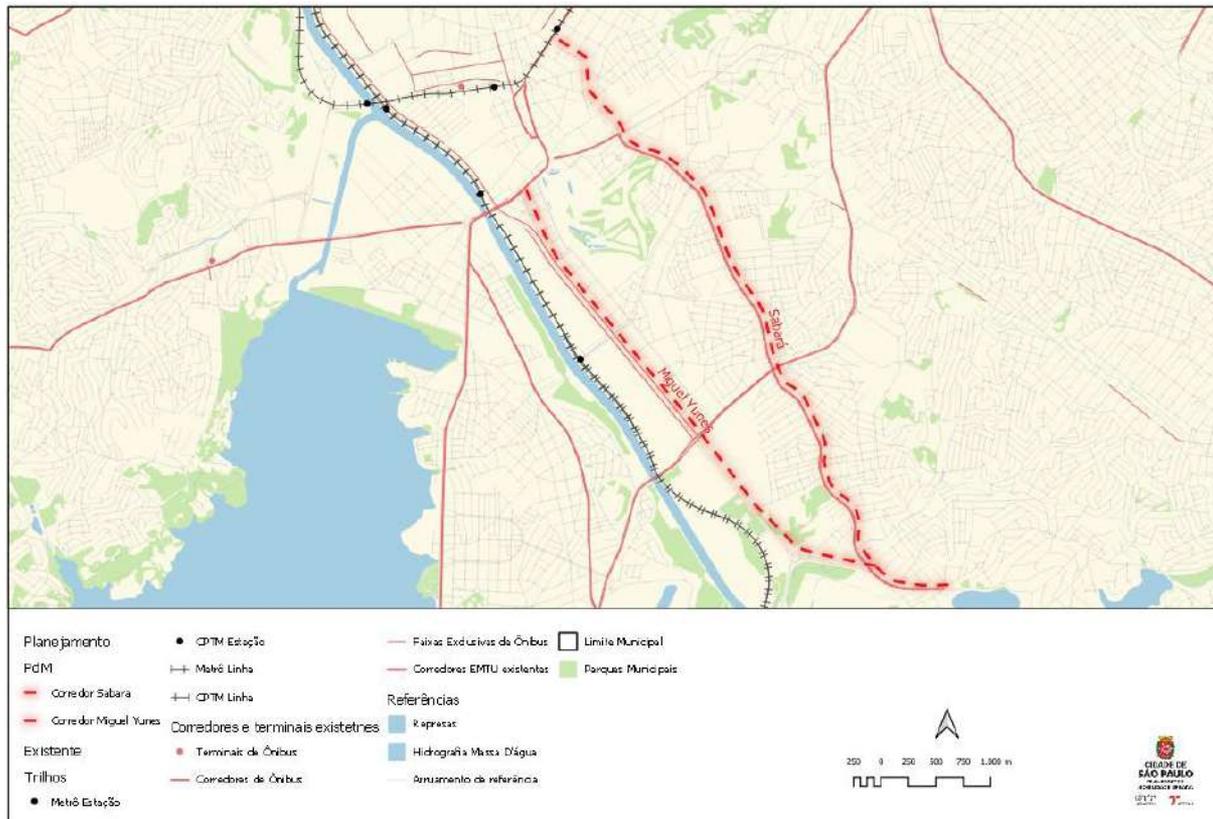

CORREDOR MIGUEL YUNES:

Situação atual:

Elementos técnicos expropriatórios:

- Contrato nº 2022/0238-01-00 - 04/05/2022
- Processo: 5010.2022/0003734-7
- Previsão conclusão: 1º semestre 2024

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0384-01-00 - 17/11/2022
- Processo: 5010.2022/0018820-5
- Previsão conclusão: 1º semestre 2024

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024

Valor aprovado:

R\$ 1.155.151,28

Valor liquidado:


R\$ 698.559,3

CORREDOR MIGUEL YUNES



CORREDOR MIGUEL YUNES - PROJETO E ORTOFOTO - 1º SEMESTRE 2024

CORREDOR NOSSA SENHORA DO SABARÁ

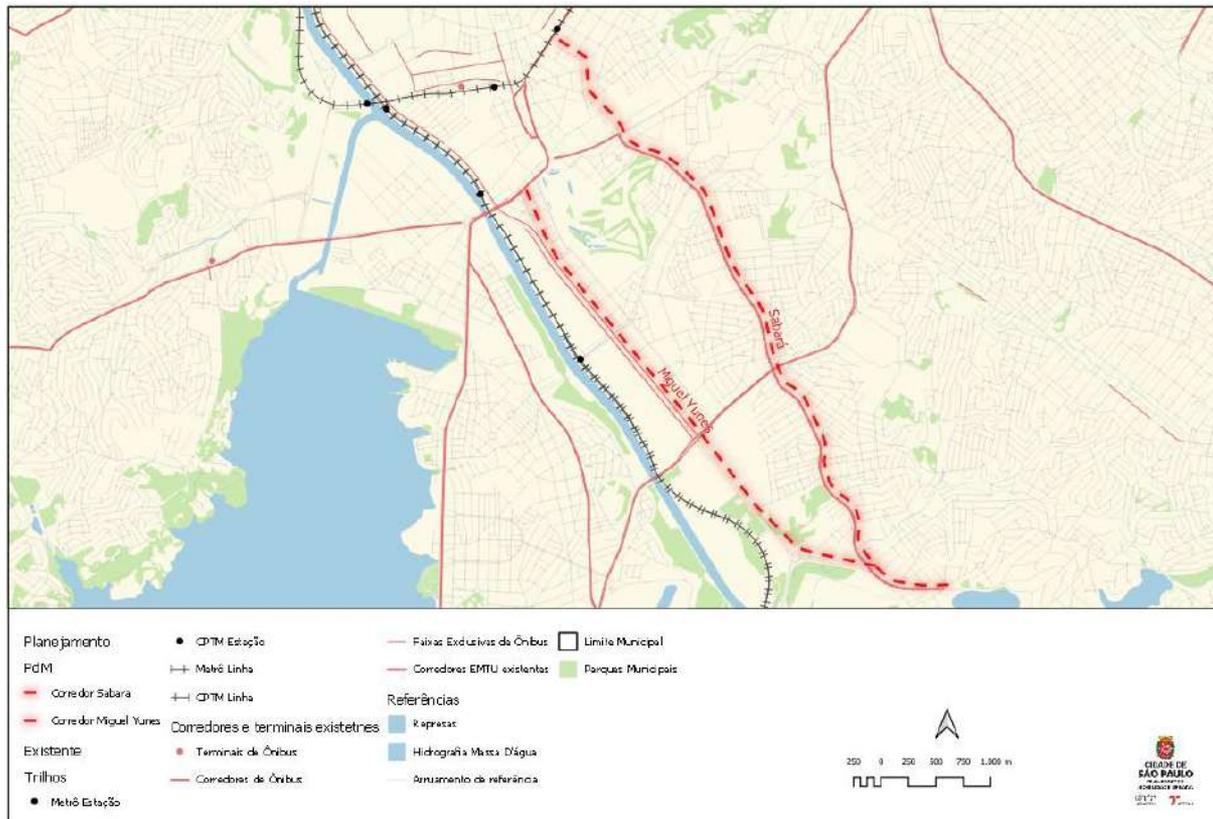

CORREDOR NOSSA SRA. SABARÁ:

Situação atual:

Projetos básico e executivo:

- Contrato nº 2022/0501-01-00 - 10/01/2023
- Processo: 5010.2022/0021396-0
- Previsão conclusão: 1º semestre 2024

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024

Obras:

- Contrato nº 2023/0432-01-00 – 08/11/2023
- Processo: 5010.2023/0012156-0
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024

Valor aprovado:

R\$ 3.627.946,36

Valor liquidado:

R\$ 2.936.756,43


CORREDOR NOSSA SENHORA DO SABARÁ



Paradas ao longo da Avenida N. S. do Sabará OBRAS - Jul/2024



CORREDOR NORTE-SUL

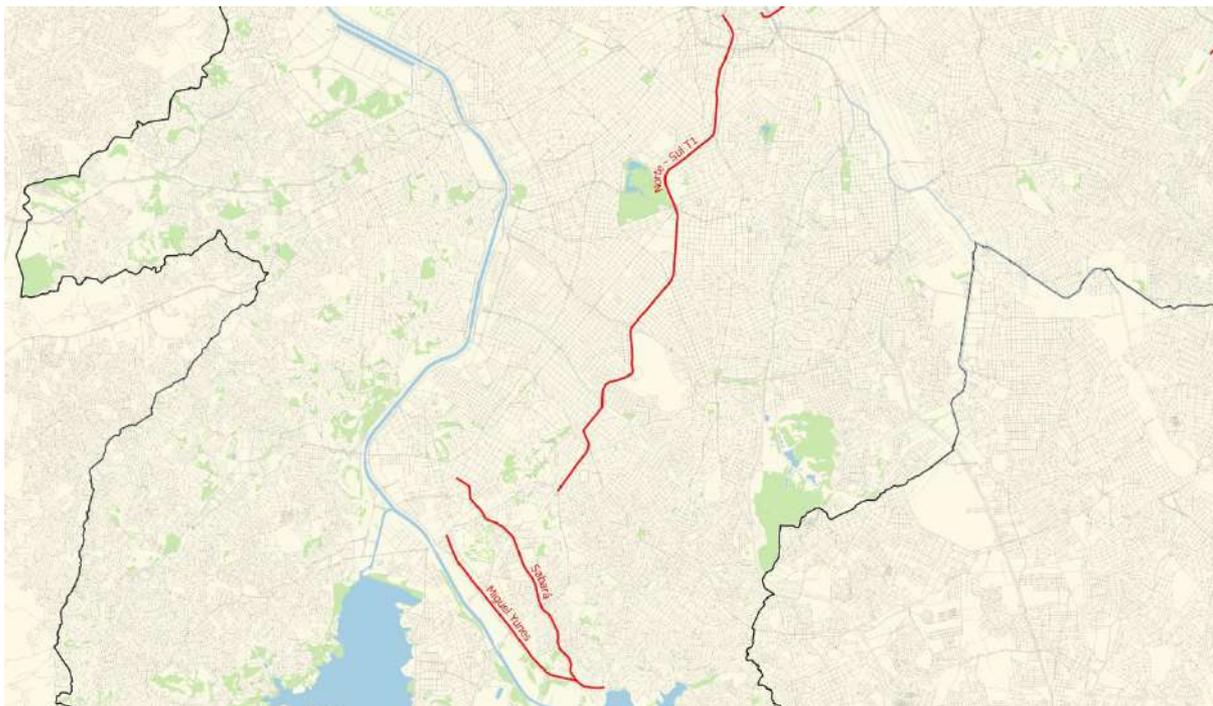

CORREDOR NORTE-SUL:

Situação atual:

Estudos ambientais e licenciamento:

- Contrato nº 2022/0639-01-00 – 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0016037-8
- Previsão conclusão: 2º semestre 2024

Projeto básico:

- Concluído.

Projeto executivo e obras:

- Processo licitatório em andamento.
- Processo: 5010.2023/0021627-8


Valor aprovado:

R\$ 4.099.220,26

Valor liquidado:

R\$ 162.180,3

CORREDOR NORTE-SUL

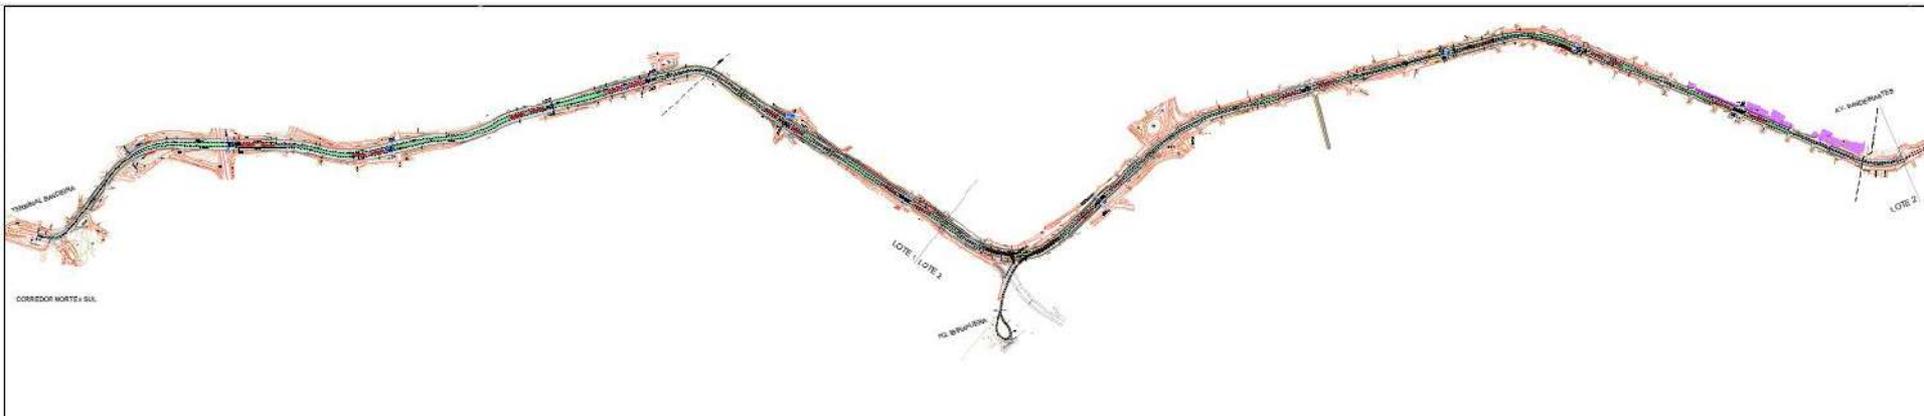

Corredor Norte-Sul - Lotes 1 e 2 - Projeto - 1º semestre 2024



IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

OBJETO DO GASTO	APROVADO RES. 019/2024	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Implantação de Transporte Público Hidroviário (5362)	R\$ 4.062.432,00	R\$ 4.062.432,00	R\$ 79.078,22	1,9%	MOB 2024



IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO



TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

Elementos Técnicos Expropriatórios - Terminal / Atracadouro Cocaia:

- Contrato nº 2022/0438-01-00 - 12/08/2022
- Processo: 5010.2022/0010925-9
- Concluído 02/2023

Elementos Técnicos Expropriatórios – Terminal / Atracadouro Pedreira:

- Contrato nº 2022/0515-01-00 - 28/09/2022
- Processo: 5010.2022/0012715-0
- Concluído 03/2023

Estudos ambientais, projeto funcional e básico dos terminais, atracadouros e viários de acessos:

- Contrato nº 2022/0502-01-00 - 11/01/2023
- Processo: 5010.2022/0013125-4
- Previsão conclusão: 1º semestre 2024

Levantamento Batimétrico:

- Contrato nº 2023/0009-01-00 - 29/03/2023
- Processo: 5010.2022/0019046-3
- Previsão conclusão: 1º semestre 2024


Valor aprovado:

R\$ 4.062.432,00

Valor liquidado:

R\$ 79.078,22


IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

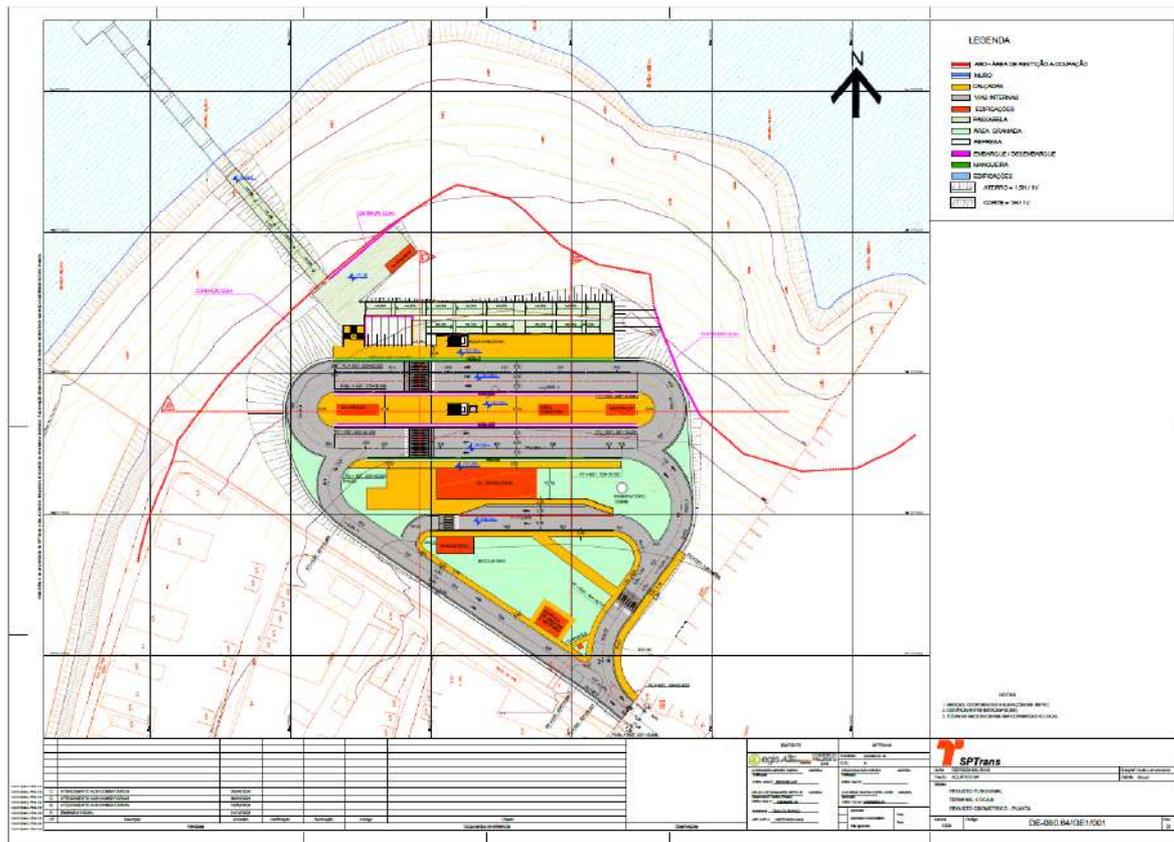

Terminal Cocaia - Projeto Funcional - 1º semestre 2024



IMPLANTAÇÃO DE TRANSPORTE PÚBLICO HIDROVIÁRIO

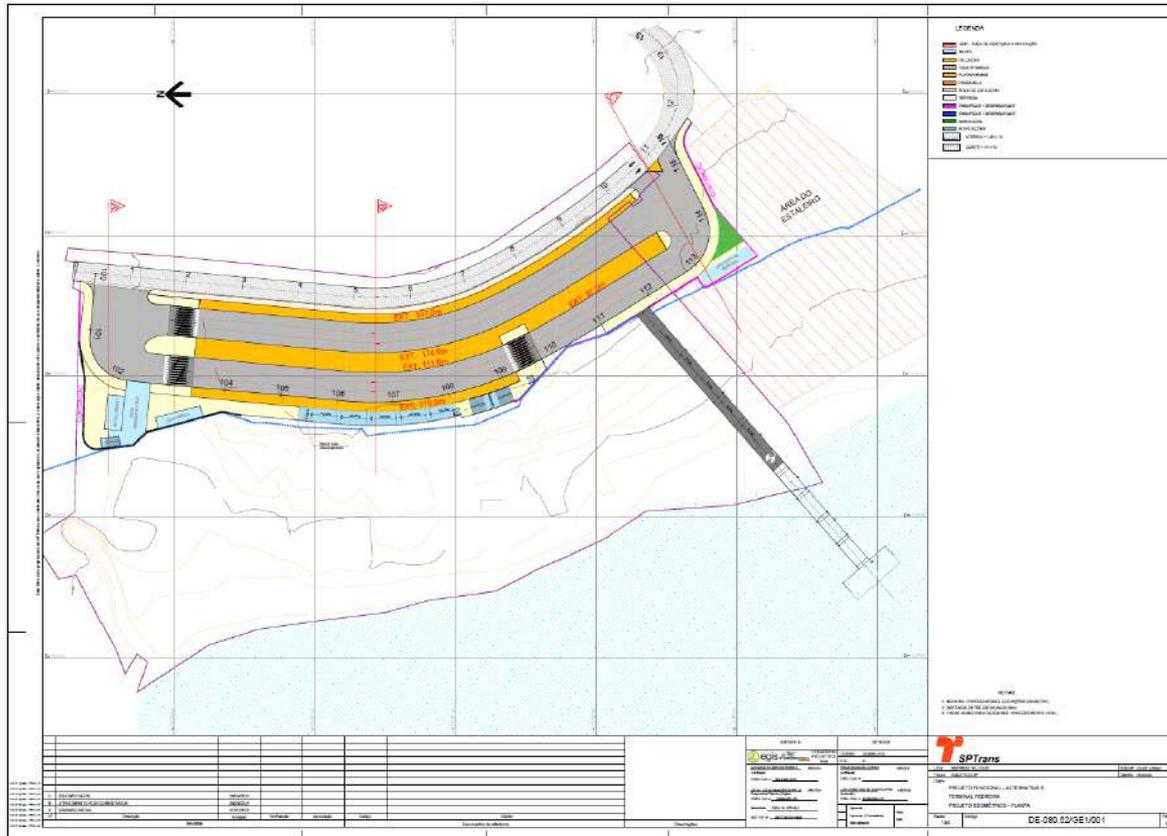

Terminal Pedreira - Projeto Funcional - 1º semestre 2024




CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS DE ÔNIBUS

OBJETO DO GASTO	APROVADO RES. 019/2024	EMPENHADO	LIQUIDADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Construção de Terminais de Ônibus (1095)	R\$ 24.706.144,00	R\$ 20.627.675,09	R\$ 11.161.816,69	45,2%	MOB 2024



TERMINAIS JARDIM MIRIAM E SÃO MATEUS

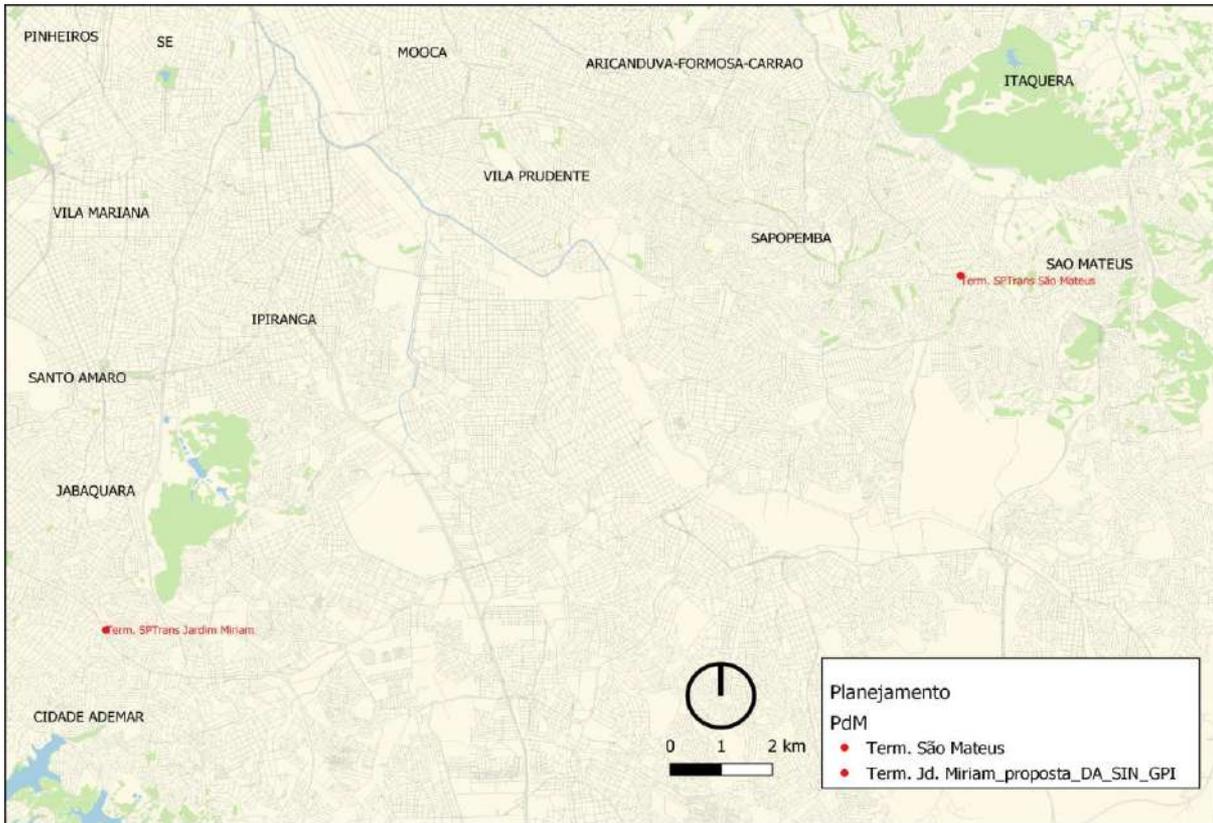

TERMINAL JARDIM MIRIAM:

Situação atual:

Procedimento licitatório para contratação do projeto funcional, projeto básico e elaboração de estudos ambientais e territoriais

- Edital Licitação nº023/2022 - 01/09/2022
- Cancelado – alteração da DUP

Estudos e projetos de realocação, contrato geral de gerenciamento e compatibilização de projetos:

- Contrato nº 2022/0156-01-00 – 17/09/2022
- Processo: 5010.2021/0012778-6

Valor aprovado:

R\$ 1.982.674,63

Valor liquidado:

R\$ 1.571.816,96

TERMINAL SÃO MATEUS:

Situação atual:

Projetos básico, executivo e elaboração de estudos ambientais e territoriais

- Contrato nº 2022/0329-01-00 - 06/10/2022
- Processo: 5010.2022/0016359-8
- Previsão conclusão: 1º semestre 2024

Valor aprovado:


R\$ 22.723.469,37

Valor liquidado:

R\$ 9.589.999,73



TERMINAL SÃO MATEUS

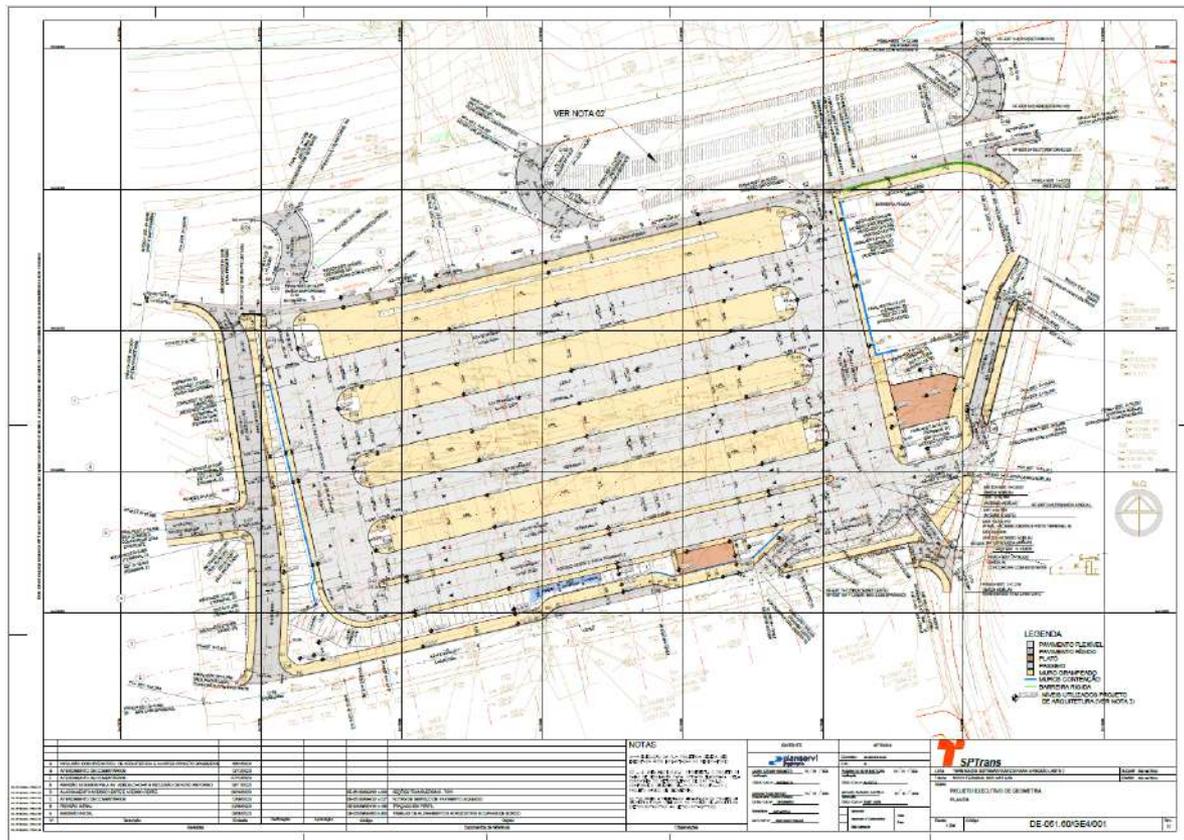

Terminal São Mateus - Projeto Executivo de Geometria - 1º semestre 2024




REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

OBJETO DO GASTO	APROVADO RES. 001/2024	EMPENHADO	LIQUIDADADO	REALIZADO	FONTES DOS RECURSOS
Requalificação do Pavimento de Paradas de Ônibus (5394)	R\$ 27.300.000,00	R\$ 27.300.000,00	R\$ 9.019.601,31	33,0%	MOB 2024



REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

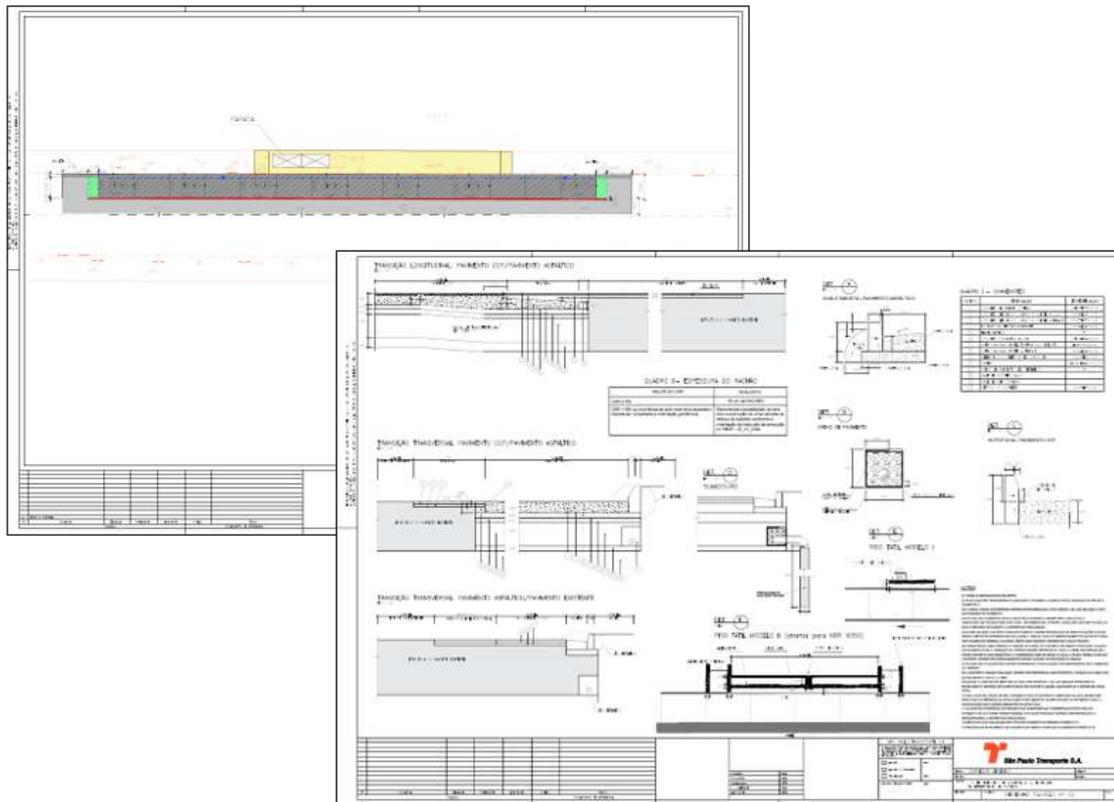

REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

Situação atual:

Projetos e obras em andamento para paradas nas avenidas nas subprefeituras.

- Contrato nº 2022/0350-01-00
- Processo: 5010.2022/0017023-3
- Previsão conclusão: 1º semestre 2024

Valor aprovado:

R\$ 27.300.000,00

Valor liquidado:

R\$ 2.557.759,27



REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE PARADAS DE ÔNIBUS

AV. MARECHAL TITO – ABRIL/2024



AV. MATEO BEI – ABRIL/2024





CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO
