

# Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado

# Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

DOTAÇÃO	Solicitado (R\$)		Execução orçan	0,00 R\$ 34.000,00 R\$ 34.000 R\$ - R\$ - R\$ - R\$ - R\$ 1.169.801 0,96 R\$ 27.750,96 R\$ 27.750 R\$ -	
DOTAÇÃO	Solicitado (K\$)	Reservado (R\$)	Empenhado (R\$)	Liquidado (R\$)	Pago (R\$)
98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 400.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00	R\$ 34.000,00
98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 20.580.371,30	R\$ 10.564.180,32	R\$ 12.083.336,89	R\$ 2.182.521,55	R\$ 1.169.801,41
98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	R\$ 27.750,96	R\$ -	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96	R\$ 27.750,96
98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.345.942,54	R\$ 5.339.826,84	R\$ 3.156.206,72
98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1	R\$ 2.272.973,71	R\$ -	R\$ 2.259.134,25	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	R\$ 1.213.052,91	R\$ 1.213.052,91	R\$ 1.213.052,91	R\$ 603.838,31	R\$ -
98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ 40.156.908,58	R\$ 13.154.470,47	R\$ 6.665.051,90	R\$ 2.496.146,38	R\$ 1.144.415,46
98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	R\$ 70.000.000,00	R\$ 30.311.646,24	R\$ 27.628.269,45	R\$ 10.684.084,04	R\$ 5.532.174,55
		43,30%	39,47%	15,26%	7,90%

<sup>\*</sup>Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 30/07/2024.

	o em: 30/04/2024 às 1	e distribution and the second													
Item \Xi	Equipamento — cultural	Ação =	Processo =	Status =	Projeto/atividade =	Dotação orçamentária	Ŧ	Valor <del>▽</del>	Emp	oenhado (R\$) \Xi	Liqu	idado (R\$) 😑	F	Pago (R\$)	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma das Fachadas	6025.2023/0002933-2	Em Execução/Obra	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	-	3.875.840,51	R\$	3.858.585,06	RS	781.832,04	R\$	-	20,2%
1	Centro Cultural São Paulo	AVCB e Serviços Corretivos de Elétrica	6025.2021/0003800-1	Em Planejamento	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	*	1.000,00	RŞ	350	RS	iĝ.	RŞ	ā	0,0%
1	Centro Cultural São Paulo	Reforma de manutenção predial	6025.2024/0014937-2	Aguardando Autorizações/Aprovações	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	*	1.500.000,00	RŞ	1.394.249,93	R\$	-	RS	¥	0,0%
2	Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	Em Execução/Obra	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0	*	3, 5.345.942,54	RŞ	5.345.942,54	RS	5.339.826,84	R\$	3.156.206,72	99,9%
2	Casa de Cultura Cidade Ademar	Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar	6025.2022/0018097-7	Em Execução/Obra	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1	-	2.272.973,71	RŞ	2.259.134,25	RS	-	R\$	0	0,0%
3	Sitio Mirim	Reconstrução da Casa-Sede	6025.2020/0016806-0	Em Execução/Obra	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	•	3.500.000,00	R\$	2.539.459,99	RS		R\$	-	0,0%
4	Sítio Morrinhos	Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade	6025.2022/0022026-0	Em Execução/Obra	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	*	1.500.000,00	RŞ	1.500.000,00	RS	15	RŞ	ā	0,0%
5	Centro Cultural Penha	Serviços Corretivos para AVCB	6025.2018/0009114-4	Em Execução/Obra	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	¥	218.150,00	RŞ	211.536,40	RS	99.478,81	RŞ	99.478,81	45,6%
6	Teatro João Caetano	Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro.	6025.2022/0011336-6	Em Execução/Obra	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	*	5.500.000,00	RŞ	1.805.986,18	RS	1.117.335,97	R\$	1.117.335,97	20,3%

Atualizad	o em: 30/04/2024 às 1:	1h59												
ltem ∓	Equipamento =	Ação =	Processo =	Status =	Projeto/atividade =	Dotação orçamentária	Ŧ	Valor <del>▽</del>	Empenhado (R\$) =	Liqui	idado (R\$) 😑	Pag	o (R\$) =	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
7	Biblioteca Mário de Andrade	Projeto de AVCB	6025.2018/0015645-9	Em Planejamento	Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	*	R\$ 1.000,00	R\$ -	RS	12	R\$	0	0,0%
7	Biblioteca Mário de Andrade	Restauro da calçada	6025.2022/0023974-2	Em Planejamento		98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	+	R\$ 100.000,00	RS -	R\$	14	RŞ	-	0,0%
8	Edifício Sampaio Moreira	3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo	6025.2023/0016820-0	Em Execução/Obra	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	*	R\$ 710.000,00	R\$ 585.775,61	RS	230.888,10	RŞ	æ	32,5%
9	Casa de Cultura Parelheiros	Manutenção Predial	6025.2023/0015198-7	Em Execução/Obra	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	-	R\$ 116.000,00	R\$ 347.516,67	RS	155.215,13	RŞ	155.215,13	133,8%
10	Escola Escola Municipal de Iniciação Artísticas - EMIA	Restauro e troca da cobertura da Casa 2	6025.2023/0012495-5	Encaminhado	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	•	R\$ 750.000,00	R\$ -	RS		R\$	-	0,0%
11	Praça das Artes	3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos	8510.2022/0000503-4	Em Execução/Obra	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	*	R\$ 2.703.326,18	R\$ 2.703.326,18	R\$	1.351.730,92	RŞ	ē	50,0%
11	Praça das Artes	3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes	8510.2022/0000503-4	Em Execução/Obra	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	•	R\$ 603.838,31	R\$ 603.838,31	RS	603.838,31	RŞ	e e	100,0%
11	Praça das Artes	4ª fase - obras complementares do prédio dos corpos artísticos	7910.2023/0002491-1	Processo Sei Iniciado	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0		R\$ 25.836.108,90	RS -	RS	35	R\$	=	0,0%
11	Praça das Artes	4º fase - gerenciamento e fiscalização das obras complementares do prédio dos corpos artísticos	8510.2023/0000696-2	Em Execução/Obra	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0	-	R\$ 609.214,60	R\$ 609.214,60	RS	19	RŞ	ē	0,0%
12	Memorial dos Aflitos	Implantação do Memorial	6025.2019/0015893-3	Em Planejamento	Implantação do Memorial dos Aflitos	98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0	¥	R\$ 366.000,00	RŞ -	R\$	0-	RŞ	-	0,0%

Atualizad	o em: 30/04/2024 às 1	1h59													
Item \Xi	Equipamento =	Ação =	Processo =	Status =	Projeto/atividade =	Dotação orçamentária	₹	Valor =	Empe	enhado (R\$) 😑	Liqui	dado (R\$) =	P	ago (R\$) =	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
12	Memorial dos Aflitos	Sondagem e Parecer de fundações para implantação de Edifício do Memorial dos Aflitos.	6025.2023/0014412-3	Em Execução/Obra	Implantação do Memorial dos Aflitos	98.25.13.391.3001,5.421,44905100.08.1.759.0402.0	•	R\$ 34.000,00	RŞ	34.000,00	RS	34.000,00	RŞ	34.000,00	100,0%
13	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços Civis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança	6025.2023/0005660-7	Em Execução/Obra	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	·	R\$ 475.000,00	RŞ	398.445,44	R\$	194.863,49	R\$	194.863,49	41,0%
13	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Serviços corretivos de AVCB	6025.2022/0011088-0	Finalizado	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	•	R\$ 685.727,70	R\$	663.256,69	R\$	600.362,32	R\$	600.362,32	87,6%
13	Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso	Instalação de Estúdio de Gravação	6025.2022/0022073-1	Em Licitação / Reservado	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	•	R\$ 412.274,73	RŞ	490.145,76	RS	820	R\$	12	0,0%
14	Casa de Cultura Hip Hop Leste - Cidade Tiradentes	Requalificação para acessibilidade e instalação de novo padrão de medição de água e luz na Casa de Cultura		Em Planejamento	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	•	R\$ 1.000,00	R\$		RS		RŞ	-	0,0%
15	Teatro Arthur Azevedo	Manutenção Predial de Telhados dos Teatros	6025.2021/0012695-4	Em Planejamento	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	*	R\$ 1.000,00	R\$	52	RS	820	R\$	8	0,0%
16	Monumento	Restauro da Fonte Monumental	6025.2023/0037747-0	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	٠	R\$ 581.119,11	R\$	¥	R\$	(2)	R\$	æ	0,0%
17	Biblioteca Chácara do Castelo	Requalificação	6025.2023/0017795-1	Em Execução/Obra	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	•	R\$ 1.267.000,00	R\$	1.127.881,80	RS	94.495,71	R\$	94.495,71	7,5%
18	Teatro Cacilda Becker	Reforma Predial de Telhados dos Teatros	6025.2021/0012695-4	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	*	R\$ 600.000,00	R\$	2	R\$		R\$	<u> </u>	0,0%

Atualizad	o em: 30/04/2024 às 1	1h59													
tem =	Equipamento =	Ação =	Processo =	Status =	Projeto/atividade =	Dotação orçamentária	÷	Valor <del>=</del>	Empe	nhado (R\$) \Xi	Liquidado	(R\$) =	Pago (	R\$) =	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
19	Teatro Flávio Império	Reforma Predial de Telhados dos Teatros	6025.2021/0012695-4	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	₹ R	\$ 1.000,00	RŞ		RS	(*)	RS	-	0,0%
20	Casa de Cultura São Mateus	Construção de Novo Edifício	Sem processo	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	* R	\$ 2.000.000,00	RŞ	70	RS	(2)	R\$	15	0,0%
21	Casa de Cultura Manuel Mendonça	Obra de Restauro	Sem processo	Retomar	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	₹ R	\$ 1.000,00	RS	28	R\$	**	RŞ	ę	0,0%
22	Casa de Cultura Vila Guilherme	Obra de Restauro	Sem processo	Retomar	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	R	\$ 1.000,00	R\$	-	R\$	(*)	RŞ	-	0,0%
22	Casa de Cultura Vila Guilherme	Projeto executivo de restauro	6025.2022/0003748-1	Em Execução/Obra	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	₹ R	\$ 227.600,00	RŞ	222.990,73	R\$	52.465,44	R\$	52.465,44	23,1%
23	Centro Cultural Tendal da Lapa	Requalificação e Adequações de Segurança	Sem processo	Retomar	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	₹ R	\$ 31.000,00	RS	26	R\$	127	R\$	¥	0,0%
23	Centro Cultural Tendal da Lapa	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	₹ R	\$ 119.621,31	R\$		RS	353	R\$	/#	0,0%
24	Biblioteca Brito Broca	Projeto executivo para requalificação	6025.2024/0015470-8	Aguardando Autorizações/Aprovações	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	₹ R	\$ 1.000,00	R\$	722.942,96	RS	-	RS	ā	0,0%
25	Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	₹ R	\$ 135.773,55	R\$	2	RS		RŞ	-	0,0%
26	Biblioteca Roberto Santos	Serviços Corretivos para Acessibilidade e Segurança contra incêndio	Sem processo	Retomar	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	* R	\$ 100.000,00	RŞ	5	RS		R\$	× <del>-</del>	0,0%

Atualizado em 20/04/2024 às 11h50

ltualizad	o em: 30/04/2024 às 1	1h59											
tem \Xi	Equipamento =	Ação <del>▽</del>	Processo =	Status	── Projeto/atividade   ──	Dotação orçamentária	Ŧ	Valor <del>▽</del>	Empenhado (R\$) =	Liquidado (R\$)	= Pago (R	s) =	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
27	Bibliotecas Hans Christian Andersen	Projeto executivo para requalificação	Sem processo	Retomar	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	¥ F	\$ 50.000,00	RS -	RS -	RŞ		0,0%
28	Biblioteca Cassiano Ricardo	Projeto executivo para requalificação	Sem processo	Retomar	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	~ F	50.000,00	R\$ -	RS -	RŞ	-	0,0%
29	Casa Amarela	Projeto executivo e obra de restauro e requalificação	Sem processo	Em Planejamento	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	- 1	104.758,82	R\$ -	RS -	- R\$	-	0,0%
29	Casa Amarela	Gerenciamento e fiscalização de projeto e obra de restauro e requalificação	6025.2023/0007211-4	Em Planejamento	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	÷ F	1.000,00	R\$ -	R\$	RŞ	ē	0,0%
30	Biblioteca Sylvia Orthof	Readequação para acessibilidade	Sem processo	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	¥ F	1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$	=	0,0%
31	Chácara do Jockey	Reforma para ativação de novas áreas	Sem processo	Em Planejamento	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	~ F	1.000,00	RS -	RS -	- R\$	.5	0,0%
32	Biblioteca Pedro Nava	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	- 1	95.703,38	R\$ -	RS -	R\$	ę	0,0%
33	Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	· [	\$ 60.349,57	R\$ -	RS -	RS	-	0,0%
34	Casa de Cultura Itaim Paulista	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	~ F	166.373,55	R\$ -	RS -	RŞ	ē	0,0%
35	Biblioteca Vicente de Carvalho	Levantamentos Planialtimétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	- F	19.609,02	R\$ -	RS -	RS	T.	0,0%

At the few spaces of the space

tualizade	o em: 30/04/2024 às 1	1h59									<u> </u>			
em =	Equipamento =	Ação <del>▽</del>	Processo =	Status =	Projeto/atividade =	Dotação orçamentária	Ŧ	Valor ∓	Empenhado (RS	s) =	Liquidado (R\$)		Pago (R\$) =	% do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC
36	Casa de Cultura Hip-Hop Sul	Levantamentos Plania <mark>lt</mark> imétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	~ F	40.568,04	RS	5	R\$ -	R\$	-	0,0%
37	Casa do Caxingui	Levantamentos Plania <mark>lt</mark> imétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	- F	90.282,58	RS	8	RS -	RS		0,0%
38	Biblioteca Padre José de Anchieta	Levantamentos Plania <mark>lt</mark> imétrico e Cadastral	6025.2023/0034072-0	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	- F	56.856,48	RS	8	RS -	RS		0,0%
39	Arquivo Histórico Municipal	Serviços corretivos de AVCB - CMAR	6025.2023/0024465-9	Em Planejamento	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	- F	S 58.000,00	R\$ 48.78	39,39	RS -	R\$		0,0%
39	Arquivo Histórico Municipal	Instalação de linha de vida	6025.2023/0030077-0	Em Planejamento	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	~ F	R\$ 215.171,97	R\$ 127.50	00,00	RS -	RS	-	0,0%
40	Sítio da Ressaca	Pagamento de Despesa do Exercício Anterior	6025.2023/0025407-7	Em Execução/Obra	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1	~ F	27.750,96	R\$ 27.75	50,96	RS 27.750,96	R\$	27.750,96	100,0%
41	Biblioteca	Reforma e manutenção predial	Sem processo	Em Planejamento	Ampliação, Reforma e Requalificação de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0	- F	4.274.064,48	RS	10	RS -	R\$	1.0	0,0%
42	Monumento à Independência	Restauro	Sem processo	Em Planejamento	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0	~ F	2.500.000,00	RS	5	RS -	R\$		0,0%
43	Manutenção de dotação	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	Sem processo	Pausado	Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos	98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0	F	1.000,00	RS	22	RS -	R\$		0,0%
43	Manutenção de dotação	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	Sem processo	Pausado	Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico	98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0	F	1.000,00	R\$	i e	RS -	RS	1.43	0,0%
43	Manutenção de dotação	Construção de Equipamentos Culturais	Sem processo	Pausado	Construção de Equipamentos Culturais	98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0	F	1.000,00	R\$	-	RS -	R\$	1-0	0,0%
						TOT	TAL F	rs 70.000.000.00	RS 27.628.26	59,45	R\$ 10.684.084,04	RS	5.532.174,55	15.26%

#### 1. Centro Cultural São Paulo

Reforma das Fachadas



Ação: Reforma das Fachadas

Status: Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2023/0002933-2

**Início da obra:** 17/06/2024

**Previsão de término:** março/2025

**Valor:** R\$ 3.875.840,51

**Empenhado:** R\$ 3.858.585,06

**Liquidado:** R\$ 781.832,04


Pago: -

% de liquidação: 20,2%

**Endereço:** Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade












INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA





REMOÇÇÃO DE MANTA E REGULARIZAÇÃO DE BASE



#### 1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial





**Ação:** Reforma de manutenção

predial

Status: Aguardando

Autorizações/Aprovações

**Processo:** 6025.2024/0014937-2

Início da obra: aguardando Ordem

de início

**Valor:** R\$ 1.500.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.394.249,93


Liquidado: -

Pago: -

**% de liquidação:** 00,00%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

**Distrito:** Liberdade









Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Ação: Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Status: Em Execução/Obra

61,8% de execução

**Processo:** 6025.2022/0018097-7

**Início da obra:** 19/12/2022

**Previsão de término:** outubro/2024

**Valor:** R\$ 7.618.916,25

**Empenhado:** R\$ 7.605.076,79

**Liquidado:** R\$ 5.339.826,84

**Pago:** R\$ 3.156.206,72

% de liquidação: 70,09%

Endereço: Avenida Durval Pinto Ferreira, 820

**Distrito:** Cidade Ademar

**Subprefeitura:** Cidade Ademar









### 3. Sítio Mirim

Reconstrução da Casa-Sede

Ação: Reconstrução da Casa-Sede

Status: Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2020/0016806-0

**Início da obra:** 03/06/2024

Previsão de término: fevereiro/2026

**Valor:** R\$ 3.500.000,00

**Empenhado:** R\$ 2.539.459,99

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

**Endereço:** Rua Dr. Assis Ribeiro, s/n - Esquina


c/ Rua Urutu

Distrito: Vila Jacuí

Subprefeitura: São Miguel Paulista







#### 4. Sítio Morrinhos

Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

**Ação:** Restauro, segurança contra incêndio e

acessibilidade

Status: Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2022/0022026-0

**Início da obra:** 29/05/2024

**Previsão de término:** abril/2025

**Valor:** R\$ 1.500.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.500.000,00

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

**Endereço:** Rua Santo Anselmo, 102

Distrito: Casa Verde













Fotos do período de 29/05/2024 a 30/06/2024

#### 5. Centro Cultural Penha

au C apitala cidadi são P são P

Serviços Corretivos para AVCB

**Ação:** Serviços Corretivos para AVCB

Status: Em Execução

67% de execução

**Processo:** 6025.2018/0009114-4

Início dos serviços: 16/10/2023

**Previsão de término:** outubro/2024

**Valor:** R\$ 218.150,00

**Empenhado:** R\$ 211.536,40

**Liquidado:** R\$ 99.478,81


**Pago:** R\$ 99.478,81

**% de liquidação:** 45,6%

**Endereço:** Largo do Rosário, 20

Distrito: Penha

Subprefeitura: Penha

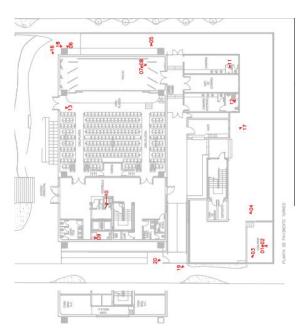





# 6. Teatro João Caetano

Daylo Capitala cultura SÃO



Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, de. Conservação e Restauro.

**Ação:** Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio, Conservação e Restauro

Status: Em Execução/Obra

57,7% de execução

**Processo:** 6025.2022/0011336-6

**Início da obra:** 19/12/2022

Previsão de término: junho/2025

**Valor:** R\$ 5.500.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.805.986,18

**Liquidado:** R\$ 1.117.335,97

**Pago:** R\$ 1.117.335,97

% de liquidação: 20,3%

**Endereço:** Rua Borges Lagoa, 650

**Distrito:** Vila Mariana

**Subprefeitura:** Vila Mariana









Fotos do período de 01/06/2024 a 30/06/2024

# 8. Edifício Sampaio Moreira

3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo





**Ação:** 3ª Fase de Obras de restauro -

Fase Piso Térreo

Status: Em Execução/Obra

13,5% de execução

**Processo:** 6025.2023/0016820-0

**Início da obra:** 02/10/2023

Previsão de término: dezembro/2024

**Valor:** R\$ 710.000,00

**Empenhado:** R\$ 585.775,61

**Liquidado:** R\$ 230.888,10

Pago: -

% de liquidação: 32,5%

Endereço: R. Líbero Badaró, 346

**Distrito:** Sé





9. Casa de Cultura Parelheiros

Manutenção Predial

**Ação:** Manutenção Predial

Status: Em Execução/Obra

76,15% de execução

**Processo:** 6025.2023/0015198-7

**Início da obra:** 02/10/2023

Previsão de término: dezembro/2024

**Valor:** R\$ 116.000,00

**Empenhado:** R\$ 347.516,67

**Liquidado:** R\$ 155.215,13

**Pago:** R\$ 155.215,13

% de liquidação: 133,8%

**Endereço:** Rua Nazle Mauad Lufti, 169

**Distrito:** Parelheiros

**Subprefeitura:** Parelheiros











Fotos do período de 01/03/2024 a 02/05/2024



Capitale Cidade

 $3^{\underline{a}}$  fase - Obras complementares dos corpos artísticos

**Ação:**  $3^{\underline{a}}$  fase - Obras complementares dos

corpos artísticos

Status: Em Execução/Obra

**Processo:** 8510.2022/0000503-4

**Início da obra:** 23/01/2023

Previsão de término: setembro/2024

**Valor:** R\$ 2.703.326,18

**Empenhado:** R\$ 2.703.326,18


**Liquidado:** - R\$1.351.730,92


Pago: -


% de liquidação: - 50,0%

**Endereço:** Avenida São João, 281

**Distrito:** República

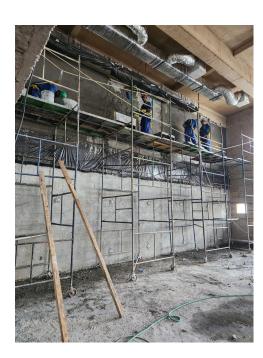

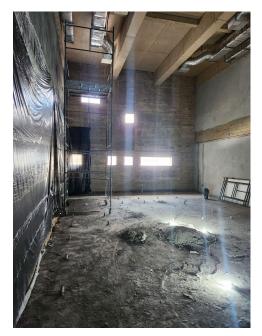



CIDADE DE SÃO PAULO CULTURA

 $3^{\underline{a}}$  fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

 $\textbf{Ação:}\ 3^{\underline{a}}$  fase - Gerenciamento e fiscalização de

obra - Praça das Artes

Status: Em Execução/Obra

**Processo:** 8510.2022/0000503-4

**Início da obra:** 23/01/2023

Previsão de término: setembro/2024

**Valor:** R\$ 603.838,31

**Empenhado:** R\$ 603.838,31


**Liquidado:** - R\$ 603.838,31

Pago: -

**% de liquidação:** - 100,00%


**Endereço:** Avenida São João, 281

Distrito: República









pital o Cidade de SÃO PAULO CULTURA

 $4^{\underline{a}}$  fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

**Ação:** 4ª fase - Gerenciamento e fiscalização de

obra - Praça das Artes

Status: Em Execução/Obra

**Processo:** 8510.2023/0000696-2

**Valor:** R\$ 609.214,60

Empenhado: R\$ 609.214,60

Liquidado: -

Pago: -


% de liquidação: -

**Endereço:** Avenida São João, 281

**Distrito:** República



Fotos tiradas em: 19/04/2023

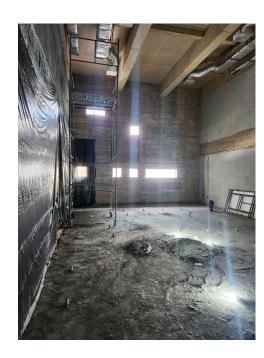





#### 12. Memorial dos Aflitos

Sondagem e Parecer de fundações para implantação de Edifício do Memorial dos Aflitos.

**Ação:** Implantação do Memorial

**Status:** Finalizado

**Processo:** 6025.2023/0014412-3

Início dos serviços: 18/03/2024

**Término:** abril/2024

**Valor:** R\$ 34.000.00

**Empenhado:** R\$ 34.000,00

**Liquidado:** R\$ 34.000,00

**Pago:** R\$ 34.000,00

% de liquidação: 100%

Endereço: Rua dos Aflitos, 70 -Traves. Rua dos Estudantes - alt. nº

52

Distrito: Liberdade













Fotos abril/2024.





# 13. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

Serviços Civis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança

Ação: Serviços Civis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança + Serviços corretivos de AVCB

Status: Em Execução/Obra

55,9% de execução

Processo: 6025.2023/0005660-7

Início dos serviços: 15/12/2023

**Previsão de término:** outubro/2024

Valor: R\$ 475.000.00

**Empenhado:** R\$ 398.445,44


**Liquidado:** R\$ 194.863,49

**Pago:** R\$ 194.863,49

% de liquidação: - 41,0%

**Endereço:** Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

**Distrito:** Vila Nova Cachoeirinha

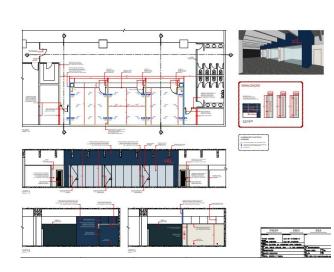









# 13. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

Serviços corretivos de AVCB - Aplicação de CMAR

**Ação:** Serviços corretivos de AVCB - Aplicação

de CMAR

Status: Finalizado

**Processo:** 6025.2022/0011088-0

Início dos serviços: 01/02/2024

**Término:** junho/2024

**Valor:** R\$ 685.727,70

**Empenhado:** R\$ 663.256,69


**Liquidado:** R\$ 600.362,32

**Pago:** R\$ 600.362,32

% de liquidação: 87,6%

**Endereço:** Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

Distrito: Vila Nova Cachoeirinha









# 13. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

# Instalação de Estúdio de Gravação

**Ação:** Instalação de Estúdio de Gravação

**Status:** Em Licitação / Reservado

**Processo:** 6025.2022/0022073-1

**Valor:** R\$ 412.274,73

**Empenhado:** R\$ 490.145,76

Liquidado: -


Pago: -

% de liquidação: -

**Endereço:** Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

Distrito: Vila Nova Cachoeirinha





### 17. Biblioteca Chácara do Castelo

CIDADE SÃO PAI

Requalificação

**Ação:** Requalificação

Status: Em Execução/Obra

11% de execução

**Processo:** 6025.2023/0017795-1

**Início da obra:** 27/11/2023

Previsão de término: setembro/2024

**Valor:** R\$ 1.267.000,00

**Empenhado:** R\$ 1.127.881,80

**Liquidado:** R\$ 94.495,71


**Pago:** R\$ 94.495,71

% de liquidação: 7,5%

**Endereço:** R. Brás Lourenço, 333 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04113-110

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana







#### 22. Casa de Cultura Vila Guilherme

Projeto Executivo de restauro

anitale CIDA



**Ação:** Projeto Executivo de restauro

Status: Em Execução

52,5% de execução

**Processo:** 6025.2022/0003748-1

**Início:** 01/04/2023

Previsão de término: novembro/2024

**Valor:** R\$ 227.600,00

**Empenhado:** R\$ 222.990,73

**Liquidado:** R\$ 52.465,44

**Pago:** R\$ 52.465,44

% de liquidação: 23,1%

**Endereço:** Praça Oscar Silva, s/nº

Distrito: Vila Guilherme

Subprefeitura: Vila Maria-Vila Guilherme











#### 24. Biblioteca Brito Broca

COLUITO

Projeto executivo para requalificação

**Ação:** Projeto executivo para requalificação

*Status*: Aguardando Autorizações/Aprovações

**Processo:** 6025.2024/0015470-8

**Valor:** R\$ 1.000,00

**Empenhado:** R\$ 722.942,96

Liquidado: -


Pago: -

% de liquidação: 00,00%


**Endereço:** Avenida Mutinga, 1425

**Distrito:** São Domingos

Subprefeitura: Pirituba/Jaraguá

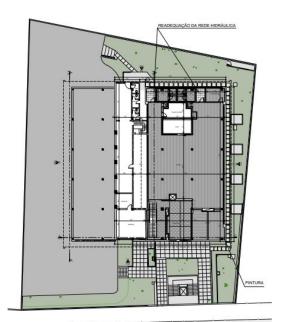



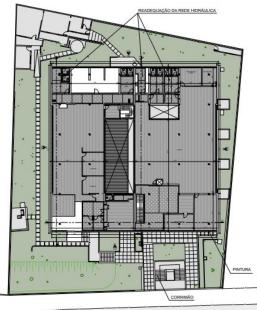





CIDADE SÃO PAI

Serviços corretivos de AVCB - CMAR

**Ação:** Serviços corretivos de AVCB - CMAR

Status: Em Execução/Obra

**Processo:** 6025.2023/0024465-9

**Início da obra:** 14/05/2024

Previsão de término: setembro/2024

**Valor:** R\$ 58.000,00

**Empenhado:** R\$ 48.789,39

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 -

Bom Retiro, São Paulo - SP, 01124-060

**Distrito:** Bom Retiro



# 39. Arquivo Histórico Municipal

pitala CIDADE SÃO PA

Instalação de linha de vida

Ação: Instalação de linha de vida

*Status:* Aguardando autorizações/aprovações

**Processo:** 6025.2023/0030077-0

**Valor:** R\$ 215.171,97

**Empenhado:** R\$ 127.500,00

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

**Endereço:** Praça Cel. Fernando Prestes, 152 -

Bom Retiro, São Paulo - SP, 01124-060

**Distrito:** Bom Retiro



#### 40. Sítio da Ressaca

Pagamento de Despesa do Exercício Anterior

**Ação:** Pagamento de Despesa do Exercício Anterior

Status: Finalizado

**Processo:** 6025.2023/0025407-7

**Valor:** R\$ 27.750,96

**Empenhado:** R\$ 27.750,96

**Liquidado:** R\$ 27.750,96

**Pago:** R\$ 27.750,96

% de liquidação: 100%

**Endereço:** Rua Nadra Raffoul Mokodsi, 3 - Jabaquara, São Paulo - SP, 04321-020

**Distrito:** Jabaquara

**Subprefeitura**: Jabaquara





