



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
CULTURA

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO – FUNDURB

PRESTAÇÃO DE CONTAS - 2024

Planilha e Relatório Fotográfico

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por item do plano aprovado

Prestação de contas do FUNDURB (98.25)

Execução orçamentária por dotação

| DOTAÇÃO | Solicitado (R\$) | Execução orçamentária 2024 | | | |
|--|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | Reservado (R\$) | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) |
| 98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | R\$ 18.680.371,31 | R\$ 17.450.183,26 | R\$ 17.065.983,26 | R\$ 4.121.544,38 | R\$ 4.121.544,38 |
| 98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1 | R\$ 27.750,96 | R\$ 27.750,96 | R\$ 27.750,96 | R\$ 27.750,96 | R\$ 27.750,96 |
| 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1 | R\$ 1.900.000,00 | R\$ 188.047,78 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0 | R\$ 1.213.052,91 | R\$ 1.213.052,91 | R\$ 1.213.052,91 | R\$ 603.838,31 | R\$ 603.838,31 |
| 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | R\$ 17.102.238,00 | R\$ 16.942.267,93 | R\$ 8.654.691,42 | R\$ 3.446.982,22 | R\$ 3.395.010,77 |
| 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1 | R\$ 23.054.670,57 | R\$ 13.957.569,51 | R\$ 2.149.782,51 | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| 98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0 | R\$ 400.000,00 | R\$ 34.000,00 | R\$ 34.000,00 | R\$ 34.000,00 | R\$ 34.000,00 |
| 98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0 | R\$ 5.359.782,00 | R\$ 5.345.942,54 | R\$ 5.345.942,54 | R\$ 5.345.942,54 | R\$ 5.345.942,54 |
| 98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1 | R\$ 2.259.134,25 | R\$ 2.259.134,25 | R\$ 2.259.134,25 | R\$ 689.223,13 | R\$ 689.223,13 |
| 98.25.13.392.3020.5.426.44905100.08.1.759.0402.0 | - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| | R\$ 70.000.000,00 | R\$ 57.417.949,14 | R\$ 36.750.337,85 | R\$ 14.269.281,54 | R\$ 14.217.310,09 |
| | | 82,03% | 52,50% | 20,38% | 20,31% |

*Os dados utilizados são referentes aos Relatórios de Empenho detalhado do SOF atualizados em 07/11/2024.

Atualizado em: 07/11/2024 às 14h49

| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Dotação orçamentária | Rateio | Valor | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC |
|------|-------------------------------|---|---------------------|---------------------------------------|--|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 1 | Centro Cultural São Paulo | Reforma das Fachadas | 6025.2023/0002933-2 | 4. em execução/obra | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 3.875.840,51 | R\$ 3.858.585,06 | R\$ 1.841.508,52 | R\$ 1.841.508,52 | 47,5% |
| 1 | Centro Cultural São Paulo | Reforma em imóvel tombado - Medidas de Segurança | 6025.2021/0003800-1 | 1. em desenvolvimento | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 56.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 1 | Centro Cultural São Paulo | Reforma de manutenção predial - cobertura zenital | 6025.2024/0014937-2 | 3. aguardando autorizações/aprovações | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.394.249,93 | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 1 | Centro Cultural São Paulo | Reforma de manutenção predial - impermeabilizações | 6025.2024/0014973-9 | 3. aguardando autorizações/aprovações | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 750.000,00 | R\$ 1.382.966,96 | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 2 | Casa de Cultura Cidade Ademar | Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar | 6025.2022/0018097-7 | 4. em execução/obra | 98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 5.359.782,00 | R\$ 5.345.942,54 | R\$ 5.345.942,54 | R\$ 5.345.942,54 | 99,7% |
| 2 | Casa de Cultura Cidade Ademar | Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar | 6025.2022/0018097-7 | 4. em execução/obra | 98.25.13.392.3001.5.425.44905100.08.1.759.0402.1 | 1 | R\$ 2.753.606,27 | R\$ 2.259.134,25 | R\$ 689.223,13 | R\$ 689.223,13 | 25,0% |
| 3 | Sítio Mirim | Reconstrução da Casa-Sede | 6025.2020/0016806-0 | 4. em execução/obra | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 3.500.000,00 | R\$ 2.539.459,99 | R\$ 95.872,80 | R\$ 95.872,80 | 2,7% |
| 4 | Sítio Morrinhos | Restauo, segurança contra incêndio e acessibilidade | 6025.2022/0022026-0 | 4. em execução/obra | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 1.500.000,00 | R\$ 278.816,14 | R\$ 278.816,14 | 18,6% |
| 5 | Centro Cultural Penha | Serviços Corretivos para AVCB | 6025.2018/0009114-4 | 4. em execução/obra | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 339.779,82 | R\$ 211.536,40 | R\$ 169.296,13 | R\$ 169.296,13 | 49,8% |
| 6 | Teatro João Caetano | Reforma geral para Acessibilidade. | 6025.2022/0011336-6 | 4. em execução/obra | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 8.533.266,05 | R\$ 4.719.658,21 | R\$ 1.548.888,70 | R\$ 1.548.888,70 | 18,2% |

| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Dotação orçamentária | Rateio | Valor | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC |
|------|--|---|---------------------|--------------------------|--|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| 7 | Edifício Sampaio Moreira | 3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo | 6025.2023/0016820-0 | 4. em execução/obra | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 886.218,35 | R\$ 585.775,61 | R\$ 230.888,10 | R\$ 230.888,10 | 26,1% |
| 8 | Casa de Cultura Parelheiros | Manutenção Predial | 6025.2023/0015198-7 | 4. em execução/obra | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 806.281,88 | R\$ 347.516,67 | R\$ 346.827,11 | R\$ 346.827,11 | 43,0% |
| 9 | Escola Escola Municipal de Iniciação Artísticas - EMIA | Restauro e reforma | 6025.2023/0012495-5 | 2. processo SEI iniciado | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 450.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 10 | Praça das Artes | 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos | 8510.2022/0000503-4 | 4. em execução/obra | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 3.803.543,67 | R\$ 2.703.326,18 | R\$ 1.351.730,92 | R\$ 1.351.730,92 | 35,5% |
| 10 | Praça das Artes | 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos | 8510.2022/0000503-4 | 4. em execução/obra | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1 | 1 | R\$ 2.149.782,51 | R\$ 2.149.782,51 | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 10 | Praça das Artes | 3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes | 8510.2022/0000503-4 | 4. em execução/obra | 98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 603.838,31 | R\$ 603.838,31 | R\$ 603.838,31 | R\$ 603.838,31 | 100,0% |
| 10 | Praça das Artes | 4ª fase - obras complementares do prédio dos corpos artísticos | 8510.2024/0000577-1 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1 | 1 | R\$ 16.864.903,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 10 | Praça das Artes | 4ª fase - gerenciamento e fiscalização das obras complementares do prédio dos corpos artísticos | 8510.2024/0000577-1 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44903900.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 609.214,60 | R\$ 609.214,60 | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 11 | Memorial dos Afilitos | Implantação do Memorial | 6025.2019/0015893-3 | 0. em planejamento | 98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 366.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 11 | Memorial dos Afilitos | Sondagem e Parecer de fundações para implantação de Edifício do Memorial dos Afilitos. | 6025.2023/0014412-3 | 6. finalizado | 98.25.13.391.3001.5.421.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 34.000,00 | R\$ 34.000,00 | R\$ 34.000,00 | R\$ 34.000,00 | 0,0% |

Atualizado em: 07/11/2024 às 14h49

| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Dotação orçamentária | Rateio | Valor | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC |
|------|---|--|---------------------|---------------------|--|--------|------------------|------------------|-----------------|----------------|---|
| | | dos Afilitos. | | | | | | | | | |
| 12 | Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso | Serviços Civis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança | 6025.2023/0005660-7 | 4. em execução/obra | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 475.000,00 | R\$ 398.445,44 | R\$ 367.358,67 | R\$ 367.358,67 | 77,3% |
| 12 | Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso | Serviços corretivos de AVCB | 6025.2022/0011088-0 | 6.finalizado | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 663.256,69 | R\$ 663.256,69 | R\$ 663.256,69 | R\$ 663.256,69 | 100,0% |
| 13 | Biblioteca Chácara do Castelo | Requalificação | 6025.2023/0017795-1 | 4. em execução/obra | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 1.311.875,00 | R\$ 1.100.205,62 | R\$ 548.512,70 | R\$ 496.541,25 | 41,8% |
| 14 | Teatro Cacilda Becker | Reforma e manutenção predial | 6025.2021/0012695-4 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 259.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 15 | Casa de Cultura São Mateus | Construção de Novo Edifício | 6025.2024/0023689-5 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 1.000.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 16 | Casa de Cultura Vila Guilherme | Obra de Restauo | Sem processo 2 | 0. em planejamento | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 16 | Casa de Cultura Vila Guilherme | Projeto executivo de restauro | 6025.2022/0003748-1 | 4. em execução/obra | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 359.149,67 | R\$ 222.990,73 | R\$ 76.780,73 | R\$ 76.780,73 | 21,4% |
| 17 | Biblioteca Mário de Andrade | Projeto de AVCB | 6025.2018/0015645-9 | 0. em planejamento | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 81.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 17 | Biblioteca Mário de Andrade | Restauo da calçada | 6025.2022/0023974-2 | 0. em planejamento | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 100.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 18 | Monumento | Restauo da Fonte Monumental | 6025.2023/0037747-0 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 716.928,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 19 | Monumento à Independência | Restauo | 6025.2024/0013810-9 | 0. em planejamento | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.1 | 1 | R\$ 2.500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 20 | Arquivo Histórico Municipal | Serviços corretivos de AVCB - CMAR | 6025.2023/0024465-9 | 4. em execução/obra | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 58.000,00 | R\$ 48.789,39 | R\$ 48.789,39 | R\$ 48.789,39 | 84,1% |

| Atualizado em: 07/11/2024 às 14h49 | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|--|--------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---|--|
| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Dotação orçamentária | Rateio | Valor | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC | |
| 20 | Arquivo Histórico Municipal | Instalação de linha de vida | 6025.2023/0030077-0 | 3. aguardando autorizações/aprovações | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 215.171,97 | R\$ 127.500,00 | R\$ - | R\$ - | 0,0% | |
| 21 | Casa Amarela | Projeto executivo e obra de restauro e requalificação | Sem processo 3 | 0. em planejamento | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 104.758,82 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% | |
| 21 | Casa Amarela | Gerenciamento e fiscalização de projeto e obra de restauro e requalificação | 6025.2023/0007211-4 | 0. em planejamento | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% | |
| 22 | Sítio da Ressaca | Pagamento de Despesa do Exercício Anterior | 6025.2023/0025407-7 | 4. em execução/obra | 98.25.13.391.3001.5.957.44909200.08.1.759.0402.1 | 1 | R\$ 27.750,96 | R\$ 27.750,96 | R\$ 27.750,96 | R\$ 27.750,96 | 100,0% | |
| 23 | Centro Cultural Tendal da Lapa | Levantamento de edificações e terreno | 6025.2023/0034072-0 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 9 | R\$ 52.250,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% | |
| 24 | Biblioteca Pedro Nava | Levantamento de edificações e terreno | 6025.2023/0034072-0 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 9 | R\$ 27.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% | |
| 25 | Escola Municipal de Iniciação Artística - Perus | Levantamento de edificações e terreno | 6025.2023/0034072-0 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 9 | R\$ 18.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% | |
| 26 | Casa de Cultura Itaim Paulista | Levantamento de edificações e terreno | 6025.2023/0034072-0 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 9 | R\$ 12.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% | |
| 27 | Casa de Cultura Hip-Hop Sul | Levantamento de edificações e terreno | 6025.2023/0034072-0 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 9 | R\$ 4.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% | |
| 28 | Casa do Caxingui | Levantamento de edificações e terreno | 6025.2023/0034072-0 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 9 | R\$ 22.150,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% | |
| 29 | Biblioteca Ricardo Ramos | Levantamento de edificações e terreno | 6025.2023/0034072-2 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 9 | R\$ 26.050,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% | |

Atualizado em: 07/11/2024 às 14h49

| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Dotação orçamentária | Rateio | Valor | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC |
|------|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--|--------|----------------|------------------|-----------------|------------|---|
| 30 | Biblioteca Cassiano Ricardo | Reforma e manutenção predial | Sem processo 4 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 31 | Biblioteca Brito Broca | Reforma e manutenção predial | 6025.2024/0015470-8 | 3. aguardando autorizações/aprovações | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 722.942,96 | R\$ 722.824,10 | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 32 | Casaão Celso Garcia | Fechamento da edificação | 6025.2022/0029462-0 | 2. processo SEI iniciado | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 120.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 33 | Biblioteca Padre José de Anchieta | Levantamento de edificações e terreno | 6025.2023/0034072-0 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 9 | R\$ 5.150,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 33 | Biblioteca Padre José de Anchieta | Levantamento e Projeto executivo | Sem processo 5 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 120.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 34 | Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda | Levantamento de edificações e terreno | 6025.2023/0034072-0 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 9 | R\$ 76.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 34 | Biblioteca Sérgio Buarque de Holanda | Reforma e manutenção predial | Sem processo 8 | 0. em planejamento | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 750.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 35 | Biblioteca Roberto Santos | Reforma e manutenção predial | 6025.2024/0017170-0 | 2. processo SEI iniciado | 98.25.13.391.3001.5.957.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 686.007,38 | R\$ 686.007,38 | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 36 | Biblioteca Castro Alves | Reforma e manutenção predial | 6025.2024/0026619-0 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 500.000,00 | R\$ 1.040.974,04 | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 37 | Biblioteca Arnaldo Magalhães Giacomini | Reforma e manutenção predial | Sem processo 7 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 250.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 38 | Biblioteca Aureliano Leite | Reforma e manutenção predial | 6025.2024/0023990-8 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 500.000,00 | R\$ 229.975,70 | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 39 | Casa de Cultura da Brasilândia | Reforma e manutenção predial | 6025.2024/0026807-0 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 337.500,00 | R\$ 1.236.630,58 | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 40 | Biblioteca Milton Santos | Reforma e manutenção predial | Sem processo 11 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |

Atualizado em: 07/11/2024 às 14h49

| Item | Equipamento cultural | Ação | Processo | Status | Dotação orçamentária | Rateio | Valor | Empenhado (R\$) | Liquidado (R\$) | Pago (R\$) | % do liquidado do valor aprovado no último plano da SMC |
|------|-------------------------------|---|-----------------|--------------------|--|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| 40 | Biblioteca Milton Santos | Reforma e manutenção predial | Sem processo 11 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 41 | Biblioteca Vinicius de Moraes | Reforma e manutenção predial | Sem processo 12 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 42 | Biblioteca Clarice Lispector | Reforma e manutenção predial | Sem processo 13 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 250.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 43 | Casa de Cultura Perus | Projeto executivo para construção de Casa de Cultura em Perus | Sem processo 14 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1 | 1 | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 44 | Casa de Cultura Pirituba | Construção de Casa de Cultura em Pirituba | Sem processo 15 | 0. em planejamento | 98.25.13.392.3001.5.960.44905100.08.1.759.0402.1 | 1 | R\$ 1.400.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 45 | Manutenção de dotação | Construção e Implantação de Espaços Lúdicos e Educativos | Sem processo 16 | 9. Pausado | 98.25.13.392.3001.5.400.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 46 | Manutenção de dotação | Preservação do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Arqueológico | Sem processo 17 | 9. Pausado | 98.25.13.391.3001.5.957.44903900.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| 47 | Manutenção de dotação | Construção de Equipamentos Culturais | Sem processo 18 | 9. Pausado | 98.25.13.392.3001.5.959.44905100.08.1.759.0402.0 | 1 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 0,0% |
| | | | | | | | R\$ 70.000.000,00 | R\$ 36.750.337,85 | R\$ 14.269.281,54 | R\$ 14.217.310,09 | 20,38% |

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma das Fachadas

Ação: Reforma das Fachadas

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0002933-2

Início da obra: 17/06/2024

Previsão de término: março/2025

Valor: R\$ 3.875.840,51

Empenhado: R\$ 3.858.585,06

Liquidado: R\$ 1.841.508,52

Pago: R\$ 1.841.508,52

% de liquidação: 47,5%


Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé




REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO

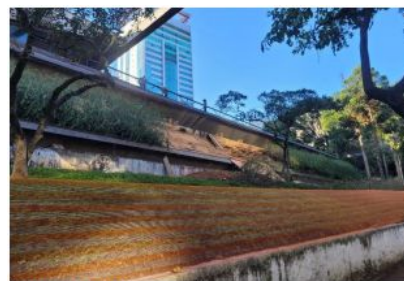

TELA TAPUME



TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO

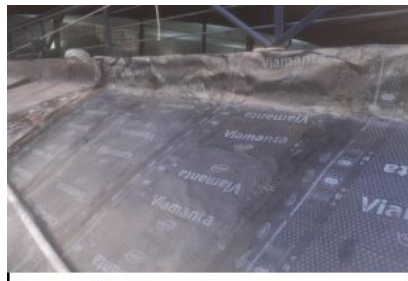

INSTALAÇÃO DE MANTA ASFALTICA



REMOÇÃO DE MANTA E REGULARIZAÇÃO DE BASE



DEMOLIÇÕES DIVERSAS

Fotos do período de 17/06/2024 a 16/07/2024

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial - cobertura zenital

Ação: Reforma de manutenção predial

Status: Aguardando autorizações/aprovações

Processo: 6025.2024/0014937-2

Início da obra: 07/10/2024

Valor: R\$ 1.500.000,00

Empenhado: R\$ 1.394.249,93

Liquidado: -


Pago: -

% de liquidação: 00,00%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé

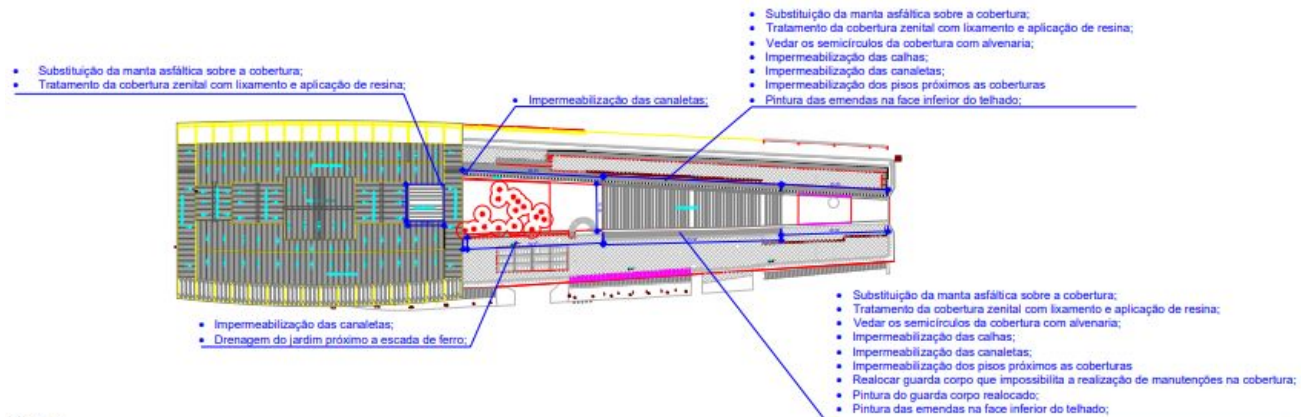

1. Centro Cultural São Paulo

Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

Ação: Reforma de manutenção predial - impermeabilizações

Status: Aguardando autorizações/aprovações

Processo: 6025.2024/0014973-9

Início da obra: 30/09/2024

Valor: R\$ 750.000,00

Empenhado: R\$ 1.382.966,96

Liquidado: -


Pago: -

% de liquidação: 00,00%

Endereço: Rua Vergueiro, 1000

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé

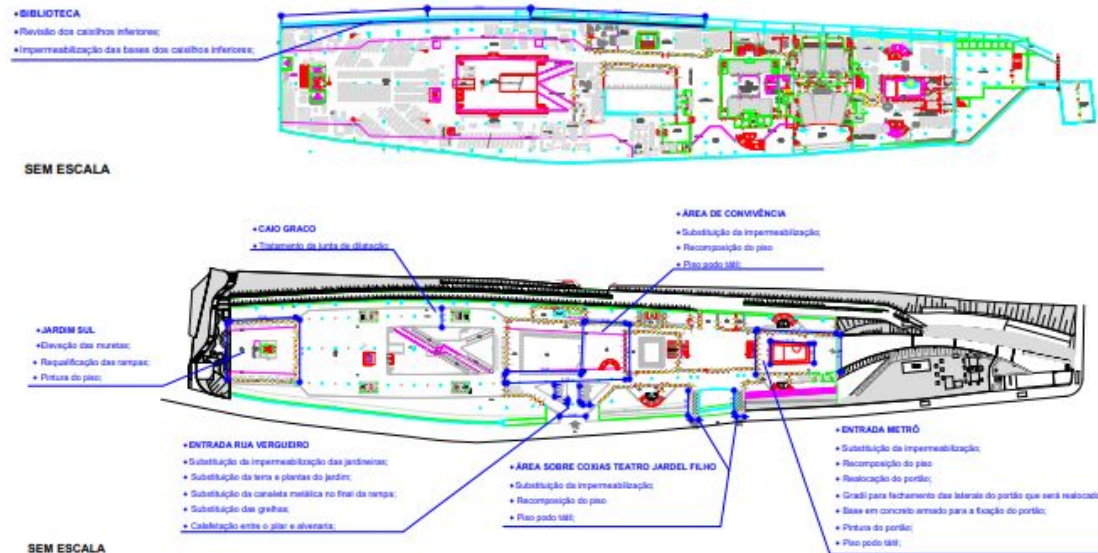

2. Casa de Cultura Cidade Ademar

Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Ação: Implantação da Casa de Cultura Cidade Ademar

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2022/0018097-7

Início da obra: 19/12/2022

Previsão de término: outubro/2024

Valor: R\$ 8.113.388,27

Empenhado: R\$ 7.605.076,79

Liquidado: R\$ 6.035.165,67

Pago: R\$ 6.035.165,67

% de liquidação: 74,38%

Endereço: Avenida Durval Pinto Ferreira, 820

Distrito: Cidade Ademar

Subprefeitura: Cidade Ademar



3. Sítio Mirim

Reconstrução da Casa-Sede

Ação: Reconstrução da Casa-Sede

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2020/0016806-0

Início da obra: 03/06/2024

Previsão de término: fevereiro/2026

Valor: R\$ 3.500.000,00

Empenhado: R\$ 2.539.459,99

Liquidado: R\$ 95.872,80


Pago: R\$ 95.872,80

% de liquidação: 2,7%

Endereço: Rua Dr. Assis Ribeiro, s/n - Esquina
c/ Rua Urutu

Distrito: Vila Jacuí

Subprefeitura: São Miguel Paulista

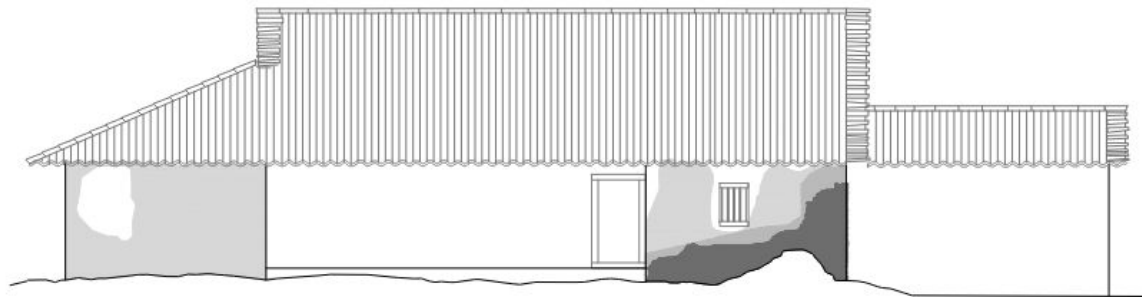

4. Sítio Morrinhos

Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

Ação: Restauro, segurança contra incêndio e acessibilidade

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2022/0022026-0

Início da obra: 29/05/2024

Previsão de término: abril/2025

Valor: R\$ 1.500.000,00

Empenhado: R\$ 1.500.000,00

Liquidado: R\$ 278.816,14

Pago: R\$ 278.816,14

% de liquidação: 18,6%

Endereço: Rua Santo Anselmo, 102

Distrito: Casa Verde

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha



Fotos do período de 29/05/2024 a 30/06/2024

5. Centro Cultural Penha

Serviços Corretivos para AVCB

Ação: Serviços Corretivos para AVCB

Status: Em Execução

Processo: 6025.2018/0009114-4

Início dos serviços: 16/10/2023

Previsão de término: outubro/2024

Valor: R\$ 339.779,82

Empenhado: R\$ 211.536,40

Liquidado: R\$ 169.296,13



Pago: R\$ 169.296,13

% de liquidação: 49,8%

Endereço: Largo do Rosário, 20

Distrito: Penha

Subprefeitura: Penha

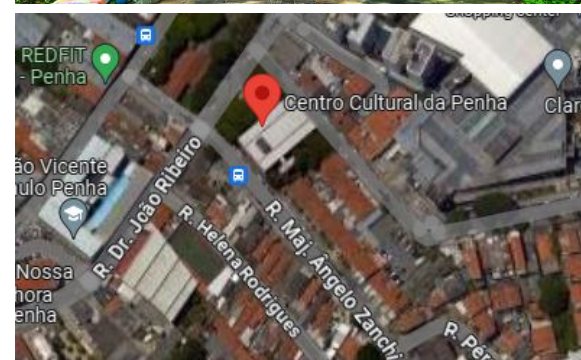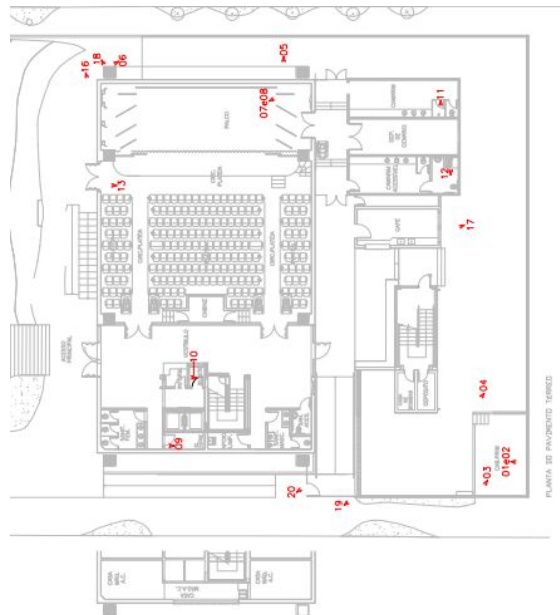

6. Teatro João Caetano

Reforma geral para Acessibilidade, Segurança contra incêndio,
Conservação e Restauro.

Ação: Reforma geral para Acessibilidade,
Segurança contra incêndio, Conservação e
Restauro

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2022/0011336-6

Início da obra: 19/12/2022

Previsão de término: junho/2025

Valor: R\$ 8.533.266,05

Empenhado: R\$ 4.719.658,21

Liquidado: R\$ 1.548.888,70

Pago: R\$ 1.548.888,70

% de liquidação: 18,2%

Endereço: Rua Borges Lagoa, 650

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana



Fotos do período de 01/06/2024 a 30/06/2024

7. Edifício Sampaio Moreira

3ª Fase de Obras de restauro - Fase Piso Térreo

Ação: 3ª Fase de Obras de restauro -
Fase Piso Térreo

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0016820-0

Início da obra: 02/10/2023

Previsão de término: dezembro/2024

Valor: R\$ 886.218,35

Empenhado: R\$ 585.775,61

Liquidado: R\$ 230.888,10

Pago: R\$ 230.888,10

% de liquidação: 26,1%

Endereço: R. Líbero Badaró, 346

Distrito: Sé

Subprefeitura: Sé



8. Casa de Cultura Parelheiros

Manutenção Predial

Ação: Manutenção Predial

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0015198-7

Início da obra: 02/10/2023

Previsão de término: dezembro/2024

Valor: R\$ 806.281,88

Empenhado: R\$ 347.516,67

Liquidado: R\$ 346.827,11


Pago: R\$ 346.827,11

% de liquidação: 43,0%

Endereço: Rua Nazle Mauad Lufti, 169

Distrito: Parelheiros

Subprefeitura: Parelheiros

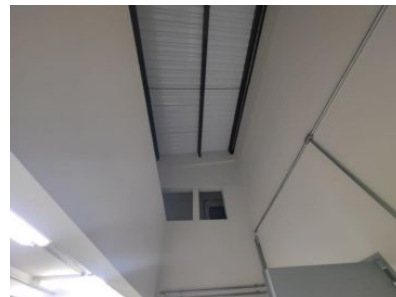

Fotos do período de 01/03/2024 a 02/05/2024

10. Praça das Artes

3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Ação: 3ª fase - Obras complementares dos corpos artísticos

Status: Em Execução/Obra

Processo: 8510.2022/0000503-4

Início da obra: 23/01/2023

Previsão de término: setembro/2024

Valor: R\$ 5.953.326,18

Empenhado: R\$ 4.853.108,69

Liquidado: R\$ 1.351.730,92

Pago: R\$ 1.351.730,92

% de liquidação: 22,7%

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé



Fotos tiradas em: 19/04/2023



10. Praça das Artes

3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Ação: 3ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Status: Em Execução/Obra

Processo: 8510.2022/0000503-4

Início da obra: 23/01/2023

Previsão de término: setembro/2024

Valor: R\$ 603.838,31

Empenhado: R\$ 603.838,31

Liquidado: R\$ 603.838,31

Pago: R\$ 603.838,31

% de liquidação: 100,00%

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé



Fotos tiradas em: 19/04/2023



10. Praça das Artes

4ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Ação: 4ª fase - Gerenciamento e fiscalização de obra - Praça das Artes

Status: Em planejamento/licitação

Processo: 8510.2024/0000577-1

Valor: R\$ 609.214,60

Empenhado: R\$ 609.214,60

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Avenida São João, 281

Distrito: República

Subprefeitura: Sé



Fotos tiradas em: 19/04/2023

11. Memorial dos Aflitos

Sondagem e Parecer de fundações para implantação de Edifício do Memorial dos Aflitos.

Ação: Implantação do Memorial

Status: Finalizado

Processo: 6025.2023/0014412-3

Início dos serviços: 18/03/2024

Término: abril/2024

Valor: R\$ 34.000,00

Empenhado: R\$ 34.000,00

Liquidado: R\$ 34.000,00

Pago: R\$ 34.000,00

% de liquidação: 100%

Endereço: Rua dos Aflitos, 70 -
Traves. Rua dos Estudantes - alt. nº
52

Distrito: Liberdade

Subprefeitura: Sé



Fotos abril/2024.

12. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança

Ação: Serviços Cíveis de Adequação hidráulica e instalação de sala de dança + Serviços corretivos de AVCB

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0005660-7

Início dos serviços: 15/12/2023

Previsão de término: outubro/2024

Valor: R\$ 475.000,00

Empenhado: R\$ 398.445,44

Liquidado: R\$ 367.358,67


Pago: R\$ 367.358,67

% de liquidação: 77,3%

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

Distrito: Vila Nova Cachoeirinha

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

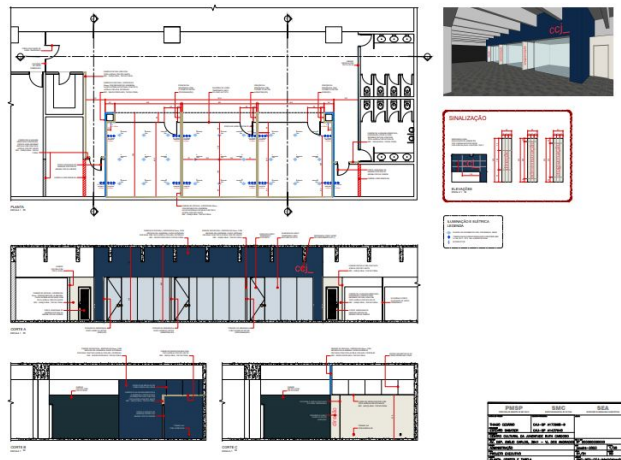

12. Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso

Serviços corretivos de AVCB - Aplicação de CMAR

Ação: Serviços corretivos de AVCB - Aplicação de CMAR

Status: Finalizado

Processo: 6025.2022/0011088-0

Início dos serviços: 01/02/2024

Término: junho/2024

Valor: R\$ 663.256,69

Empenhado: R\$ 663.256,69

Liquidado: R\$ 663.256,69


Pago: R\$ 663.256,69

% de liquidação: 100%

Endereço: Av. Dep. Emílio Carlos, 3641 - Vila dos Andrades, São Paulo - SP, 02721-200

Distrito: Vila Nova Cachoeirinha

Subprefeitura: Casa Verde/Cachoeirinha

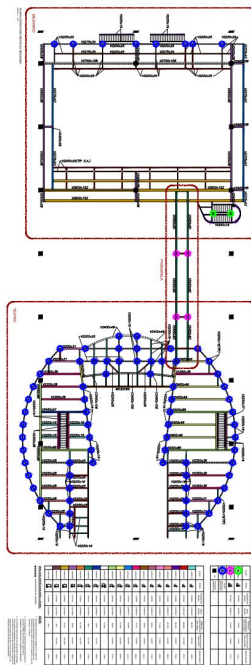

13. Biblioteca Chácara do Castelo

Requalificação

Ação: Requalificação

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0017795-1

Início da obra: 27/11/2023

Previsão de término: setembro/2024

Valor: R\$ 1.311.875,00

Empenhado: R\$ 1.100.205,62

Liquidado: R\$ 548.512,70


Pago: R\$ 496.541,25

% de liquidação: 41,8%

Endereço: R. Brás Lourenço, 333 - Vila Mariana, São Paulo - SP, 04113-110

Distrito: Vila Mariana

Subprefeitura: Vila Mariana

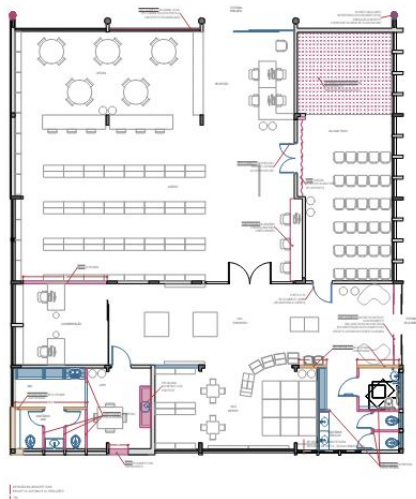

16. Casa de Cultura Vila Guilherme

Projeto Executivo de restauro

Ação: Projeto Executivo de restauro

Status: Em Execução

Processo: 6025.2022/0003748-1

Início: 01/04/2023

Previsão de término: novembro/2024

Valor: R\$ 359.149,67

Empenhado: R\$ 222.990,73

Liquidado: R\$ 76.780,73




Pago: R\$ 76.780,73

% de liquidação: 21,4%

Endereço: Praça Oscar Silva, s/nº

Distrito: Vila Guilherme

Subprefeitura: Vila Maria/Vila Guilherme

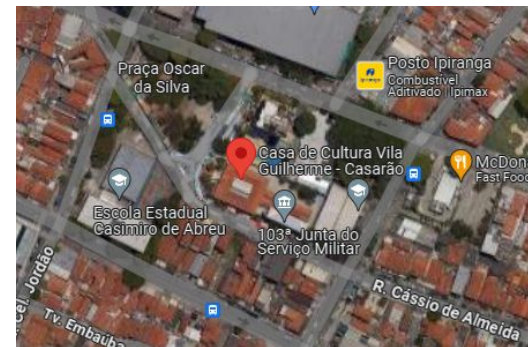

20. Arquivo Histórico Municipal

Serviços corretivos de AVCB - CMAR

Ação: Serviços corretivos de AVCB - CMAR

Status: Em Execução/Obra

Processo: 6025.2023/0024465-9

Início da obra: 14/05/2024

Previsão de término: setembro/2024

Valor: R\$ 58.000,00

Empenhado: R\$ 48.789,39

Liquidado: R\$ 48.789,39

Pago: R\$ 48.789,39

% de liquidação: 84,1%

Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 -
Bom Retiro, São Paulo - SP, 01124-060

Distrito: Bom Retiro

Subprefeitura: Sé



20. Arquivo Histórico Municipal

Instalação de linha de vida

Ação: Instalação de linha de vida

Status: Aguardando autorizações/aprovações

Processo: 6025.2023/0030077-0

Valor: R\$ 215.171,97

Empenhado: R\$ 127.500,00

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: -

Endereço: Praça Cel. Fernando Prestes, 152 -
Bom Retiro, São Paulo - SP, 01124-060

Distrito: Bom Retiro

Subprefeitura: Sé



22. Sítio da Ressaca

Pagamento de Despesa do Exercício Anterior

Ação: Pagamento de Despesa do Exercício Anterior

Status: Finalizado

Processo: 6025.2023/0025407-7

Valor: R\$ 27.750,96

Empenhado: R\$ 27.750,96

Liquidado: R\$ 27.750,96

Pago: R\$ 27.750,96

% de liquidação: 100%

Endereço: Rua Nadra Raffoul Mokodsi, 3 -
Jabaquara, São Paulo - SP, 04321-020

Distrito: Jabaquara

Subprefeitura: Jabaquara



31. Biblioteca Brito Broca

Projeto executivo para requalificação

Ação: Projeto executivo para requalificação

Status: Aguardando Autorizações/Aprovações

Processo: 6025.2024/0015470-8

Valor: R\$ 722.942,96

Empenhado: R\$ 722.824,10

Liquidado: -



Pago: -

% de liquidação: 00,00%

Endereço: Avenida Mutinga, 1425

Distrito: São Domingos

Subprefeitura: Pirituba/Jaraguá

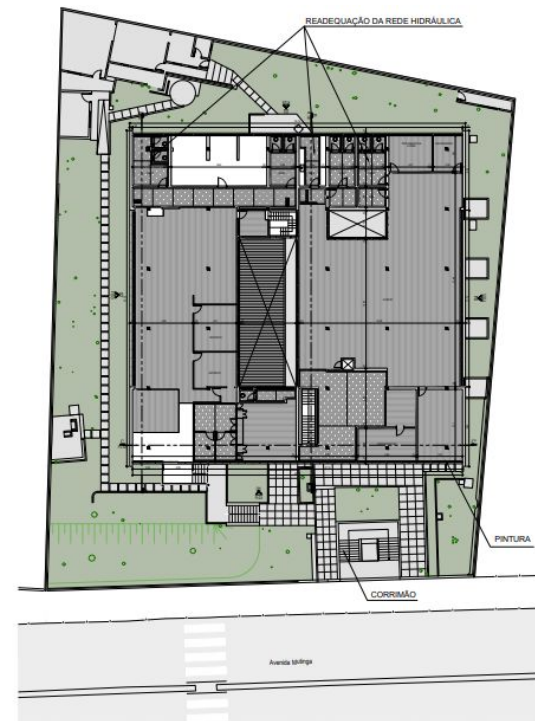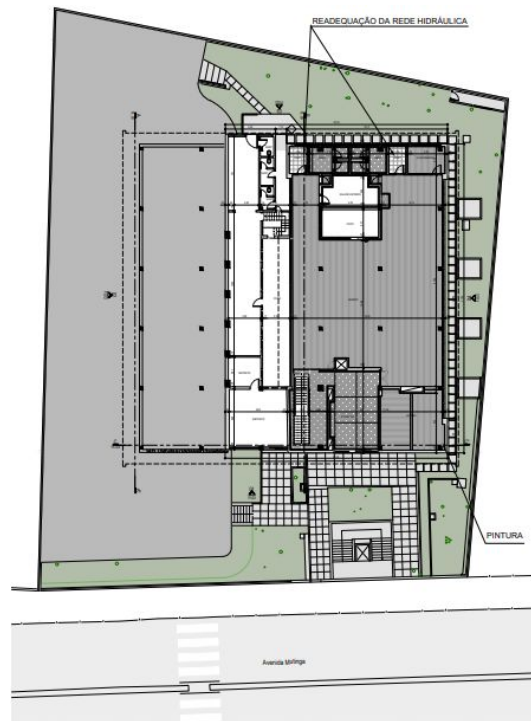

35. Biblioteca Roberto Santos

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Aguardando Autorizações/Aprovações

Processo: 6025.2024/0017170-0

Valor: R\$ 686.007,38

Empenhado: R\$ 686.007,38

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: 00,00%

Endereço: Rua Cisplatina, 505

Distrito: Ipiranga

Subprefeitura: Ipiranga



36. Biblioteca Castro Alves

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em planejamento

Processo: 6025.2024/0026619-0

Valor: R\$ 500.000,00

Empenhado: R\$ 1.040.974,04

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: 00,00%

Endereço: Rua Abrahão Mussa, s/n - Jardim Patente Novo

Distrito: Sacomã

Subprefeitura: Ipiranga



38. Biblioteca Aureliano Leite

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em planejamento

Processo: 6025.2024/0023990-8

Valor: R\$ 500.000,00

Empenhado: R\$ 229.975,70

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: 00,00%

Endereço: Rua Otto Shubart, 196 - Parque São Lucas

Distrito: São Lucas

Subprefeitura: Vila Prudente



39. Casa de Cultura da Brasilândia

Reforma e manutenção predial

Ação: Reforma e manutenção predial

Status: Em planejamento

Processo: 6025.2024/0026807-0

Valor: R\$ 337.500,00

Empenhado: R\$ 1.236.630,58

Liquidado: -

Pago: -

% de liquidação: 00,00%

Endereço: Praça Benedicta Cavalheiro, s/nº -
Freguesia do Ó

Distrito: Freguesia do Ó

Subprefeitura: Freguesia/Brasilândia

