

PLANO CICLOVIÁRIO

Cidade de São Paulo



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Dezembro/2024

NOVAS IMPLANTAÇÕES


de Estruturas Ciclovias



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Dezembro/2024

MAPA CICLOVIÁRIO

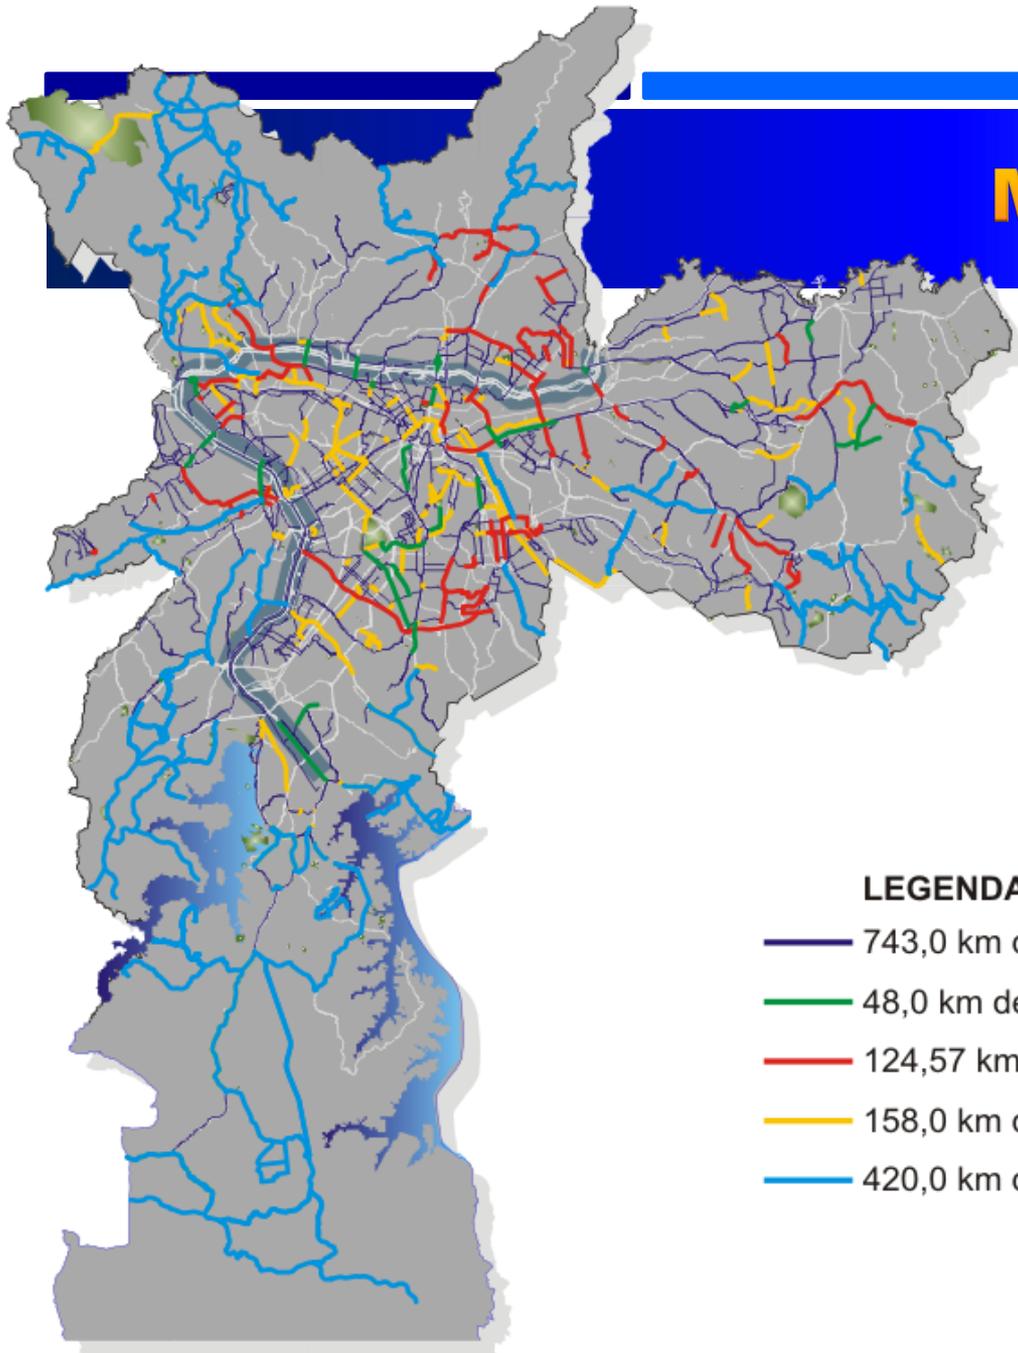

LEGENDA

- 743,0 km de Estruturas Cicloviárias **EXISTENTE**
- 48,0 km de Estruturas Cicloviárias **CONTRATADAS**
- 124,57 km de Estruturas Cicloviárias **PPP COHAB**
- 158,0 km de Estruturas Cicloviárias **EM LICITAÇÃO**
- 420,0 km de Estruturas Cicloviárias **PLANEJADAS/ESTUDO**



REGISTROS FOTOGRÁFICOS

de Atividades



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

CONCORRÊNCIA 02 e 03



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

CONTRATO 03

| CICLOVIA | EXTENSÃO ORIGINAL (m) | EXTENSÃO REVISADA (m) | SITUAÇÃO DA OBRA | TOTAL EXTENSÃO EXECUTADA (m) | SINALIZAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|------------------------|---|
| REPÚBLICA DO LÍBANO | 650,00 | 650,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| DOM PEDRO I | 1.550,00 | 1.650,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| SENA MADUREIRA | 2.865,00 | 2.865,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| VIADUTO BRESSER | 1.090,00 | 1.162,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| RUI BARBOSA / 13 DE MAIO | 2.270,00 | 2.270,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| DONA AVELINA/SANGIRARDI | 1.332,00 | 1.432,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| EDUCADOR PAULO FREIRE | 220,00 | 220,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| MIGUEL YUNES | 1.450,00 | 1.563,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| JOSÉ MARIA WHITAKER | 1.675,00 | 1.675,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| VIADUTO ITINGUÇU | 1.100,00 | 85,61 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| JACU PÊSSEGO | 905,00 | 905,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| NAGIB FARAH MALUF | 2.250,00 | 2.250,00 | CONCLUÍDA | | AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO | |
| JOÃO BATISTA CONTI | 1.600,00 | 1.500,00 | NÃO CONCLUÍDA | | IMPLANTAÇÃO PARCIAL | Aguardando parecer da CET para o trecho entre Av. Nagib F. Maluf e R. Luís Mateus |
| TOTAL | 18.957,00 | 18.227,61 | | 16.727,61 | | |

CONTRATO 04

| CICLOVIA | EXTENSÃO ORIGINAL (m) | EXTENSÃO REVISADA (m) | SITUAÇÃO DA OBRA | TOTAL EXTENSÃO EXECUTADA | SINALIZAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------|---|
| AVENIDA JAGUARÉ | 610,00 | 886,92 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| GASTÃO VIDIGAL | 1.400,00 | 1.696,25 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| PONTE CID. UNIVERSITÁRIA | 485,00 | 980,80 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| TIRADENTES / S. DUMONT | 715,00 | 1.297,33 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| CAMPO DE BAGATELLE | 820,00 | 1.099,95 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| DR. ABRAÃO RIBEIRO | 600,00 | 620,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| RAIMUNDO P. MAGALHÃES | 2.120,00 | 2.120,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| ORDEM E PROGRESSO | 969,00 | 869,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| PONTE FREGUESIA DO Ó | 1.000,00 | 1.966,86 | CONCLUÍDA | | AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO | |
| MUTINGA | 1.531,00 | 1.031,00 | CONCLUÍDA | | AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO | |
| ALVARENGA | 2.425,00 | 1.600,00 | CONCLUÍDA | | AGUARDANDO IMPLANTAÇÃO | |
| PONTE DO JAGUARÉ | 1.500,00 | 1.988,18 | NÃO CONCLUÍDA | | IMPLANTAÇÃO PARCIAL | Contratada notificada a concluir a execução conforme projeto. |
| TOTAL | 14.175,00 | 16.156,29 | | 14.168,11 | | |

CONTRATO 05

| CICLOVIA | EXTENSÃO ORIGINAL (m) | EXTENSÃO REVISADA (m) | SITUAÇÃO DA OBRA | TOTAL EXTENSÃO EXECUTADA | SINALIZAÇÃO | OBSERVAÇÃO |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|-------------|---|
| INDIANÓPOLIS | 3.520,00 | 3.620,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| NAÇÕES UNIDAS I | 1.260,00 | 1.281,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| NAÇÕES UNIDAS II | 807,00 | 807,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| ENGº ALBERTO ZAGOTTIS | 2.866,00 | 1.865,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| ARMANDO ARRUDA PEREIRA | 1.415,00 | 1.515,00 | CONCLUÍDA | | CONCLUÍDA | TERMINADA |
| RADIAL LESTE | 3.044,00 | 3.044,00 | SUSPensa | | | Obra suspensa devido à obra de implantação do BRT Radial Leste pela SIURB |
| CARLOS CALDEIRA FILHO | 2.900,00 | 2.390,42 | SUSPensa | | | Obra suspensa por solicitação da CET, tendo em vista a complexidade operacional da via. |
| TOTAL | 15.812,00 | 14.522,42 | | 9.088,00 | | |



Quadro Resumo

- **Estruturas Executadas e Sinalizadas:** 33.135,86
- **Estruturas Executadas:** 39.983,72



JACU-PÊSSEGO



JOÃO BATISTA CONTI

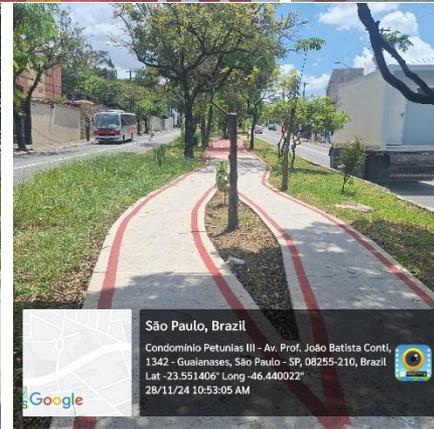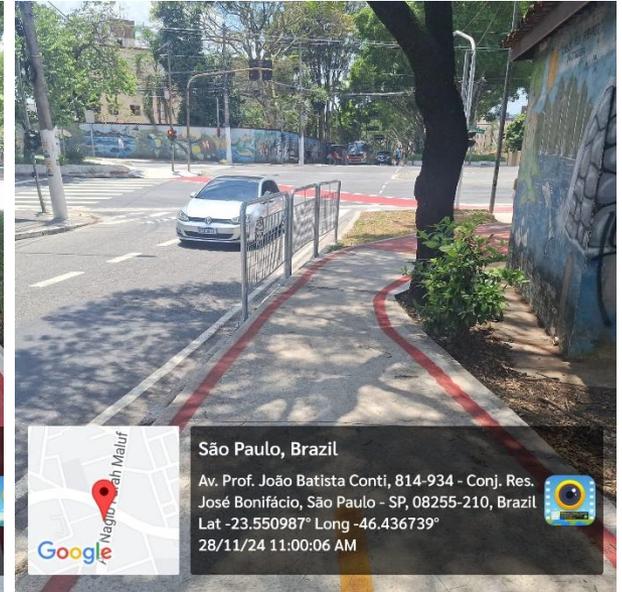

JOÃO BATISTA CONTI

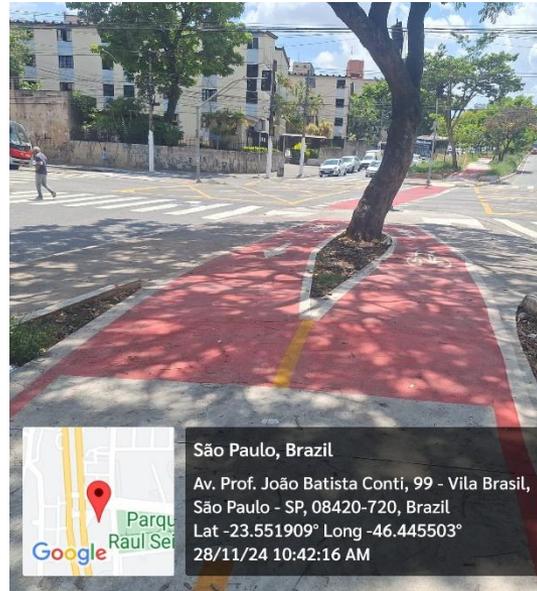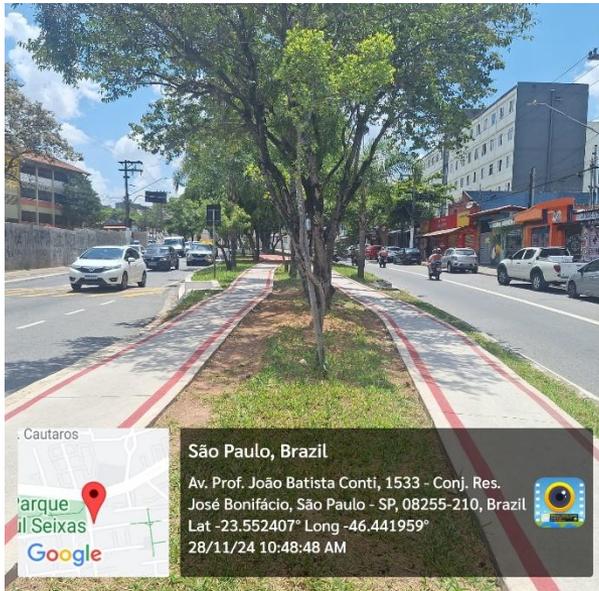


NAGIB FARAH MALUF



São Paulo, Brazil

Av. Nagib Farah Maluf, 1555 - Conj. Res. José Bonifácio, São Paulo - SP, 08253-100, Brazil
Lat -23.539901° Long -46.431709°
28/11/24 11:33:45 AM

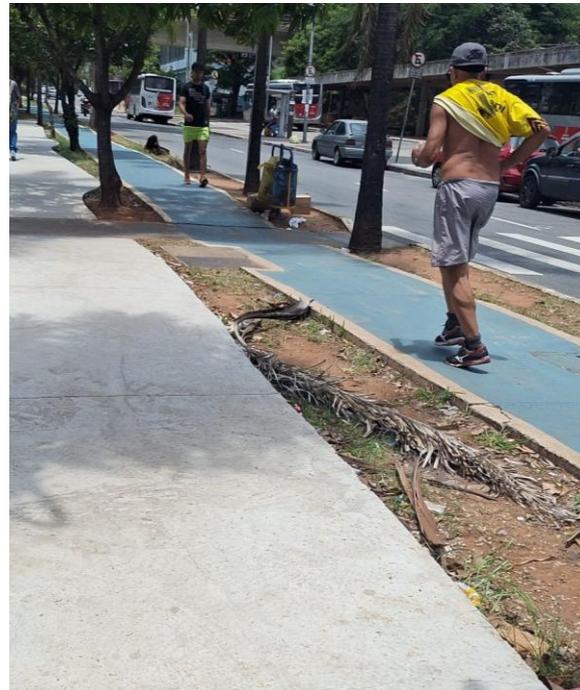

São Paulo, Brazil

José Bonifácio - Av. Nagib Farah Maluf, 1500 - COHAB José Bonifácio, São Paulo - SP, 08255-000, Brazil
Lat -23.539356° Long -46.43144°
28/11/24 11:32:48 AM



São Paulo, Brazil

Av. Um G, 621 - Conj. Res. José Bonifácio, São Paulo - SP, 08490-000, Brazil
Lat -23.541009° Long -46.432384°
28/11/24 11:36:34 AM

ORDEM E PROGRESSO



São Paulo, Brazil

Pte. do Limão, 138 - Várzea da B
São Paulo - SP, 01141-090, Braz
Lat -23.516107° Long -46.6668
21/11/24 11:19:41 AM




Check In **São Paulo,SP,Brazil**
Avenida Ordem E Progresso, Cachoeirinha,
São Paulo, 02518-080, Sp, Brasil
Lat -23.512668, Long -46.666298
11/21/2024 11:33 AM GMT-03:00
Note : Captured by GPS Map Camera



São Paulo, Brazil
Av. Ordem e Progresso, 427 - Jardim das
Laranjeiras, São Paulo - SP, 01142-300, Brazil
Lat -23.513216° Long -46.66636°
21/11/24 11:32:13 AM

ORDEM E PROGRESSO

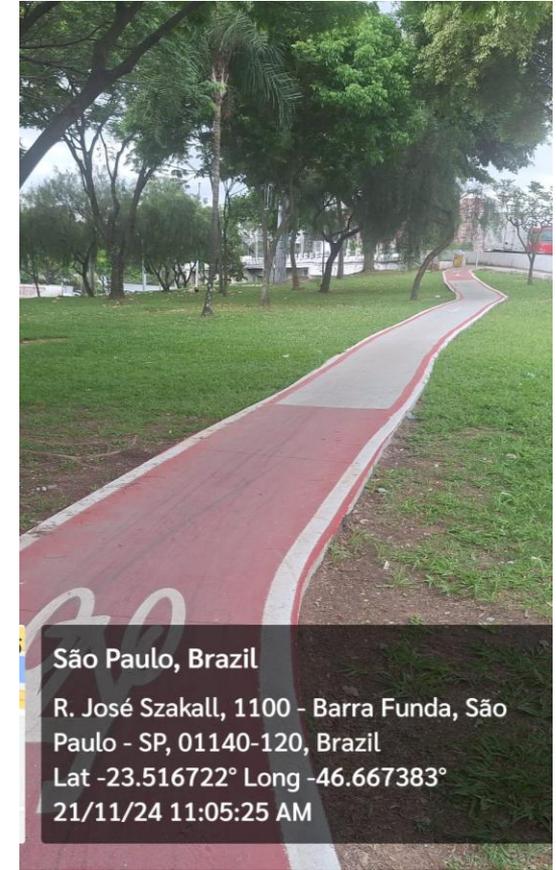


RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES




RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES



São Paulo, Brazil
R. Coração de Bugre, 2 - Vila Barreto, São Paulo - SP, 02945-010, Brazil
Lat -23.484744° Long -46.723168°
19/11/24 10:42:53 AM



São Paulo, Brazil
R. Arcangélica, 1411 - Jardim Cidade Pirituba, São Paulo - SP, 02945-020, Brazil
Lat -23.485919° Long -46.725997°
19/11/24 10:46:45 AM



São Paulo, Brazil
R. Arcangélica, 1678 - Jardim Cidade Pirituba, São Paulo - SP, 02945-020, Brazil
Lat -23.486171° Long -46.726486°
19/11/24 10:49:12 AM



São Paulo, Brazil
Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 6034 - Jardim Cidade Pirituba, São Paulo - SP, 02938-000, Brazil
Lat -23.485984° Long -46.725358°
19/11/24 10:44:02 AM



São Paulo, Brazil
Rua R. Arcangélica - - SP - Jardim Cidade Pirituba, São Paulo - SP, 05140-020, Brazil
Lat -23.48609° Long -46.72651°



São Paulo, Brazil
R. Arcangélica, 32 - Jardim Cidade Pirituba, São Paulo - SP, 02945-020, Brazil
Lat -23.485427° Long -46.725561°



São Paulo, Brazil
Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 6034 - Jardim Cidade Pirituba, São Paulo - SP, 02938-000, Brazil
Lat -23.486248° Long -46.725477°
19/11/24 10:43:10 AM

PPP da HABITAÇÃO



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

SITUAÇÃO DOS LOTES - 1

| LOTE | Estrutura Ciclovitaria | Extensão (m) | Status |
|----------------|--|-----------------|-----------|
| LOTE 01 | Projeto | 0,00 | Concluido |
| LOTE 01 | Viaduto Grande São Paulo | 1200,00 | |
| LOTE 01 | Av. Bandeirantes | 9852,00 | |
| LOTE 01 | Av. Abraão de Morais | 3159,00 | |
| LOTE 01 | Rua Salvador Simões | 910,00 | |
| LOTE 01 | Rua Agostinho Gomes | 1221,00 | Concluido |
| LOTE 01 | Rua Cipriano Barata | 650,00 | OIS |
| LOTE 01 | Rua Manifesto | 1760,00 | OIS |
| LOTE 01 | Rua Cisplatina | 709,00 | OIS |
| LOTE 01 | Rua Antonio Carlos da Fonseca | 2720,00 | Concluido |
| LOTE 01 | Rua Dom Macario | 1540,00 | Em Obras |
| LOTE 01 | Rua Nossa Senhora da Saúde - Trecho I | 930,00 | Concluido |
| LOTE 01 | Rua Nossa Senhora da Saúde - Trecho II | 627,00 | |
| LOTE 01 | Rua José dos Reis | 560,00 | Em Obras |
| LOTE 01 | Rua Amparo | 519,00 | |
| LOTE 01 | Sub Total | 26357,00 | |

SITUAÇÃO DOS LOTES - 5

| LOTE | Estrutura Ciclovitaria | Extensão | Status |
|----------------|-------------------------------|-----------------|-----------|
| LOTE 05 | Projeto | 0,00 | Concluído |
| LOTE 05 | Rua Airton Pretini | 645,00 | OIS |
| LOTE 05 | Rua Apucarana | 1999,00 | Concluído |
| LOTE 05 | Av. Aricanduva | 900,00 | |
| LOTE 05 | Rua Adhemar Pereira de Barros | 965,00 | OIS |
| LOTE 05 | Rua Astarte | 778,00 | Concluído |
| LOTE 05 | Av. Salim Farah Maluf | 910,00 | |
| LOTE 05 | Av. Capitão Pacheco Chaves | 1644,00 | |
| LOTE 05 | Rua Carlos de Campos | 706,00 | Concluído |
| LOTE 05 | Av. Estado | 1614,00 | |
| LOTE 05 | Rua Joao Boemer | 1872,00 | Em Obras |
| LOTE 05 | Pte Tatuapé | 700,00 | Em Obras |
| LOTE 05 | Av. Radial Leste | 2711,00 | |
| LOTE 05 | Rua Ribeiro de Lima | 430,00 | |
| LOTE 05 | Sub Total | 15874,00 | |

SITUAÇÃO DOS LOTES - 7

| LOTE | Estrutura Ciclovitaria | Extensão | Status |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| LOTE 07 | Projeto | 0,00 | Concluído |
| LOTE 07 | Av. Conceição | 1133,00 | |
| LOTE 07 | Av. Guilherme | 220,00 | |
| LOTE 07 | Rua Maria Cândida | 2341,00 | Concluído |
| LOTE 07 | Rua Alberto Byington | 3311,00 | |
| LOTE 07 | Av. Amaro Felicíssimo da Silveira | 1856,00 | |
| LOTE 07 | Av. José Maria Fernandes | 1309,00 | Concluído |
| LOTE 07 | Rua Roland Garros | 1303,00 | |
| LOTE 07 | Rua Jardim Japão | 1416,00 | |
| LOTE 07 | Rua Gueixas | 767,00 | |
| LOTE 07 | Rua Maria José Barone Fernandes | 2420,00 | |
| LOTE 07 | Sub Total | 16076,00 | |

SITUAÇÃO DOS LOTES - 9

| LOTE | Estrutura Ciclovitaria | Extensão | Status |
|----------------|--|-----------------|-----------|
| LOTE 09 | Projeto | 0,00 | Concluído |
| LOTE 09 | Rua Benjamim Mansur | 1297,00 | Concluído |
| LOTE 09 | Av. Corifeu de Azevedo Marques - Trecho I | 1640,00 | Concluído |
| LOTE 09 | Av. Corifeu de Azevedo Marques - Trecho II | 2790,00 | |
| LOTE 09 | Rua José Peres Campelo | 3594,00 | |
| LOTE 09 | Rua Adherbal Stresser | 114,00 | OIS |
| LOTE 09 | Rua Camargo | 532,00 | OIS |
| LOTE 09 | Rua Gal. Asdrúbal da Cunha-T2/R. Maj. W. Carlson | 172,00 | Em Obras |
| LOTE 09 | Rua Sapetuba | 461,00 | |
| LOTE 09 | Rua Waldemar Roberto - ligação | 285,00 | |
| LOTE 09 | Rua Santa Marina | 770,00 | |
| LOTE 09 | Av. Vital Brasil | 1230,00 | Concluído |
| LOTE 09 | Sub Total | 12885,00 | |

SITUAÇÃO DOS LOTES - 10

| LOTE | Estrutura Ciclovitaria | Extensão | Status |
|----------------|-------------------------|-----------------|----------------|
| LOTE 10 | Projeto | 0,00 | Aguardando OIS |
| LOTE 10 | Forte do Leme | 1116,00 | |
| LOTE 10 | Satélite | 1445,00 | |
| LOTE 10 | André de Almeida | 3144,00 | |
| LOTE 10 | Luís Pires de Minas | 1697,00 | |
| LOTE 10 | Manuel dos Santos Braga | 1592,00 | |
| LOTE 10 | Riacho dos Machados | 2305,00 | |
| LOTE 10 | Adriano Bertozzi | 2880,00 | |
| LOTE 10 | Shinzaburo Mizutani | 1945,00 | |
| LOTE 10 | Serra de São Domingos | 2403,00 | |
| LOTE 10 | José Pinheiros Borges | 8450,00 | |
| LOTE 10 | Sub Total | 26977,00 | |

SITUAÇÃO DOS LOTES - 11

| LOTE | Estrutura Ciclovial | Extensão | Status |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| LOTE 11 | Projeto | 0,00 | Concluído |
| LOTE 11 | Av Queiroz Filho | 1155,00 | OIS |
| LOTE 11 | Rua Potsdam | 1137,00 | OIS |
| LOTE 11 | Rua Guaipá | 1654,00 | |
| LOTE 11 | Av Imperatriz Leopoldina | 94,00 | OIS |
| LOTE 11 | Rua Major Paladino | 373,00 | |
| LOTE 11 | Viaduto da Lapa | 697,00 | |
| LOTE 11 | Ponte do Piqueri/Av. Ermano Marchetti | 2221,00 | |
| LOTE 11 | Rua Dronsfield | 1381,00 | |
| LOTE 11 | Av Gastão Vidigal - Mergenthaler | 290,00 | |
| LOTE 11 | Sub Total | 9002,00 | |

SITUAÇÃO DOS LOTES - 12

| LOTE | Estrutura Ciclovitaria | Extensão | Status |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|---------------|
| LOTE 12 | Projeto | 0,00 | Concluido |
| LOTE 12 | Rua Virgília Rodrigues Alves C. Pinto | 1500,00 | Em Obras |
| LOTE 12 | Rua Santa Inês | 1886,00 | OIS |
| LOTE 12 | Rua Maria Amália Lopes de Azevedo | 4703,00 | Em Obras |
| LOTE 12 | Rua Antonio Cesar Neto | 780,00 | Em Obras |
| LOTE 12 | Av. Benjamin Pereira | 1660,00 | OIS |
| LOTE 12 | Rua Manuel Gaya | 1842,00 | Concluido |
| LOTE 12 | Rua Antônio Maria de Laet | 2792,00 | |
| LOTE 12 | Av. Capitão José Parada Gonçalves | 916,00 | Em Obras |
| LOTE 12 | Rua Duarte de Azevedo | 1020,00 | Concluido |
| LOTE 12 | Sub Total | 17099,00 | |

RESUMO POR LOTE

| Extensão Total | Concluído | Em Obras | Aguardando OS | Conclusão em 2024 |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 26.357,00 | 4.871,00 | 2.100,00 | 3.119,00 | 6.971,00 |
| 15.874,00 | 3.483,00 | 2.572,00 | 1.610,00 | 6.055,00 |
| 16.076,00 | 3.650,00 | 0,00 | 0,00 | 3.650,00 |
| 12.885,00 | 4.167,00 | 172,00 | 646,00 | 4.339,00 |
| 26.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.002,00 | 0,00 | 0,00 | 2.386,00 | 0,00 |
| 17.099,00 | 2.862,00 | 7.899,00 | 3.546,00 | 10.761,00 |
| 124.270,00 | 19.033,00 | 12.743,00 | 11.307,00 | 31.776,00 |

Situação em 04/12/2024

RUA ANTÔNIO CARLOS DA FONSECA



RUA ANTÔNIO CARLOS DA FONSECA



RUA ANTÔNIO CÉSAR NETO



RUA DOM MACÁRIO



MANUTENÇÃO

das Estruturas Ciclovviárias



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

Dezembro/2024

MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS

| Status | Extensão (m) |
|-------------------------------|--------------|
| Estruturas Vistoriadas | 580.000,00 |
| OS Emitida + Manut. Concluída | 98.557,25 |
| Manutenção Iniciada | 19.158,00 |
| Manutenção Concluída | 62.454,25 |
| OS Emitida - não iniciada | 9.506,00 |
| Suspensa | 9.303,00 |
| Aguardando Replanilhamento | 20.217,80 |

Situação em 04/12/2024

REGISTROS FOTOGRÁFICOS

de Atividades



CIDADE DE
SÃO PAULO
MOBILIDADE
E TRÂNSITO

MANUTENÇÃO FINALIZADA

| Nome | Extensão |
|---|----------|
| Ciclofaixa Jair Ribeiro | 1722,0 m |
| Ciclovía Teótonio Vilela | 4105,0 m |
| Ciclofaixa Barão da Passagem | 1356,0 m |
| Ciclovía Octalles / Zagottis | 1123,0 m |
| Ciclovía Sumaré | 3245,0 m |
| Ciclofaixa França Pinto | 1536,0 m |
| Ciclovía Vd Antartica | 1388,0 m |
| Ciclovía Luís Carlos Berrini | 3331,0 m |
| Ciclofaixa Consolação | 373,0 m |
| Ciclovía Santos Dumont - Trecho 1 | 522,0 m |
| Ciclofaixa Cecília Lotemberg | 2018,0 m |
| Ciclofaixa Metalúrgico | 2624,0 m |
| Ciclofaixa Santa Eulália | 392,0 m |
| Ciclofaixa Parque da Mooca | 1446,0 m |
| Ciclofaixa Vila Prudente - T1 | 1295,0 m |
| Ciclofaixa Vila Prudente - T1 Complemento | 971,0 m |
| Ciclofaixa Vila Prudente - T3 | 2068,0 m |

| Nome | Extensão |
|--|-----------|
| Jabaquara Trechos 1 e 2 | 4397,0 m |
| Jabaquara Trecho 3 | 627,0 m |
| Benjamim Constant | 230,0 m |
| Ciclofaixa Jaguará | 174,0 m |
| Vd. 9 de Julho | 275,0 m |
| Aratãs | 784,0 m |
| Ciclovía e Ciclofaixa Hebe Camargo | 3553,0 m |
| Ciclofaixa Cambuci | 45,0 m |
| Ciclofaixa Estado (Rua das Figueiras) | 26,3 m |
| Ciclovía Ponte Aricanduva | 791,0 m |
| Jacu-Pêssego | 14810,0 m |
| Ciclofaixa Parque São Rafael | 1655,0 m |
| Ciclofaixa Jardim Helena / São Miguel - T2 | 1736,00 |
| Martiniano de Carvalho | 769,00 |
| Ciclofaixa Patriotas | 2158,00 |
| Ciclofaixa Chácara Santo Antônio | 971,00 |
| Jardim Cordeiro | 909,00 |

Total Finalizada: 62.454,25 Km

MANUTENÇÃO EM ANDAMENTO

| Nome | Extensão |
|---------------------------------------|----------|
| Paraciclos | |
| Ciclofaixa Marquês de São Vicente | 4035,0 m |
| Ciclovía Ponte Vila Guilherme | 695,0 m |
| Ciclovía Ponte Jânio Quadros | 539,0 m |
| Ciclofaixa Norma Pieruccini Giannotti | 480,0 m |
| Ciclovía São João | 3717,0 m |
| Ciclovía Tancredo Neves | 2540,0 m |
| José Alves da Cunha | 1309,0 m |
| Camargo | 464,0 m |
| Parque Arariba T2 | 842,0 m |
| Freguesia do Ó | 2556,0 m |
| Jaguaré | 745,0 m |
| Vitória Speers | 1208,0 m |
| Carioca Camamu | 1197,0 m |
| Reposição Geral de Gradis | |
| Faria Lima - Conexões | 1351,0 m |

Total de obras em andamento: 19.158,00 Km

TANCREDO NEVES



TANCREDO NEVES



M4
Projeto Cicloviário de São Paulo
23.11.2024 06:19
-23.61779, -46.60971 (±8m)
Rua Nossa Sra. das Mercês, 29 - Jardim Previdência
- SP, 04287-020




São Paulo
(±5m)
- Av. Pres. Tancredo Neves -
04272

VITÓRIA SPEERS



M4
Projeto Cicloviário de São Paulo
24.10.2024 23:20
-23.56893, -46.55299 (±4m)
R. Dona Vitória Speers, 802 - Vila Formosa - SP
03359-000

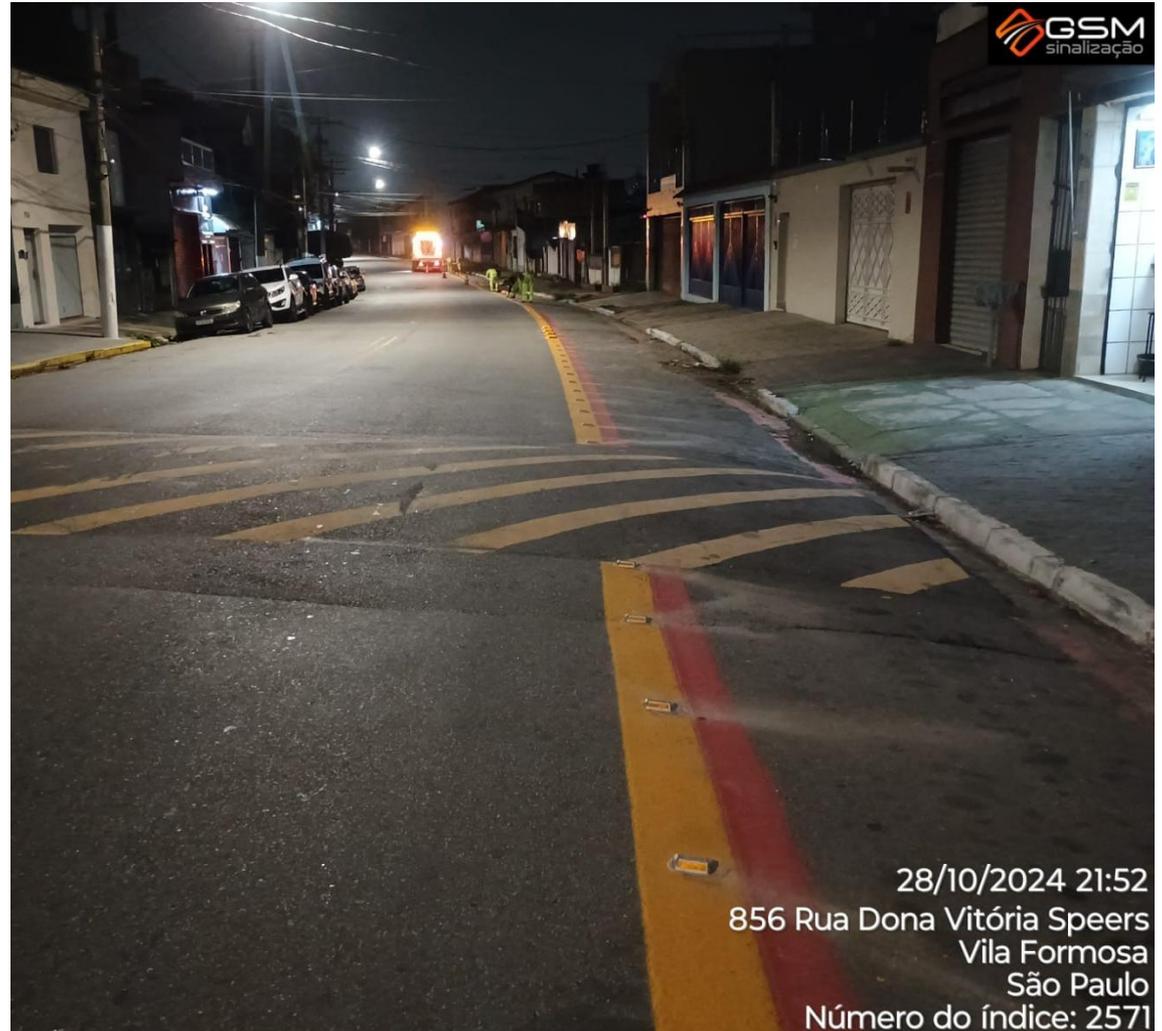

28/10/2024 21:52
856 Rua Dona Vitória Speers
Vila Formosa
São Paulo
Número do índice: 2571

GASTÃO VIDIGAL



GASTÃO VIDIGAL



ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS

| Nome | Extensão |
|--------------------------------|----------|
| Ciclovia Inajar de Souza | 5997,0 m |
| Ciclovia Brás Leme | 2938,0 m |
| Ciclofaixa Brás Leme - Ligação | 368,0 m |
| Ciclofaixa Nazaré T2 - Tachão | 2400,0 m |
| Ciclofaixa Nazaré T2 | 347,0 m |
| Faria Lima - T2 | 6759,0 m |

→ Suspensas para ajuste de projeto.

OS emitidas e serviços não iniciados: 9.506,00 Km

OS suspensas: 9.303,00 Km

AGUARDANDO REPLANILHAMENTO

| Nome | Extensão |
|---|----------|
| Costa Carvalho | 96,00 |
| Vila Carrão - R. João Vieira Prioste E Outras | 2120,00 |
| Arena Corinthians | 1394,00 |
| Agostinho Cantu | 882,00 |
| Martiniano De Carvalho 2 | 1171,00 |
| Torres De Oliveira | 1258,00 |
| Caititu | 2059,00 |
| Passo Da Patria | 1765,00 |
| Eliseu De Almeida (Parcial) | 2363,00 |
| Gabriel Migliori | 1361,00 |
| Vinte E Um De Abril | 1157,00 |
| Figueira Rangel | 986,00 |
| Praça Da República | 402,00 |
| Joaquina Ramalho | 627,00 |
| Monotriilo Vila Prudente - Liam | 396,00 |
| Manoel Da Nóbrega | 224,00 |
| Nhambiquaras - Jurupis x Acoce x Maracatins (Parcial) | 869,00 |
| Visconde De Taunay | 973,00 |
| Mofarrej | 61,30 |
| São Miguel | 53,50 |

Aguardando Replanilhamento para emissão de Ordens de Serviço: 20.217,80 Km



OBRIGAD@!



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
MOBILIDADE
E TRÂNSITO
