

# PLANO CICLOVIÁRIO

Cidade de São Paulo



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

Novembro/2024

# NOVAS IMPLANTAÇÕES

## de Estruturas Ciclovias



**CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**  
**MOBILIDADE**  
**E TRÂNSITO**

Novembro/2024

# MAPA CICLOVIÁRIO

## LEGENDA

- 743 km de Estruturas Ciclovias **EXISTENTE**
- 158,0 km de Estruturas Ciclovias **LICITAÇÃO**
- 120,57 km de Estruturas Ciclovias **PPP COHAB**
- 48,0 km de Estruturas Ciclovias **CONCORRÊNCIAS**

# REGISTROS FOTOGRÁFICOS

## de Atividades



**CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**  
**MOBILIDADE**  
**E TRÂNSITO**

# CONCORRÊNCIA 02 e 03



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

# ESTRUTURAS EM IMPLANTAÇÃO

As estruturas abaixo estão com a obra finalizada.


- ✓ R. João Batista Conti;
- ✓ Av. Abraão Ribeiro;
- ✓ Av. Raimundo Pereira Magalhães e
- ✓ Av. Jacu - Pêssego.



**Raimundo**




**Abraão Ribeiro**

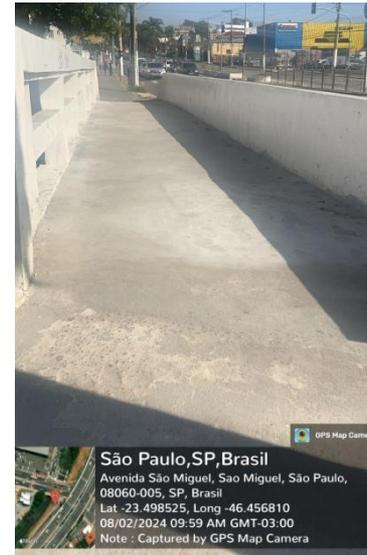

**Jacu Pêssego**

# NAGIB FARAH MALUF

Estrutura Cicloviária em obras: Av. Nagib Farah Maluf.

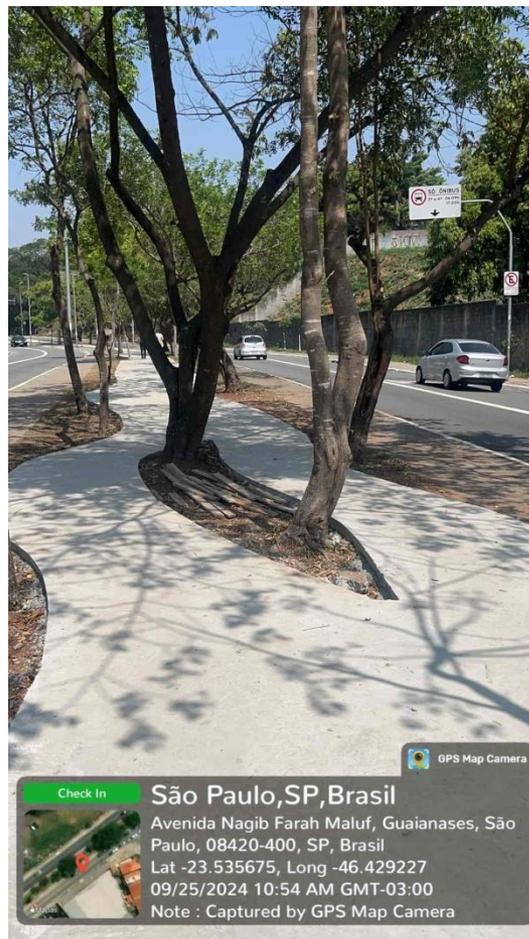

# PPP da HABITAÇÃO



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

# SITUAÇÃO DOS LOTES

LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão	Status
LOTE 01	<b>Rua Agostinho Gomes</b>	1.221,00	Concluído
LOTE 01	Rua Cipriano Barata	650,00	Em Obras
LOTE 01	Rua Antonio Carlos da Fonseca	2.720,00	Em Obras
LOTE 01	Rua Dom Macario	1.540,00	Em Obras
LOTE 01	<b>Rua Nossa Senhora da Saúde - Trecho I</b>	930,00	Concluído
LOTE 01	Rua José dos Reis	560,00	Em Obras

LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão	Status
LOTE 05	Rua Airton Pretini	645,00	OIS em processo
LOTE 05	<b>Rua Apucarana</b>	1.999,00	Concluído
LOTE 05	Rua Adhemar Pereira de Barros	965,00	OIS em processo
LOTE 05	<b>Rua Astarte</b>	778,00	Concluído
LOTE 05	Av. Salim Farah Maluf	910,00	OIS em processo
LOTE 05	Av. Capitão Pacheco Chaves	1.644,00	OIS em processo
LOTE 05	<b>Rua Carlos de Campos</b>	706,00	Concluído
LOTE 05	Rua Joao Boemer	1.872,00	Em Obras
LOTE 05	Pte Tatuapé	700,00	Em Obras

# SITUAÇÃO DOS LOTES

<b>LOTE</b>	<b>Estrutura Ciclovial</b>	<b>Extensão</b>	<b>Status</b>
LOTE 07	<b>Rua Maria Cândida</b>	2.341,00	Concluído
LOTE 07	<b>Av. José Maria Fernandes</b>	1.309,00	Concluído

<b>LOTE</b>	<b>Estrutura Ciclovial</b>	<b>Extensão</b>	<b>Status</b>
LOTE 09	<b>Rua Benjamim Mansur</b>	1.297,00	Concluído
LOTE 09	<b>Av. Corifeu de Azevedo Marques - Trecho I</b>	1.640,00	Concluído
LOTE 09	Rua Adherbal Stresser	114,00	OIS em processo
LOTE 09	Rua Camargo	532,00	OIS em processo
LOTE 09	Rua Gal. Asdrúbal da Cunha-TRECHO 2/R. Maj. Wa	172,00	Em Obras
LOTE 09	<b>Av. Vital Brasil</b>	1.230,00	Concluído

# SITUAÇÃO DOS LOTES

LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão	Status
<b>Lote 11</b>	<b>Solicitação de ADITIVO FINANCEIRO</b>		
LOTE 11	Av Queiroz Filho	1.155,00	OIS em processo
LOTE 11	Av Imperatriz Leopoldina	94,00	OIS em processo
LOTE 11	Rua Major Paladino	373,00	OIS em processo
LOTE 11	Viaduto da Lapa	697,00	OIS em processo

LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão	Status
LOTE 12	Rua Virgília Rodrigues Alves C. Pinto	1.500,00	OIS emitida
LOTE 12	Rua Santa Inês	1.886,00	OIS em processo
LOTE 12	Rua Maria Amália Lopes de Azevedo	4.703,00	OIS emitida
LOTE 12	Rua Antonio Cesar Neto	780,00	OIS emitida
LOTE 12	Av. Benjamin Pereira	1.660,00	OIS em processo
LOTE 12	<b>Rua Manuel Gaya</b>	1.842,00	Concluído
LOTE 12	Av. Capitão José Parada Gonçalves	916,00	OIS emitida
LOTE 12	<b>Rua Duarte de Azevedo</b>	1.020,00	Concluído

# RESUMO POR LOTE

Lotes	Extensão Total	Concluído	Em Obras	OS Emitidas	OS em Processo
01	26.357,00	2.151,00	5.470,00	0,00	0,00
05	15.874,00	3.483,00	2.572,00	0,00	4.164,00
07	16.076,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00
09	12.885,00	4.167,00	172,00	0,00	646,00
10	26.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	9.002,00	0,00	0,00	0,00	2.319,00
12	17.099,00	2.862,00	0,00	7.899,00	3.546,00
<b>Total</b>	<b>124.270,00</b>	<b>16.313,00</b>	<b>8.214,00</b>	<b>7.899,00</b>	<b>10.675,00</b>




# ANTONIO CARLOS DA FONSECA



# ANTONIO CARLOS DA FONSECA






# ANTONIO CARLOS DA FONSECA

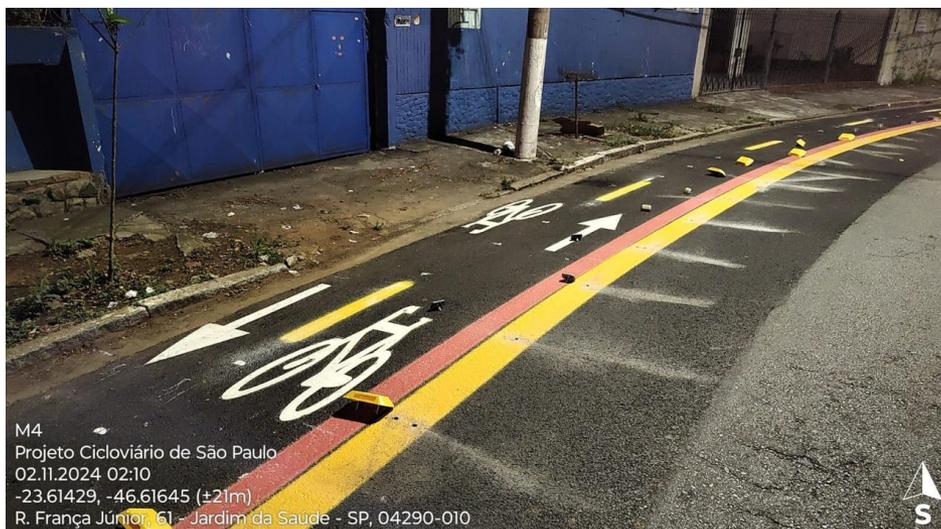

# AV. BOSQUE DA SAÚDE



# RUA DOM MACÁRIO

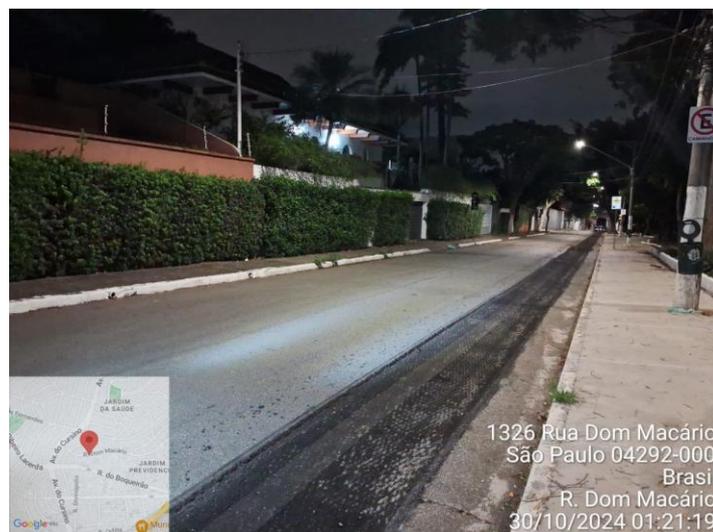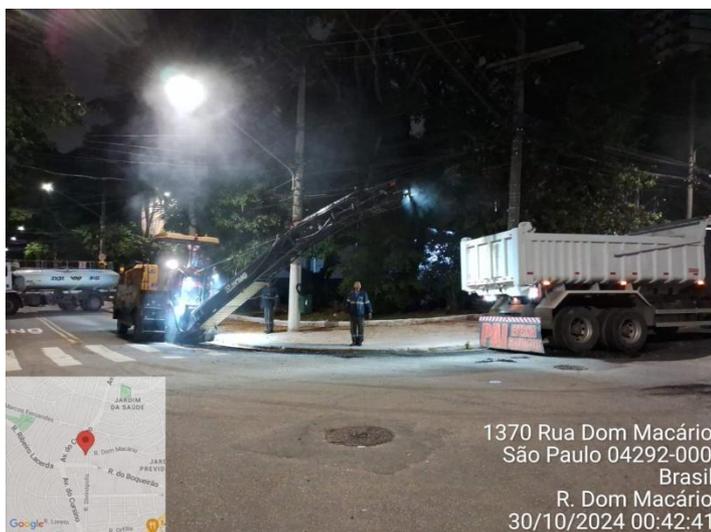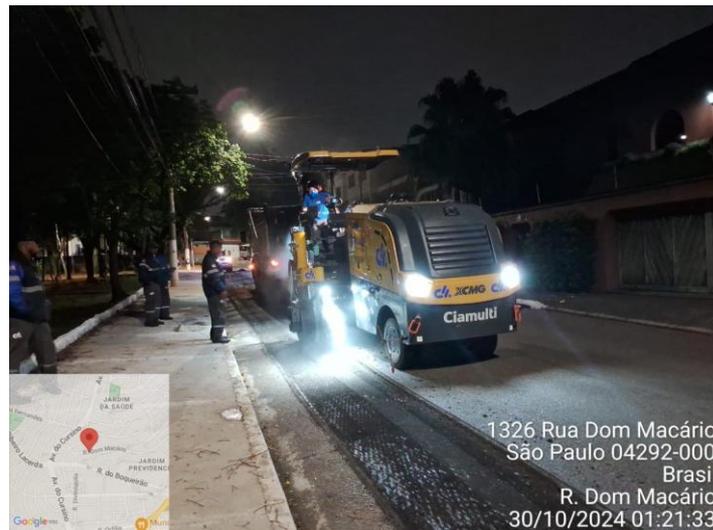

# RUA JOÃO BOEMER



# MANUTENÇÃO

## das Estruturas Ciclovviárias



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

Junho/2024

# MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS

Status	Extensão (m)
Estruturas Vistoriadas	265.400,00
OS Emitida + Manut. Concluída	99.908,25
Manutenção Iniciada	19.554,00
Manutenção Concluída	61.545,25
OS Emitida - não iniciada	9.506,00

Situação em 04/11/2024

# REGISTROS FOTOGRÁFICOS

## de Atividades



**CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**  
**MOBILIDADE**  
**E TRÂNSITO**


# MANUTENÇÃO FINALIZADA

Nome	Extensão
Ciclofaixa Jair Ribeiro	1722,0 m
Ciclovia Teôtonio Vilela	4105,0 m
Ciclofaixa Barão da Passagem	1356,0 m
Ciclovia Octalles / Zagottis	1123,0 m
Ciclovia Sumaré	3245,0 m
Ciclofaixa França Pinto	1536,0 m
Ciclovia Vd Antartica	1388,0 m
Ciclovia Luís Carlos Berrini	3331,0 m
Ciclofaixa Consolação	373,0 m
Ciclovia Santos Dumont - Trecho 1	522,0 m
Ciclofaixa Cecília Lotemberg	2018,0 m
Ciclofaixa Metalurgico	2624,0 m
Ciclofaixa Santa Eulália	392,0 m
Ciclofaixa Parque da Mooca	1446,0 m
Ciclofaixa Vila Prudente - T1	1295,0 m
Ciclofaixa Vila Prudente - T1 Complemento	971,0 m

Nome	Extensão
Ciclofaixa Vila Prudente - T3	2068,0 m
Jabaquara Trechos 1 e 2	4397,0 m
Jabaquara Trecho 3	627,0 m
Benjamim Constant	230,0 m
Ciclofaixa Jaguará	174,0 m
Vd. 9 de Julho	275,0 m
Aratãs	784,0 m
Ciclovia e Ciclofaixa Hebe Camargo	3553,0 m
Ciclofaixa Cambuci	45,0 m
Ciclofaixa Estado (Rua das Figueiras)	26,3 m
Ciclovia Ponte Aricanduva	791,0 m
Jacu-Pêssego	14810,0 m
Ciclofaixa Parque São Rafael	1655,0 m
Ciclofaixa Jardim Helena / São Miguel - T2	1736,00
Martiniano de Carvalho	769,00
Ciclofaixa Patriotas	2158,00
Ciclofaixa Chácara Santo Antônio	971,00

**Total Finalizada: 61.545,25 Km**


# BERRINI

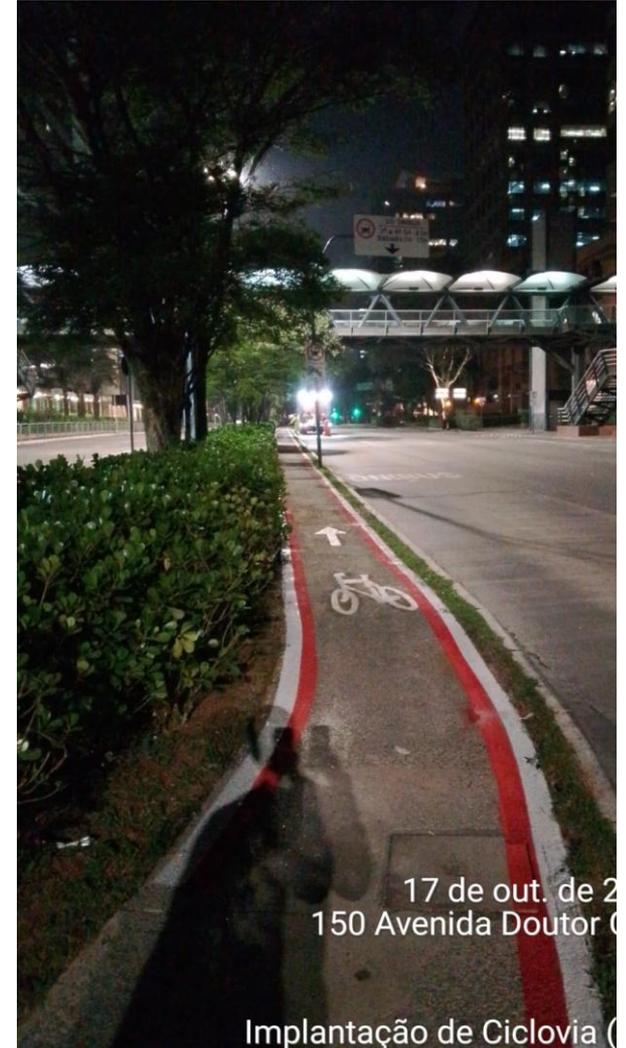

# PATRIOTAS



Projeto Cicloviário de São Paulo  
10.10.2024 03:52  
-23.58564, -46.61707 (±85m)  
R. Mont'Alverne, 216 - Vila São José - SP,  
04265-060

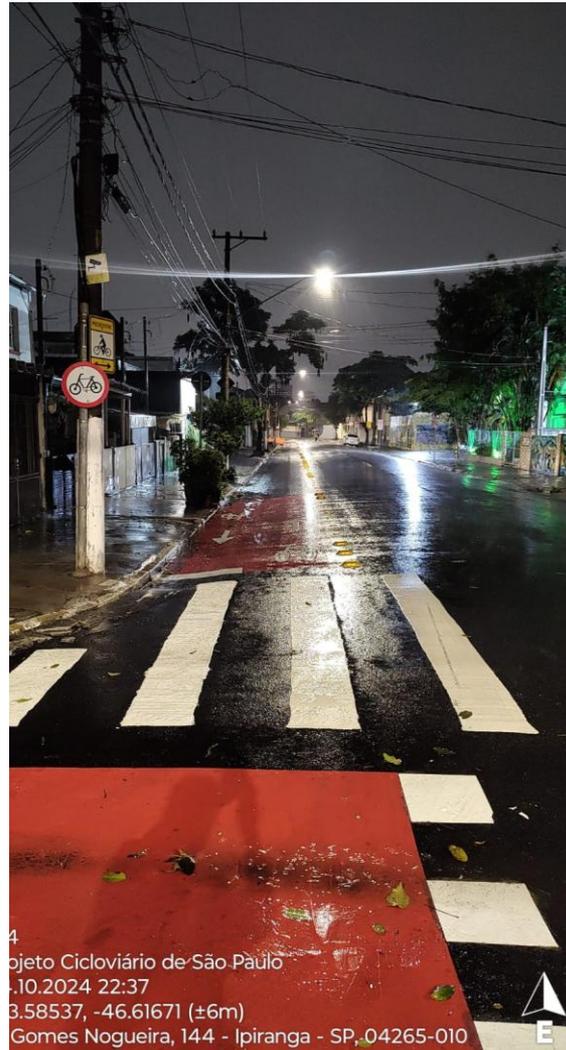

Projeto Cicloviário de São Paulo  
10.10.2024 22:37  
-23.58537, -46.61671 (±6m)  
R. Gomes Nogueira, 144 - Ipiranga - SP, 04265-010



Projeto Cicloviário de São Paulo  
18.10.2024 22:31  
-23.58454, -46.61607 (±4m)  
R. Mont'Alverne, 65 - Vila São José - SP, 04265-060



# PATRIOTAS




# MANUTENÇÃO EM ANDAMENTO

Nome	Extensão
Paraciclos	
Ciclofaixa Marquês de São Vicente	4035,0 m
Ciclovia Ponte Vila Guilherme	695,0 m
Ciclovia Ponte Jânio Quadros	539,0 m
Ciclofaixa Norma Pieruccini Giannotti	480,0 m
Ciclovia São João	3717,0 m
Ciclovia Tancredo Neves	2540,0 m
José Alves da Cunha	1309,0 m
Rubens Gomes de Souza	396,0 m
Camargo	464,0 m
Parque Arariba T2	842,0 m
Freguesia do Ó	2556,0 m
Jaguaré	745,0 m
Vitória Speers	1208,0 m
Carioca Camamu	1197,0 m
Reposição Geral de Gradis	
Faria Lima - Conexões	1351,0 m

**Total de obras iniciadas: 19.554 Km**




# TANCREDO NEVES

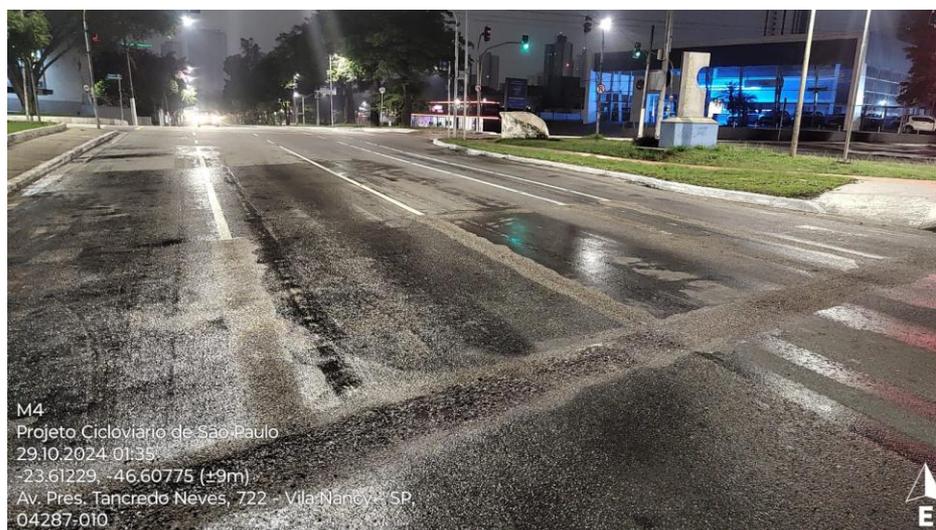




# NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI



# VILA CARIOCA

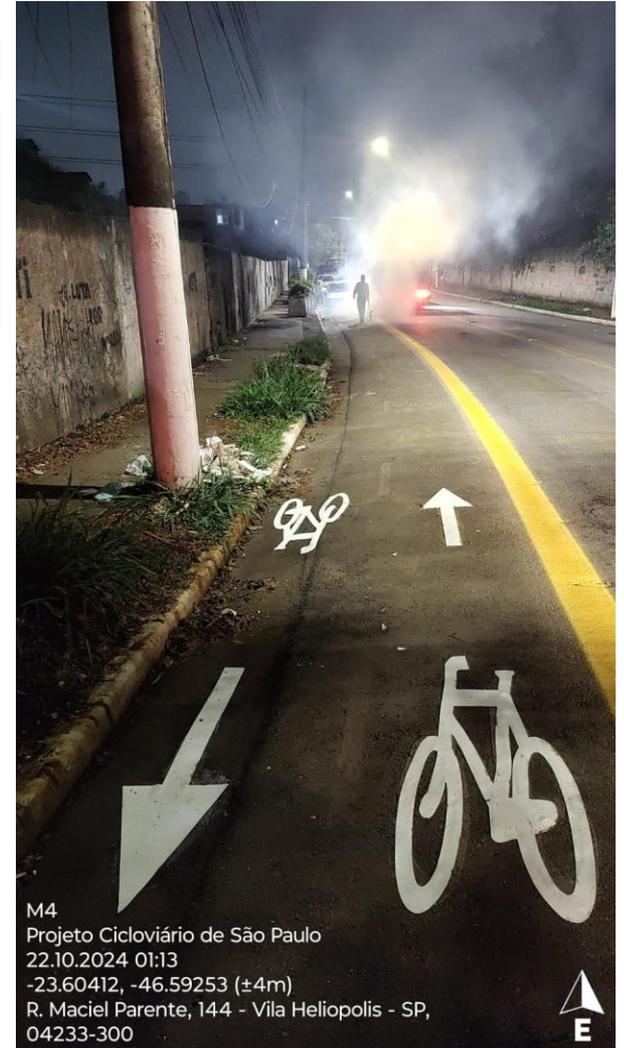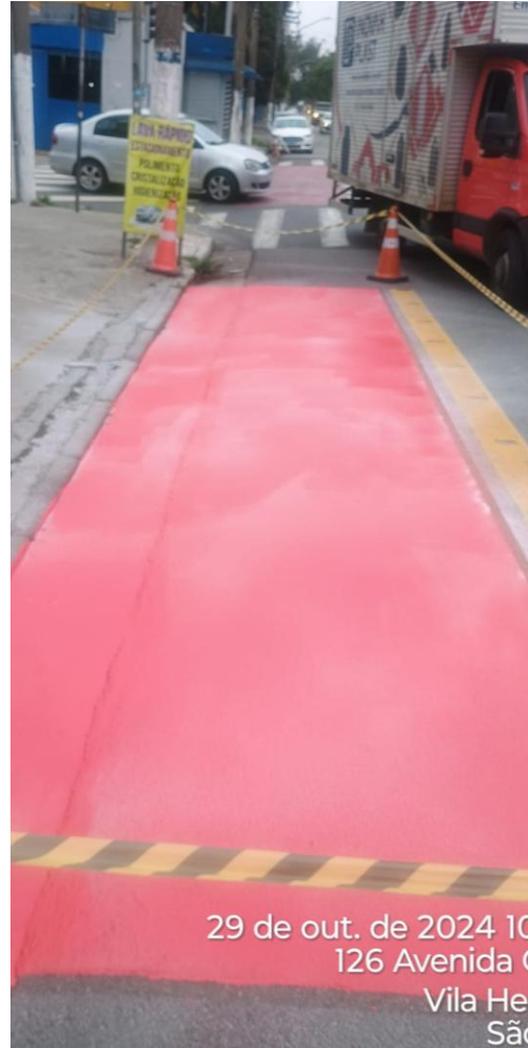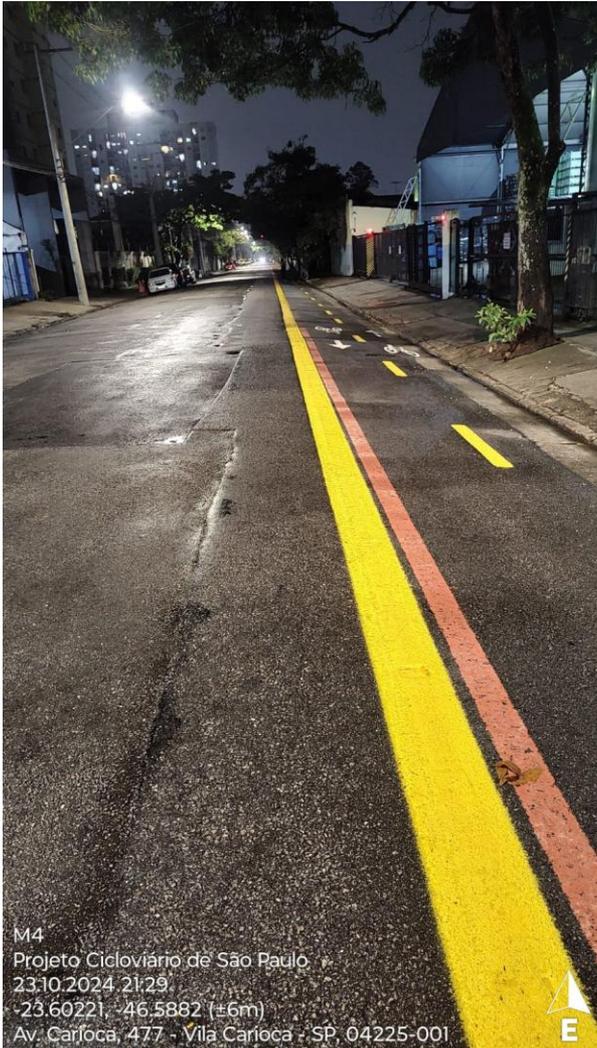

# VITÓRIA SPEERS

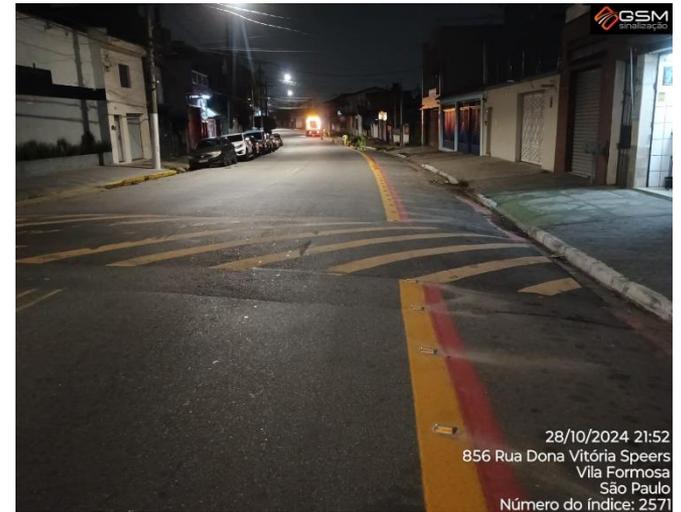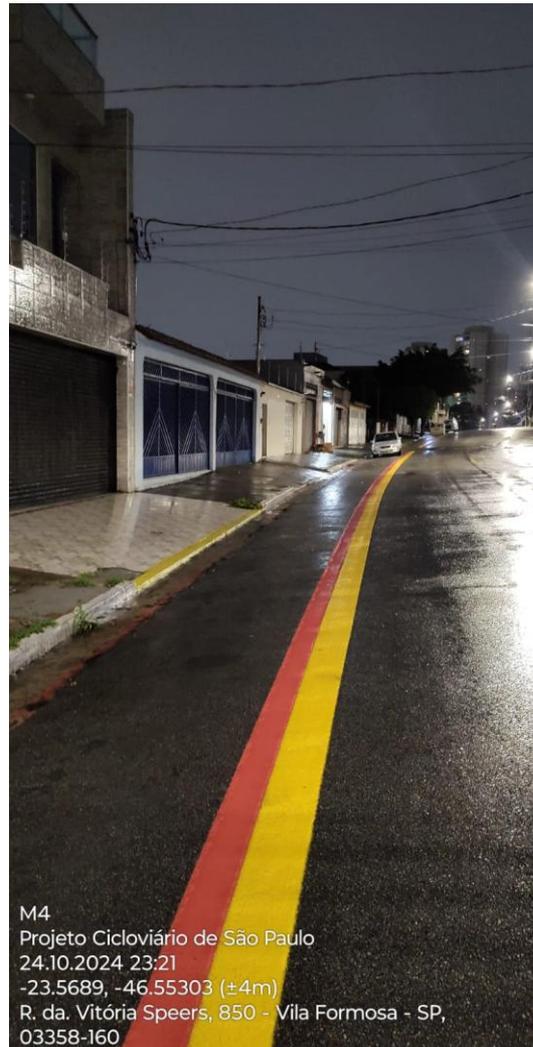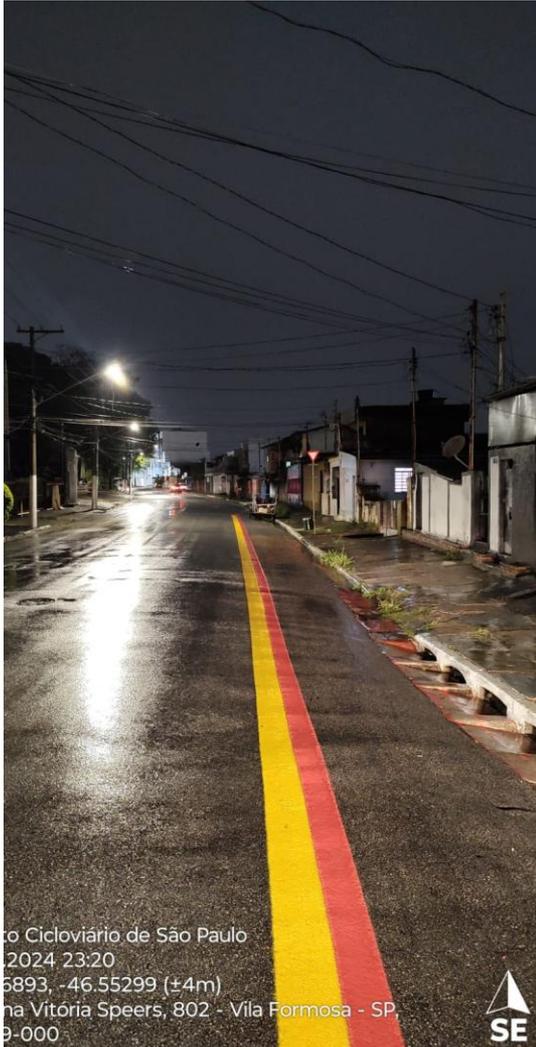

# ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS

Nome	Extensão
Ciclovía Inajar de Souza	5997,0 m
Ciclovía Brás Leme	2938,0 m
Ciclofaixa Brás Leme - Ligação	368,0 m
Ciclofaixa Nazaré T2 - Tachão	2400,0 m
Ciclofaixa Nazaré T2	347,0 m
Faria Lima - T2	6759,0 m

**- 9,3Km:**

→ suspensas para ajuste de projeto.

**OS emitidas e serviços não iniciados: 9.506 Km**



**OBRIGAD@!**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO
