

# PLANO CICLOVIÁRIO

Cidade de São Paulo



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

Outubro/2024

# NOVAS IMPLANTAÇÕES

## de Estruturas Ciclovias



**CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**  
**MOBILIDADE**  
**E TRÂNSITO**

Outubro/2024

# MAPA CICLOVIÁRIO

## LEGENDA

- 743 km de Estruturas Ciclovias **EXISTENTE**
- 158,0 km de Estruturas Ciclovias **LICITAÇÃO**
- 120,57 km de Estruturas Ciclovias **PPP COHAB**
- 48,0 km de Estruturas Ciclovias **CONCORRÊNCIAS**





# REGISTROS FOTOGRÁFICOS

## de Atividades



**CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**  
**MOBILIDADE**  
**E TRÂNSITO**

# CONCORRÊNCIA 02 e 03




**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

# ESTRUTURAS EM IMPLANTAÇÃO

As estruturas abaixo estão com a obra finalizada, aguardando a sinalização.


- ✓ R. João Batista Conti;
- ✓ Av. Abraão Ribeiro;
- ✓ Av. Raimundo Pereira Magalhães e
- ✓ Av. Jacu - Pêssego.

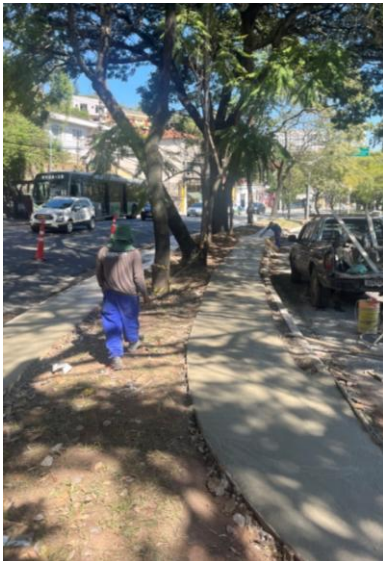

**Raimundo**



**Abraão Ribeiro**

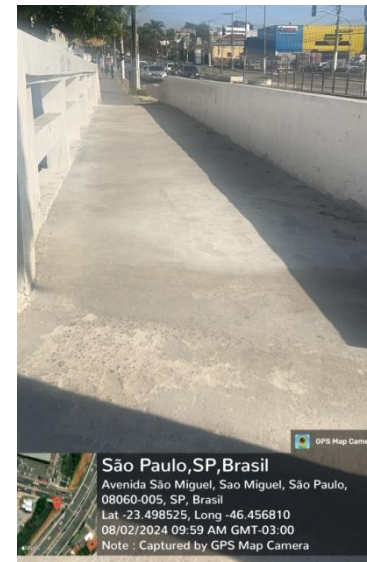

**Jacu Pêssego**



# NAGIB FARAH MALUF




## Estrutura Cicloviária em obras: Av. Nagib Farah Maluf.





# NAGIB FARAH MALUF


Estrutura Cicloviária em obras: Av. Nagib Farah Maluf.

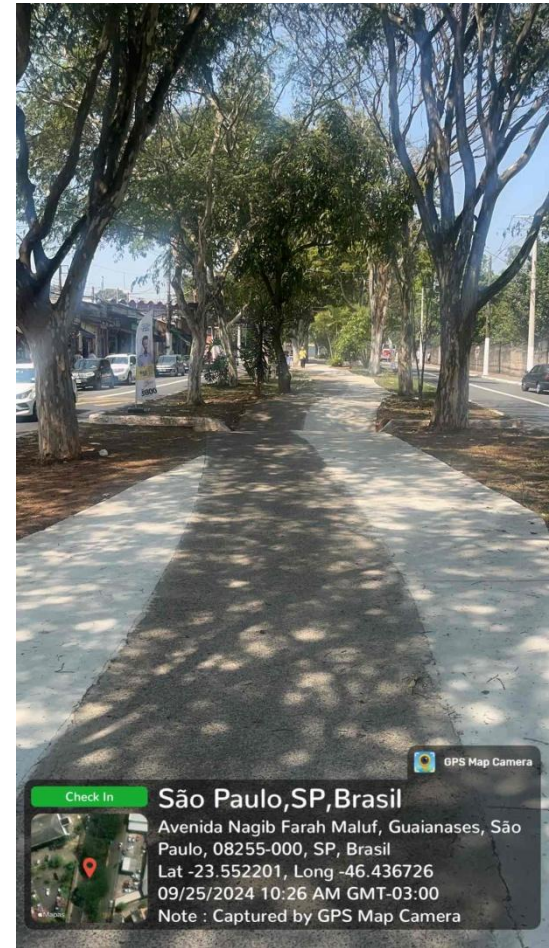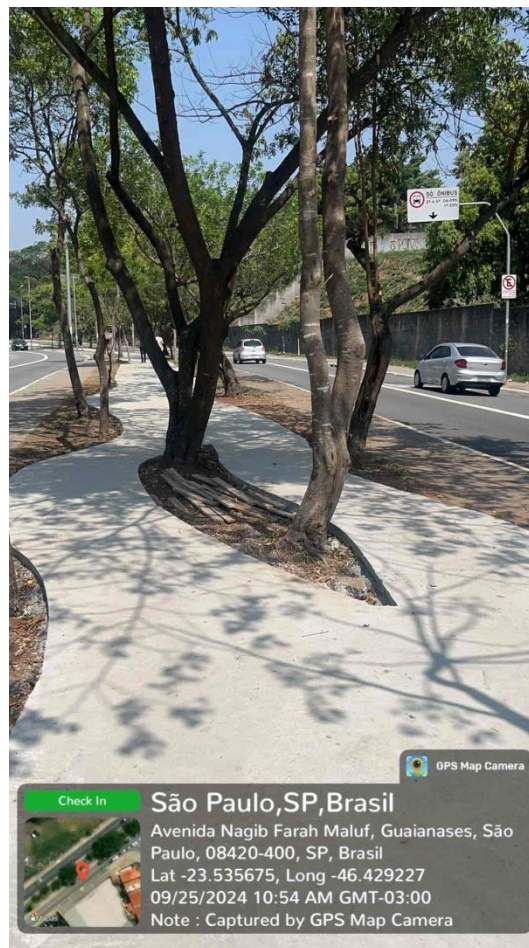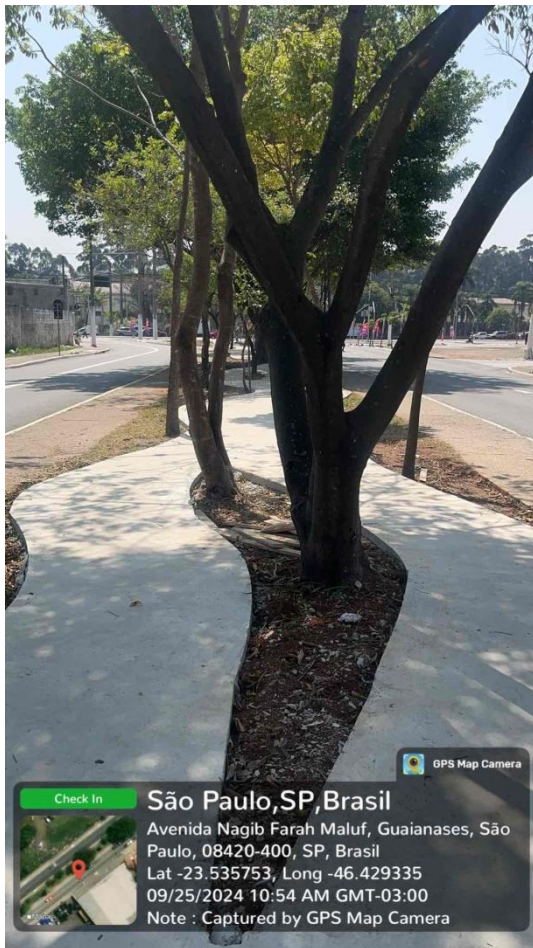



# NAGIB FARAH MALUF

Estrutura Cicloviária em obras: Av. Nagib Farah Maluf.

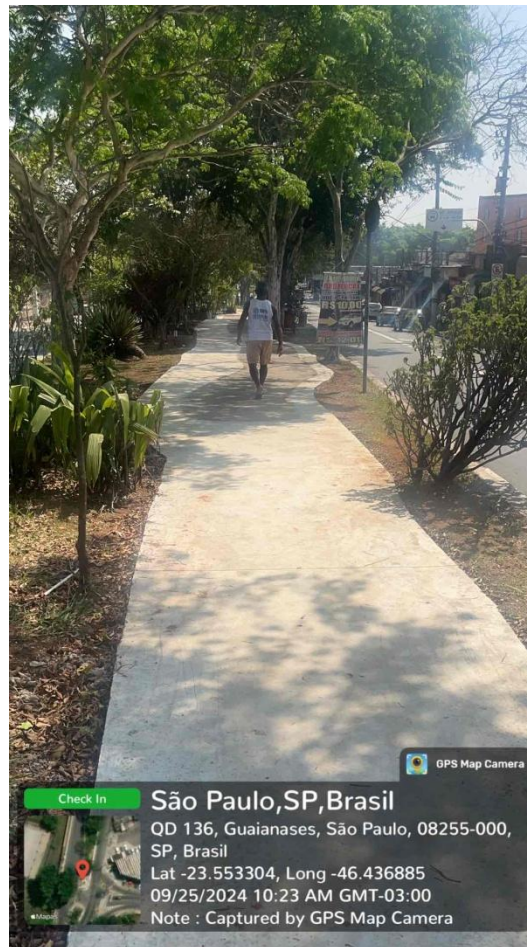

# PPP da HABITAÇÃO



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO



# SITUAÇÃO DOS LOTES

LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão	Status
LOTE 01	<b>Rua Agostinho Gomes</b>	1.221,00	Concluído
LOTE 01	Rua Cipriano Barata	650,00	OIS em processo
LOTE 01	Rua Antonio Carlos da Fonseca	2.720,00	Em Obras
LOTE 01	Rua Dom Macario	1.540,00	Em Obras
LOTE 01	<b>Rua Nossa Senhora da Saúde - Trecho I</b>	930,00	Concluído
LOTE 01	Rua José dos Reis	560,00	Em Obras

LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão	Status
LOTE 05	Rua Airton Pretini	645,00	OIS em processo
LOTE 05	<b>Rua Apucarana</b>	1.999,00	Concluído
LOTE 05	Rua Adhemar Pereira de Barros	965,00	OIS em processo
LOTE 05	<b>Rua Astarte</b>	778,00	Concluído
LOTE 05	Av. Salim Farah Maluf	910,00	OIS em processo
LOTE 05	Av. Capitão Pacheco Chaves	1.644,00	OIS em processo
LOTE 05	<b>Rua Carlos de Campos</b>	706,00	Concluído
LOTE 05	Rua Joao Boemer	1.872,00	Em Obras
LOTE 05	Pte Tatuapé	700,00	OIS em processo

# SITUAÇÃO DOS LOTES

<b>LOTE</b>	<b>Estrutura Ciclovitaria</b>	<b>Extensão</b>	<b>Status</b>
LOTE 07	<b>Rua Maria Cândida</b>	2.341,00	Concluído
LOTE 07	<b>Av. José Maria Fernandes</b>	1.309,00	Em Obras

<b>LOTE</b>	<b>Estrutura Ciclovitaria</b>	<b>Extensão</b>	<b>Status</b>
LOTE 09	<b>Rua Benjamim Mansur</b>	1.297,00	Concluído
LOTE 09	<b>Av. Corifeu de Azevedo Marques - Trecho I</b>	1.640,00	Concluído
LOTE 09	Rua Adherbal Stresser	114,00	OIS em processo
LOTE 09	Rua Camargo	532,00	OIS em processo
LOTE 09	Rua Gal. Asdrúbal da Cunha-TRECHO 2/R. Maj. Wa	172,00	OIS emitida
LOTE 09	<b>Av. Vital Brasil</b>	1.230,00	Concluído



# SITUAÇÃO DOS LOTES

LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão	Status
<b>Lote 11</b>	<b>Solicitação de ADITIVO FINANCEIRO</b>		
LOTE 11	Av Queiroz Filho	1.155,00	OIS em processo
LOTE 11	Av Imperatriz Leopoldina	94,00	OIS em processo
LOTE 11	Rua Major Paladino	373,00	OIS em processo
LOTE 11	Viaduto da Lapa	697,00	OIS em processo

LOTE	Estrutura Ciclovial	Extensão	Status
LOTE 12	Rua Virgília Rodrigues Alves C. Pinto	1.500,00	OIS emitida
LOTE 12	Rua Santa Inês	1.886,00	OIS em processo
LOTE 12	Rua Maria Amália Lopes de Azevedo	4.703,00	OIS emitida
LOTE 12	Rua Antonio Cesar Neto	780,00	OIS emitida
LOTE 12	Av. Benjamin Pereira	1.660,00	OIS em processo
LOTE 12	<b>Rua Manuel Gaya</b>	1.842,00	Concluído
LOTE 12	Av. Capitão José Parada Gonçalves	916,00	OIS emitida
LOTE 12	<b>Rua Duarte de Azevedo</b>	1.020,00	Concluído


# RESUMO POR LOTE

<b>Lotes</b>	<b>Extensão Total</b>	<b>Concluído</b>	<b>Em Obras</b>	<b>OS Emitidas</b>
01	26.357,00	2.151,00	4.820,00	0,00
05	15.874,00	3.483,00	1.872,00	0,00
07	16.076,00	2.341,00	1.309,00	0,00
09	12.885,00	4.167,00	0,00	172,00
10	26.977,00	0,00	0,00	0,00
11	9.002,00	0,00	0,00	0,00
12	17.099,00	2.862,00	0,00	7.899,00
<b>Total</b>	<b>124.270,00</b>	<b>15.004,00</b>	<b>8.001,00</b>	<b>8.071,00</b>





# AV. JOSÉ MARIA FERNANDES

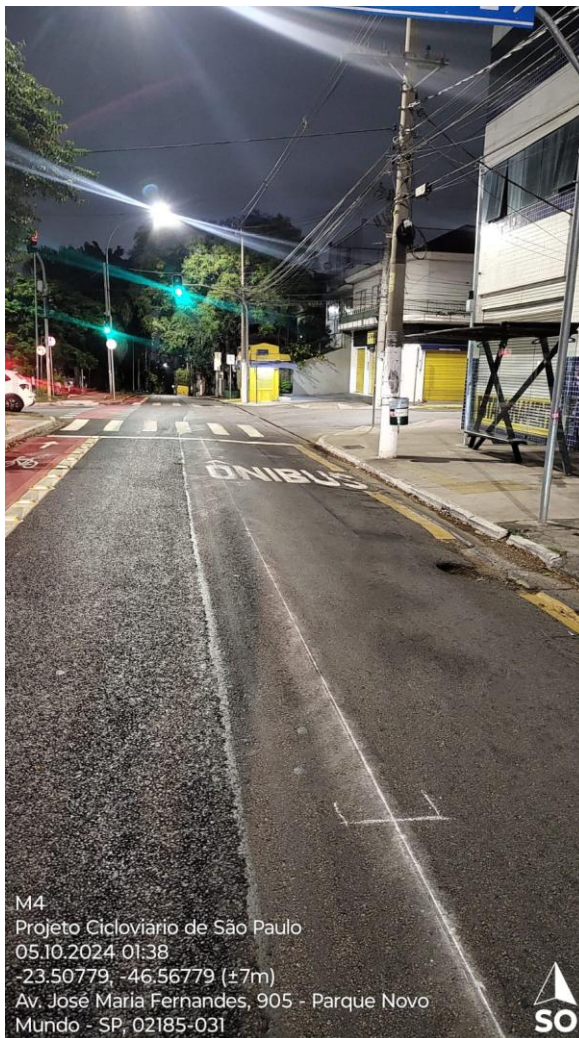



# ANTÔNIO CARLOS DA FONSECA



# MANUTENÇÃO

## das Estruturas Ciclovviárias



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

Junho/2024



# MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS

Status	Extensão (m)
Estruturas Vistoriadas	265.400,00
OS Emitida + Manut. Concluída	98.557,25
Manutenção Iniciada	13.062,00
Manutenção Concluída	53.690,25

Situação em 04/10/2024

# REGISTROS FOTOGRÁFICOS

## de Atividades



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

# MANUTENÇÃO FINALIZADA

Nome	Extensão
Ciclofaixa Jair Ribeiro	1722,0 m
Ciclovia Teôtonio Vilela	4105,0 m
Ciclofaixa Barão da Passagem	1356,0 m
Ciclovia Octalles / Zagottis	1123,0 m
Ciclovia Sumaré	3245,0 m
Ciclofaixa França Pinto	1536,0 m
Ciclovia Vd Antartica	1388,0 m
Ciclofaixa Consolação	373,0 m
Ciclovia Santos Dumont - Trecho 1	522,0 m
Ciclofaixa Cecília Lotemberg	2018,0 m
Ciclofaixa Metalurgico	2624,0 m
Ciclofaixa Santa Eulália	392,0 m
Ciclofaixa Parque da Mooca	1446,0 m
Ciclofaixa Vila Prudente - T1	1295,0 m
Ciclofaixa Vila Prudente - T1 Complemento	0,0 m

Nome	Extensão
Ciclofaixa Vila Prudente - T3	2068,0 m
Jabaquara Trechos 1 e 2	4397,0 m
Jabaquara Trecho 3	627,0 m
Benjamim Constant	230,0 m
Ciclofaixa Jaguará	174,0 m
Vd. 9 de Julho	275,0 m
Aratãs	784,0 m
Ciclofaixa Cambuci	45,0 m
Ciclofaixa Estado (Rua das Figueiras)	26,3 m
Ciclovia Ponte Aricanduva	791,0 m
Jacu-Pêssego	14810,0 m
Ciclofaixa Parque São Rafael	1655,0 m
Ciclofaixa Jardim Helena / São Miguel - T2	1736,00
Martiniano de Carvalho	769,00
Ciclofaixa Patriotas	2158,00

**Total Finalizada: 53.690,30 Km**




# PATRIOTAS



M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo




M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo

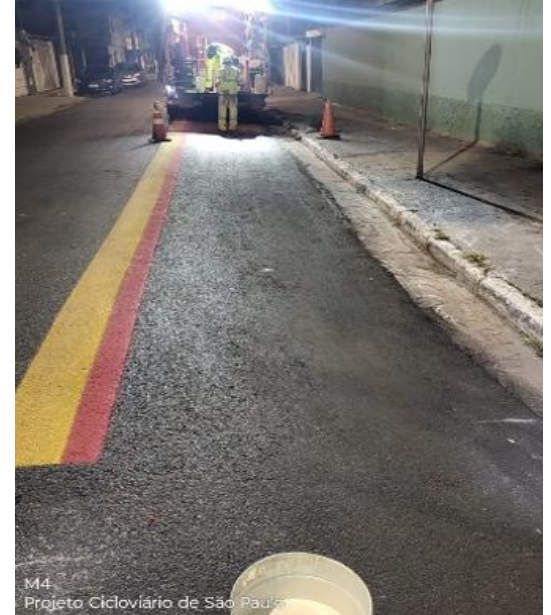

M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo



M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo

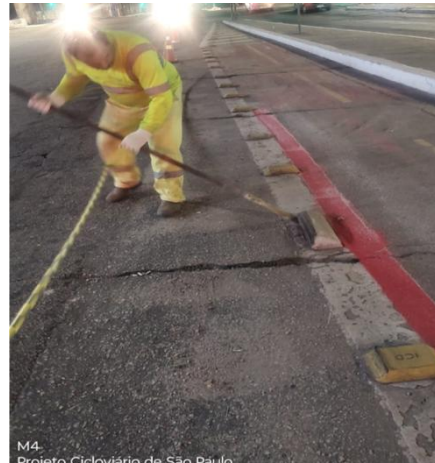

M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo



Projeto Cicloviário de São Paulo




# PATRIOTAS



M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo




M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo

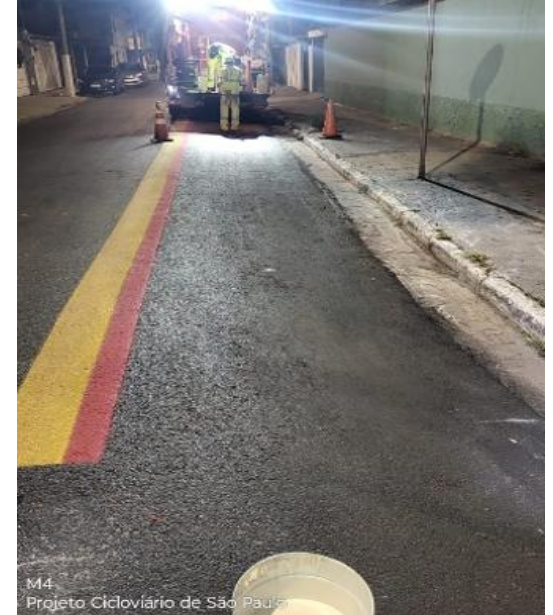

M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo



M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo

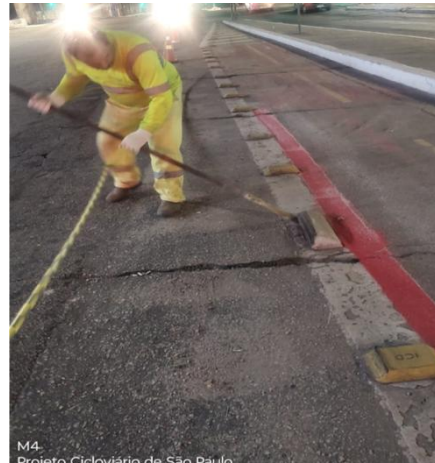

M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo



Projeto Cicloviário de São Paulo



# MARTINIANO DE CARVALHO






# PARQUE SÃO RAFAEL



M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo  
27.08.2024 01:23  
-23.61484, -46.47088 (±15m)  
R. João de Matos, 23 - Jardim Vera Cruz (Zona Sul) -  
SP, 08330-110



M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo  
29.08.2024 04:13  
-23.61813, -46.47166 (±7m)  
R. Fortaleza de Itapema, 80 - Jardim Vera  
Cruz (Zona Leste) - SP, 08330-054

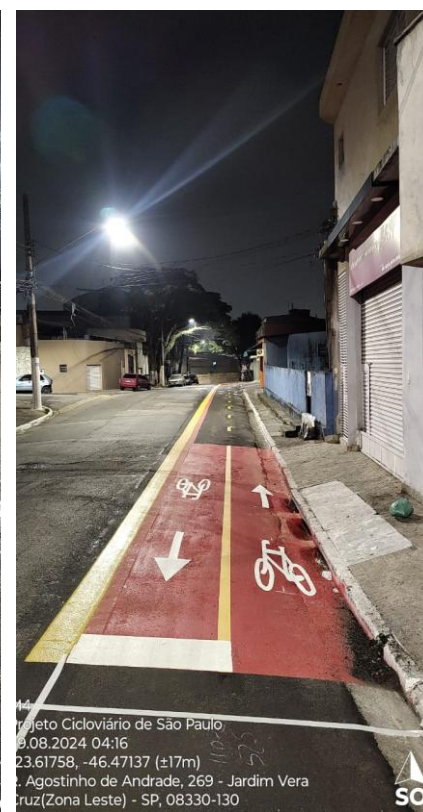

M4  
Projeto Cicloviário de São Paulo  
29.08.2024 04:16  
-23.61758, -46.47137 (±17m)  
R. Agostinho de Andrade, 269 - Jardim Vera  
Cruz (Zona Leste) - SP, 08330-130



# PARQUE SÃO RAFAEL






# JARDIM HELENA





# JARDIM HELENA

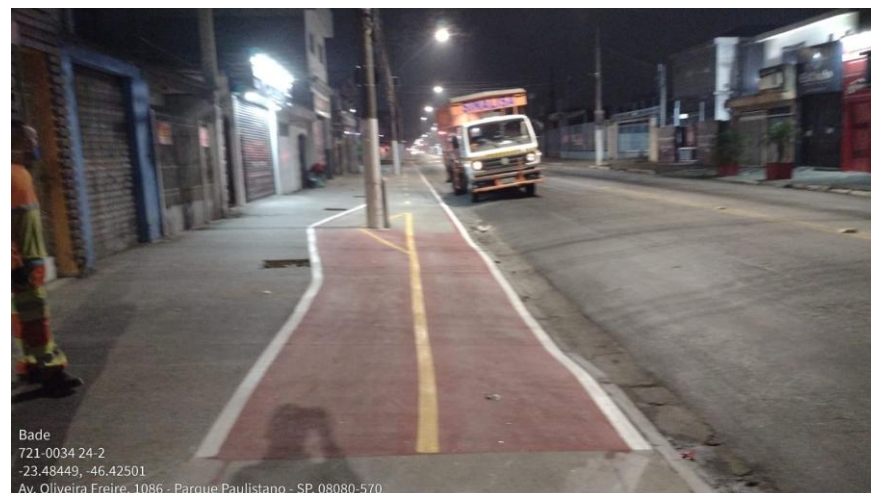


# MANUTENÇÃO EM ANDAMENTO

Nome	Extensão
Ciclovía Luís Carlos Berrini	3331,0 m
Paraciclos	
Ciclofaixa Marquês de São Vicente	4035,0 m
Ciclovía Ponte Vila Guilherme	695,0 m
Ciclovía Ponte Jânio Quadros	539,0 m
Ciclovía e Ciclofaixa Hebe Camargo	3553,0 m
Ciclofaixa Norma Pieruccini Giannotti	480,0 m

**Total de obras iniciadas: 12.633,00 Km**



# NORMA PIERUCCINI GIANOTTI

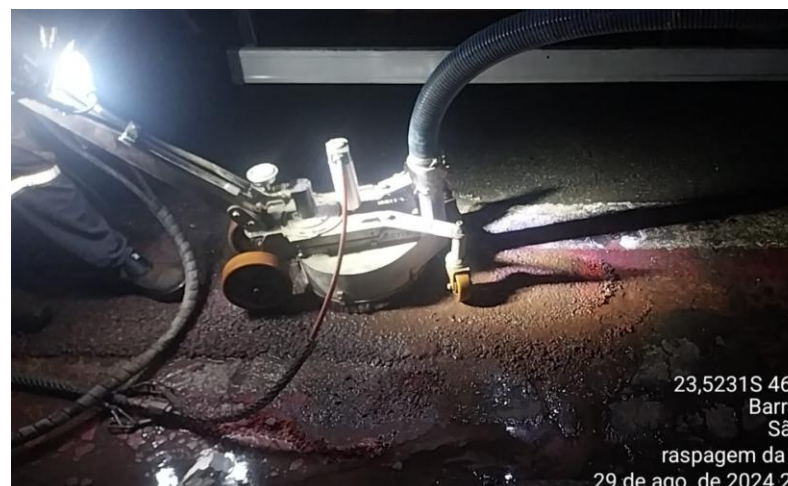

**Remoção de Tachão**

**Remoção de Sinalização Horizontal**



# HEBE CAMARGO








# HEBE CAMARGO





# PONTES

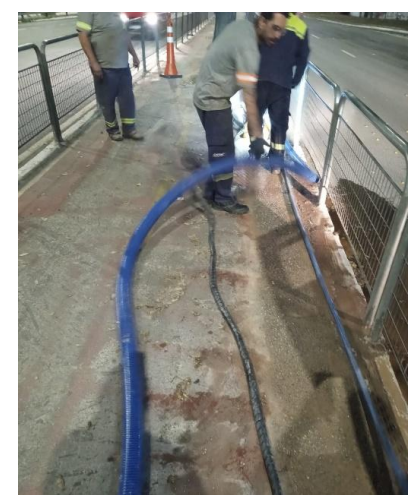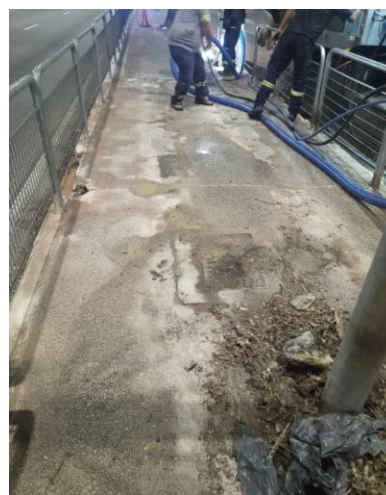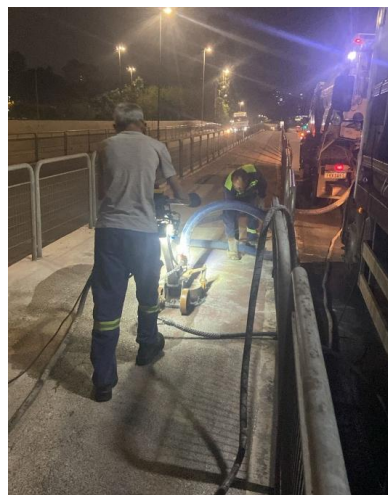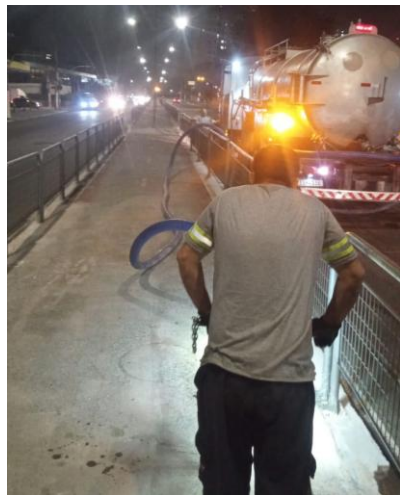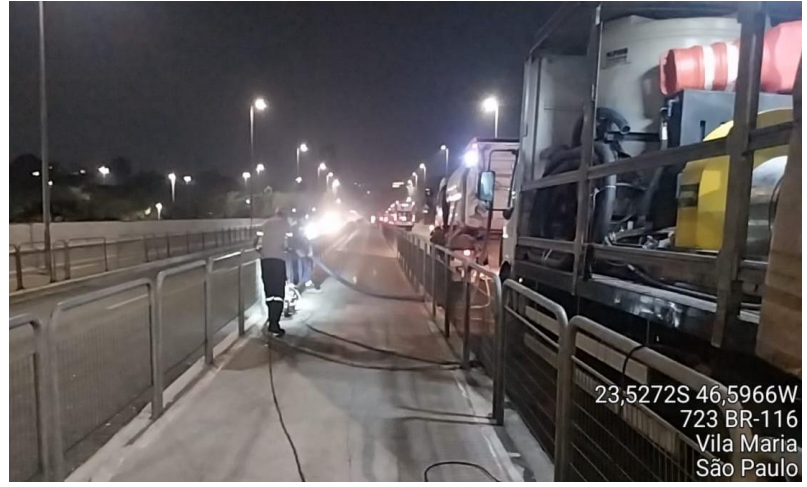

**Jânio Quadros**



**Vila Guilherme**

# MARQUÊS DE SÃO VICENTE





# LUÍS CARLOS BERRINI

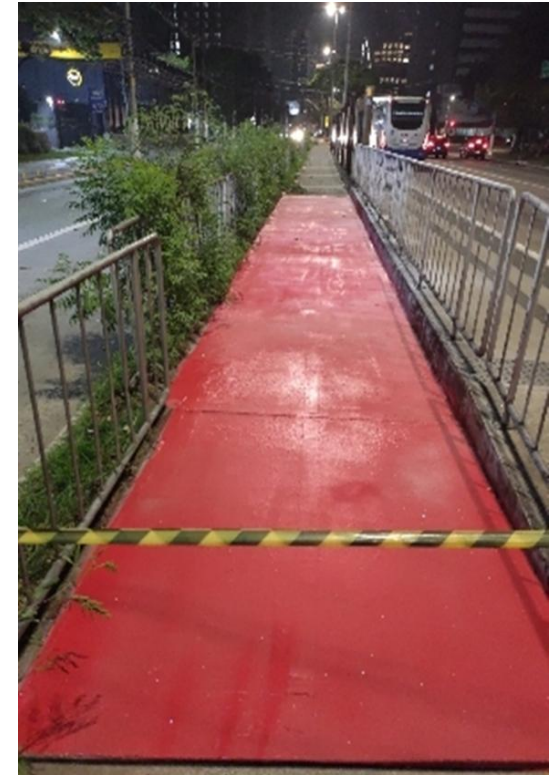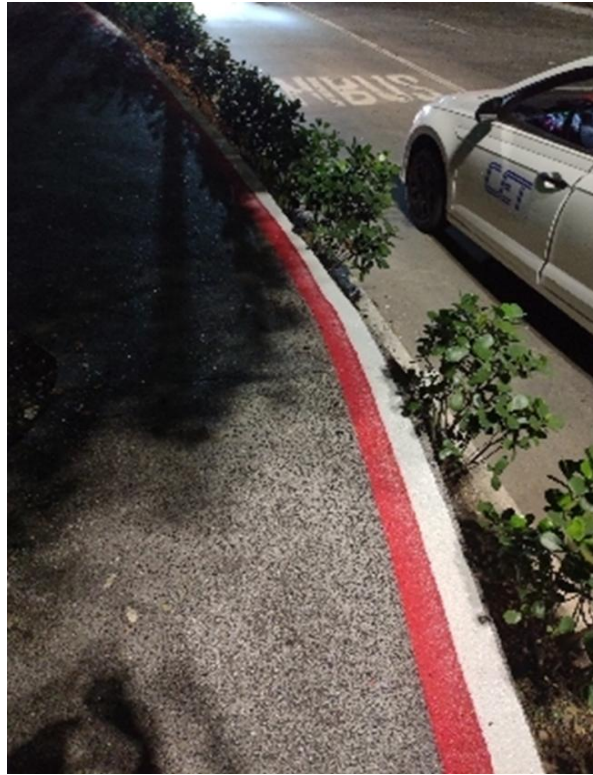

# ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS

Nome	Extensão
Ciclovia Inajar de Souza	5997,0 m
Ciclovia Brás Leme	2938,0 m
Ciclofaixa Brás Leme - Ligação	368,0 m
Ciclofaixa Nazaré T2 - Tachão	2400,0 m
Ciclofaixa Nazaré T2	347,0 m
Ciclovia São João	3717,0 m
Ciclovia Tancredo Neves	2540,0 m
José Alves da Cunha	1309,0 m
Ciclofaixa Chácara Santo Antônio T1	449,0 m
Rubens Gomes de Souza	396,0 m
Camargo	464,0 m
Parque Arariba T2	842,0 m
Freguesia do Ó	2556,0 m
Jaguaré	745,0 m
Vitória Speers	1208,0 m
Carioca Camamu	1197,0 m
Faria Lima - T2	6759,0 m
Reposição Geral de Gradis	

**- 9,3Km:**

→ suspensas para  
ajuste de projeto.

**OS emitidas e serviços não iniciados: 34.232,00 Km**





**OBRIGAD@!**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO
