

# PLANO CICLOVIÁRIO

Cidade de São Paulo



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

Setembro/2024

# NOVAS IMPLANTAÇÕES

## de Estruturas Ciclovias



**CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**  
**MOBILIDADE**  
**E TRÂNSITO**

Setembro/2024

# MAPA CICLOVIÁRIO

## LEGENDA

- 743 km de Estruturas Ciclovias **EXISTENTE**
- 158,0 km de Estruturas Ciclovias **LICITAÇÃO**
- 120,57 km de Estruturas Ciclovias **PPP COHAB**
- 48,0 km de Estruturas Ciclovias **CONCORRÊNCIAS**



# REGISTROS FOTOGRÁFICOS

## de Atividades



**CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**  
**MOBILIDADE**  
**E TRÂNSITO**


# CONCORRÊNCIA 02 e 03



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

# ESTRUTURAS EM IMPLANTAÇÃO

- ✓ R. João Batista Conti;
- ✓ Av. Abraão Ribeiro – Obra finalizada, aguardando sinalização.
- ✓ Av. Raimundo Pereira Magalhães
- ✓ Av. Jacu - Pêssego – Obra finalizada, aguardando sinalização.
- ✓ Av. Nagib Farah Maluf.

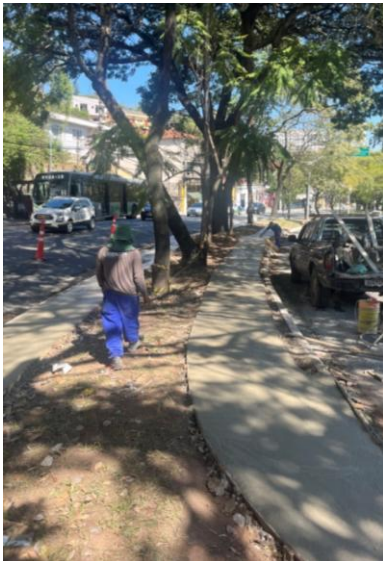

**Raimundo**




**Abraão Ribeiro**



**Jacu Pêssego**

# NAGIB FARAH MALUF

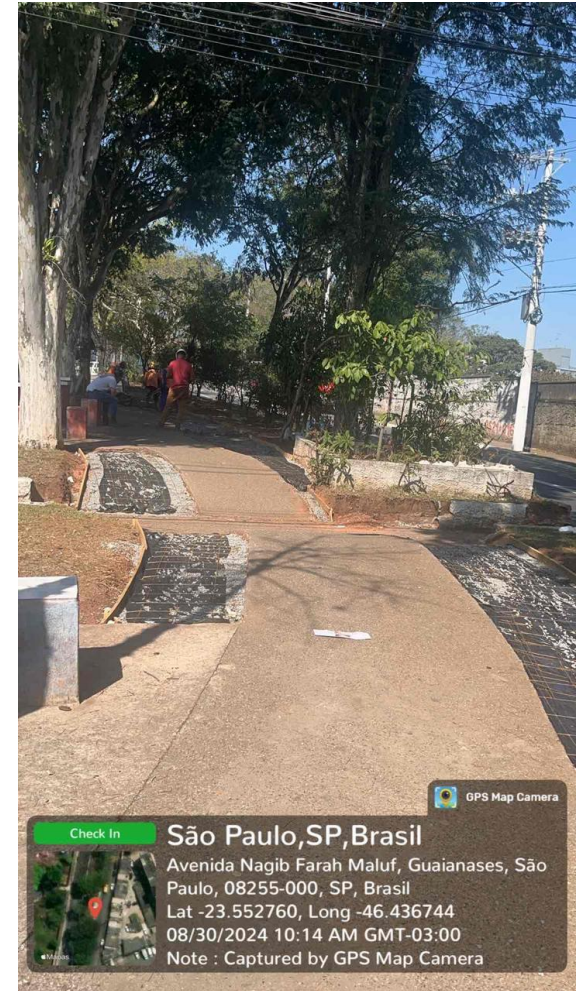

# PPP da HABITAÇÃO



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO



# ORDENS DE SERVIÇO - PPP

## Ordem de Serviço Emitida

Rua Antônio Carlos da Fonseca
Rua Maria Cândida
Avenida José Maria Fernandes

## Ordem de Serviço em Processo de Emissão

Adherbal Stresser
Antônio César Neto
Asdrubal da Cunha - trecho 2
Benjamin Pereira
Camargo
Capitão José Parada Gonçalves
Cipriano Barata
Dom Macário
Gastão Vidigal - Megenthaler
Imperatriz Leopoldina
João Boemer
José dos Reis
Maria Amália Lopes Azevedo
Queiroz Filho
Virgília Rodrigues Alves C Pinto
Ponte Tatuapé



# ORDENS DE SERVIÇO - PPP

## Resumo Executado Por Lote

Lotes	Extensão Total (m)	Extensão Implantado(m)	Extensão Em Obras (m)	Extensão Aguardando OIS "Setembro" (m)
Lote 01	26.357,00	2.151,00	2.720,00	5.219,00
Lote 05	15.874,00	3.483,00	0,00	4.182,00
Lote 07	16.076,00	2.341,00	1.309,00	0,00
Lote 09	12.885,00	4.167,00	0,00	818,00
Lote 10	26.977,00	0,00	0,00	0,00
Lote 11	9.002,00	0,00	0,00	2.386,00
Lote 12	17.099,00	2.862,00	0,00	11.445,00
<b>TOTAL PPP</b>	<b>124.270,00</b>	<b>15.004,00</b>	<b>4.029,00</b>	<b>24.050,00</b>



Concluído

Em Obras

OIS



# JOSÉ MARIA FERNANDES

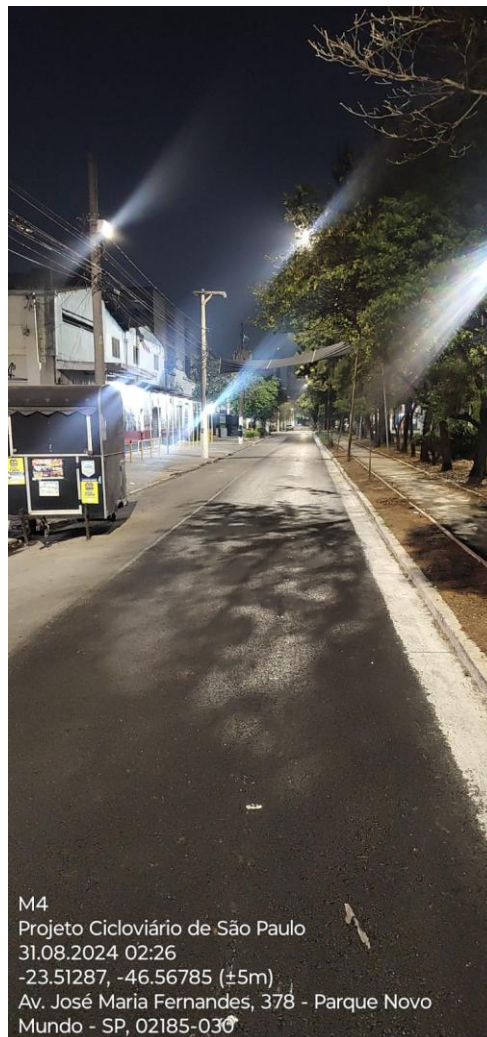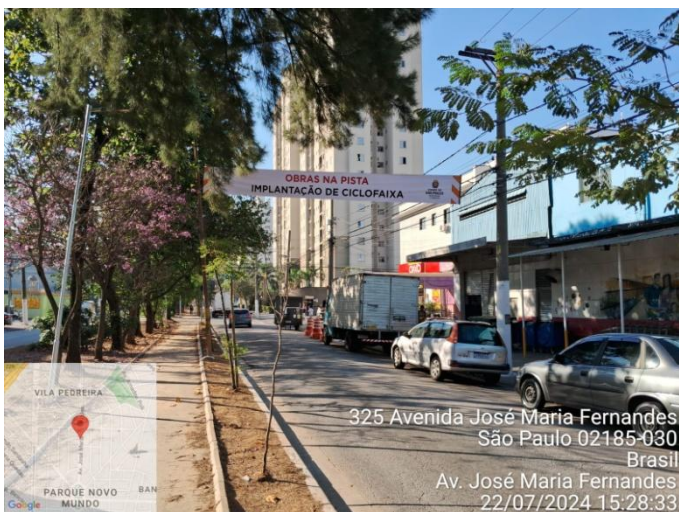

# JOSÉ MARIA FERNANDES



# JOSÉ MARIA FERNANDES



# MARIA CÂNDIDA - FINALIZADA



# MANUTENÇÃO

## das Estruturas Ciclovviárias



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO

Junho/2024

# MANUTENÇÃO DAS ESTRUTURAS CICLOVIÁRIAS

Status	Extensão (m)
Estruturas Vistoriadas	266.184,0
OS Emitida + Manut. Concluída	84.786,25
Manutenção Concluída	47.904,25

- **9,3Km**: As estruturas Inajar de Souza, Brás Leme e Brás Leme – ligação estão suspensas para ajuste de projeto.

Situação em 02/09/2024



# REGISTROS FOTOGRÁFICOS

## de Atividades



**CIDADE DE**  
**SÃO PAULO**  
**MOBILIDADE**  
**E TRÂNSITO**

# MANUTENÇÃO FINALIZADA

Nome	Extensão
Jair Ribeiro	1722,0 m
Teotônio Vilela	4105,0 m
Barão da Passagem	1356,0 m
Sumaré	3245,0 m
França Pinto	1536,0 m
Vd. Antártica	1388,0 m
Consolação	373,0 m
Santos Dumont - T1	522,0 m
Cecília Lottemberg	2018,0 m
Cidade Tiradentes - Metalúrgicos	2624,0 m
Santa Eulália	392,0 m
Parque da Mooca	1446,0 m
Vila Prudente - T1	1295,0 m

Nome	Extensão
Vila Prudente - T1 Compl	0,0 m
Vila Prudente - T3	2068,0 m
Jabaquara Trechos 1 e 2	4397,0 m
Jabaquara Trecho 3	627,0 m
Benjamim Constant	230,0 m
Jaguara	174,0 m
Vd. 9 de Julho	275,0 m
Aratãs	784,0 m
Cambuci	45,0 m
Estado	26,3 m
Ponte Aricanduva	791,0 m
Jacu-Pêssego	14810,0 m
Parque São Rafael	1655,0 m


**Total Finalizada: 47.904,25 Km**

# MANUTENÇÃO FINALIZADA



## Parque São Rafael


# MANUTENÇÃO FINALIZADA

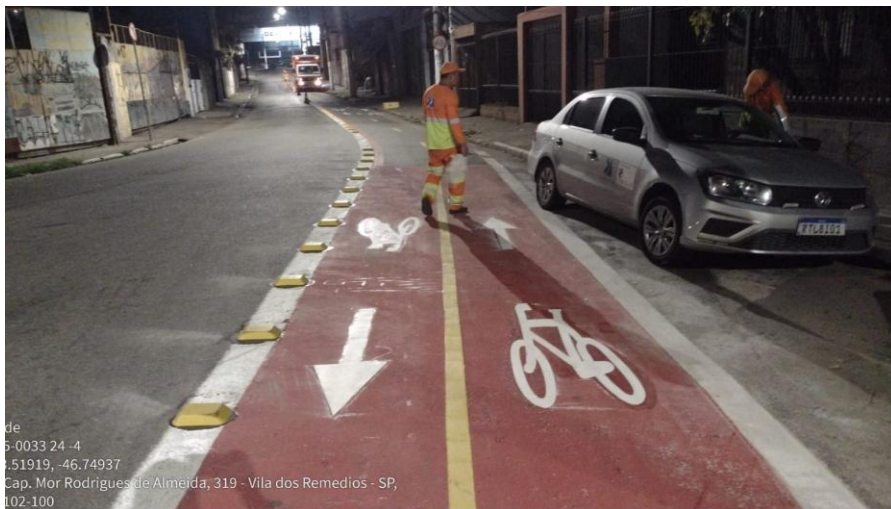


**Jaguara**

**Cambuci**


# MANUTENÇÃO FINALIZADA

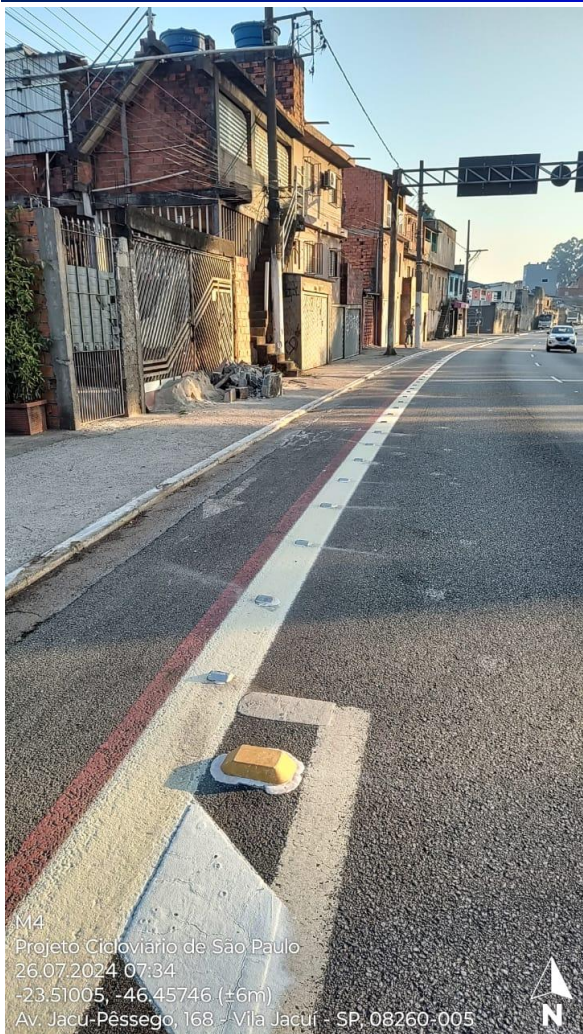

**Jacú-Pêssego**

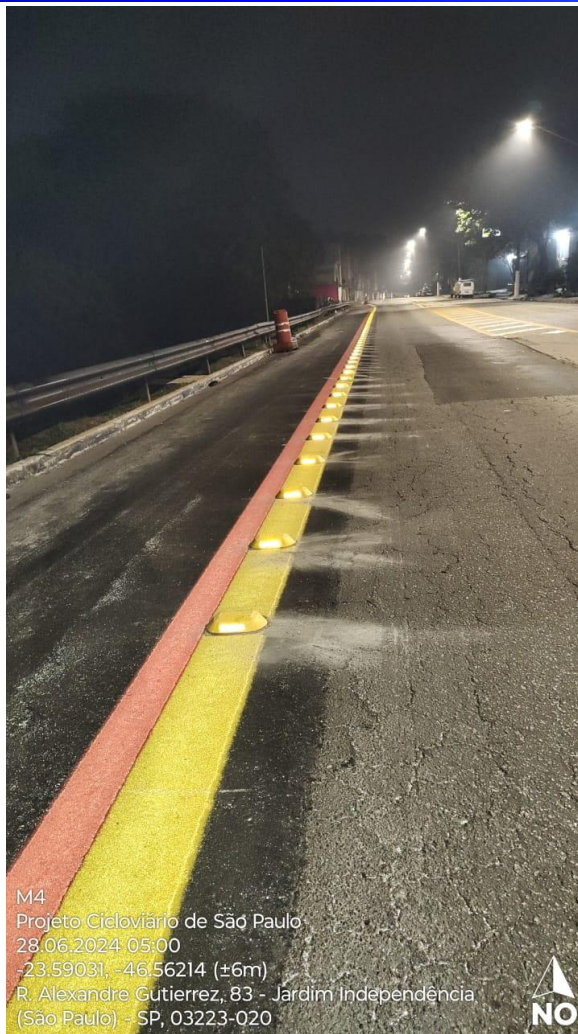

**Vila Prudente**

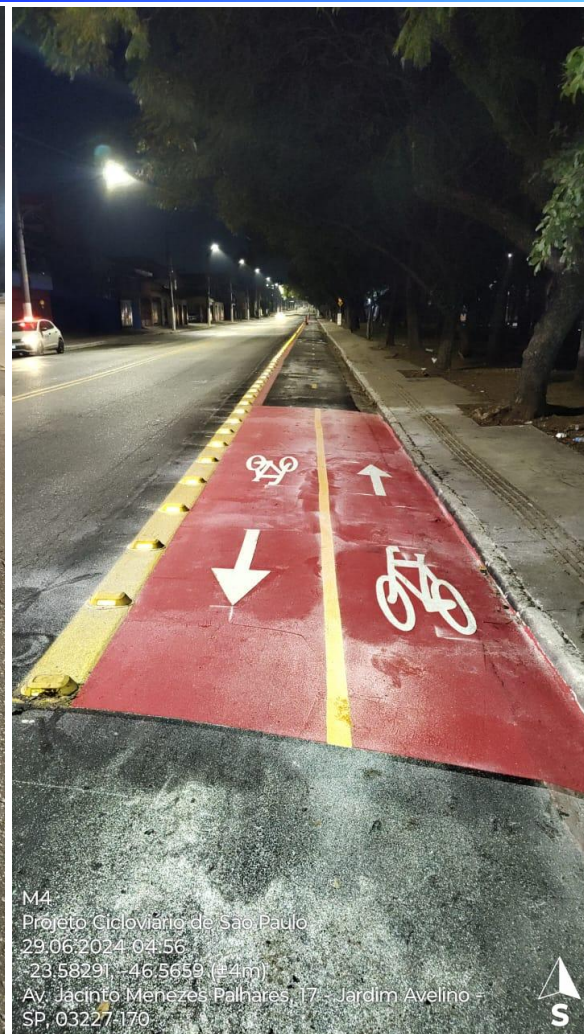

# MANUTENÇÃO FINALIZADA



**Viaduto 9 de Julho**



**Benjamin Constant**



# MANUTENÇÃO FINALIZADA



Aratãs

# MANUTENÇÃO FINALIZADA





# MANUTENÇÃO EM ANDAMENTO

Nome	Extensão
Octalles / Zagottis	1123,0 m
Ciclovia Luis Carlos Berrini	3331,0 m
Paraciclos	
Ciclofaixa Marquês de São Vicente	4035,0 m
Ciclovia e Ciclofaixa Hebe Camargo	3553,0 m

**Total Iniciada: 12.042,0 Km**

# MANUTENÇÃO EM ANDAMENTO




# MANUTENÇÃO EM ANDAMENTO



**Hebe Camargo**

# MANUTENÇÃO EM ANDAMENTO

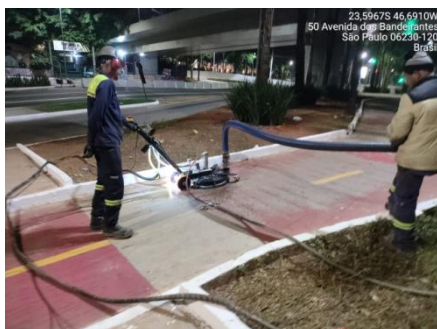

**Luís Carlos Berrini**

**Marquês de São Vicente**

# ORDENS DE SERVIÇO EMITIDAS

Nome	Extensão
Inajar de Souza	5.997,00
Brás Leme	2.938,00
Brás Leme - Ligação	368,00
Nazaré - T2 (Tachões)	2.400,00
Ponte Vila Guilherme	695,00
Ponte Jânio Quadros	539,00
Nazaré - T2	347,00
Norma Pieruccini Giannotti	909,00
Jardim Helena / São Miguel - T2	1.736,00
Martiniano de Carvalho	769,00
São João	768,00
Tancredo Neves	2.540,00
Patriotas	2.158,00
José Alves da Cunha	1.309,00
Chácara Santo Antonio - T1	971,00
Rubens Gomes de Souza	396,00

**OS Emitidas não iniciadas: 24.840,0 Km**

**- 9,3Km:**

→ suspensas para ajuste de projeto.



**OBRIGAD@!**



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**  
MOBILIDADE  
E TRÂNSITO
